

鎌倉市公共下水道経営戦略(素案)

(令和8年度(2026 年度)～
令和 17 年度(2035 年度))

鎌倉市下水道事業運営審議会

目次

I	はじめに.....	1
1	経営戦略改定の趣旨	3
2	経営戦略の位置付け	5
コラム①	公営企業会計の意義と仕組み	6
II	「経営戦略2021」の進捗・評価	9
1	経営戦略 2021 の進捗	11
(1)	施設の投資計画	11
コラム②	投資の計画と実績	15
コラム③	下水道管の調査と改築工事	16
(2)	最適化・平準化・広域化	17
(3)	体制・民間活用・技術力	18
(4)	その他の取組(デジタル化・資産活用等)	20
コラム④	下水道管路の全国特別重点調査	21
(5)	財政計画の進捗状況	23
2	経営戦略 2021 の評価	25
(1)	施設の投資計画	25
(2)	広域化、デジタル化等の取組	25
(3)	財政計画	25
(4)	進捗管理・検証・見直し	25
III	経営戦略2026	27
1	下水道事業を取り巻く環境・予測	28
(1)	下水道事業を取り巻く環境	28
コラム⑤	雨水管理総合計画	32
(2)	下水道事業に関する予測	34
コラム⑥	鎌倉市下水道 BCP	38
2	課題の整理	40
(1)	膨大な下水道施設の急速な老朽化と災害脆弱性	40
(2)	財政状況の悪化	43
(3)	執行体制の脆弱化(減少・不足・高齢化)	45
(4)	下水道分野における地球温暖化対策、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進など ..	45
コラム⑦	下水道管きよの健全率予測式	46
コラム⑧	雨天時浸入水	47
3	経営の基本方針	48
(1)	30年後の下水道事業のあるべき姿(長期目標)	48
(2)	10年後の下水道事業のあるべき姿(中期目標)	49
4	主な取組	50
(1)	主な取組総括表	50
(2)	老朽化・脆弱な下水道施設の早期改築更新・耐震化・統合	51
(3)	再構築期における財政改革	64
(4)	再構築期における官民連携	65
(5)	新たなニーズへの対応(地球温暖化対策、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進) ...	70
コラム⑨	持続型下水道再整備事業	72
コラム⑩	ウォーターPPP	73
5	投資・財政計画(収支計画)	75
(1)	投資計画	75
(2)	投資以外の経費	75
(3)	財源計画	76
(4)	投資・財政計画(概要版)	80
6	進捗管理・検証・見直し	86

I はじめに

1 経営戦略改定の趣旨

本市の公共下水道は、公衆衛生の向上、河川や海の水質保全・浸水防止を目的に、昭和 33 年(1958 年)に事業に着手しました。その後、污水管、中継ポンプ場、下水道終末処理場の整備を進め、昭和 47 年(1972 年)には坂ノ下など一部の地域で公共下水道の供用を開始し、その後も順次、供用開始区域を広げ、平成 5 年(1993 年)には、大船処理区での供用を開始しました。本市では、今日に至るまで着実に下水道の整備を進めた結果、普及率は 97.8%に達しています。これにより、市内の河川・水路への生活排水の流入が減少し、水質が大きく改善され、都市の生活環境は快適に維持されてきました。

一方、供用開始から既に 50 年以上が経過したことで、老朽化による不具合も発生しています。管きょ¹が古くなったことで、木の根が侵入するなどし、下水道の詰まりや流れが悪くなるといった報告が市に寄せられ、修繕や補修による対応を毎年行っています。また、下水道終末処理場についても、近年大規模な設備更新等は行っておらず、古くなった設備の修理を繰り返しながら運転を行っている状況です。このように、本市の下水道事業は、老朽化した施設を日々保守しながら、管理・修理を行うことで、市民の生活を支え続けてきましたが、既に改築更新の時期に到達しています。このため、施設の点検・補修、改築更新をいかに進め、安全・快適に暮らし続けながら、どのようにまちを子どもたちに引き継ぐか、30 年先を見据えて、令和元年度(2019 年度)から公営企業会計に移行し、令和3年(2021 年)3月に「鎌倉市公共下水道経営戦略」(以下「経営戦略 2021」という。)を策定し、中期10年間(令和3年度(2021 年度)から令和12年度(2030 年度)まで)に取り組む事業の投資計画と財源計画を明確にしました。

経営戦略 2021 の策定後は、長期的な視点で下水道施設全体の点検・調査を開始し、改築更新に一部着手するとともに、1 回目の料金改定を令和5年度(2023 年度)に行いました。

¹ 主にマンホールとマンホールの間を結ぶ地中埋設管等(暗きょ)のこと。

I はじめに

これまでに、污水管きょについては、維持管理に包括的民間委託制度²を導入し、点検・調査を進め、合わせて施設情報・台帳の電子化等を進めたことで、徐々に本市の污水管きょの状態が分かってきました。さらに下水道終末処理場はストックマネジメント計画³に基づき、基幹施設を一部補修・更新するとともに、建物の耐震診断等を実施しています。

一方、下水道事業を取り巻く社会情勢も変化してきました。資材価格が高騰、労務費も上昇し、下水道事業の担い手となる人材確保も年々難しくなっており、事業の遅れが重なっていることから、その早急な解消が求められる状況です。

そこで、本市では経営戦略 2021 が計画策定から5年を経過したことから、計画の進捗と評価を行い、課題を再整理したうえで、「鎌倉市公共下水道経営戦略 2026（以下「経営戦略 2026」という。）」を策定します。これにより、令和8年度（2026 年度）から令和 17年度（2035年度）までの10 年間に取り組むべき事業と投資・財政計画を明示し、計画的かつ合理的な経営を行うことで、将来にわたり市民に安全・安心な下水道を提供していきます。

² 包括的民間委託制度：創意工夫やノウハウの活用による、より効率的・効果的に事業運営ができるように、複数の業務や施設管理等を民間事業者にとまとめて委託すること。


³ 長期的な視点で、下水道施設全体の老朽化の進展状況を考慮し、優先順位付けを行ったうえで、計画的かつ効率的に点検・調査、修繕・改善を行うための計画。

2 経営戦略の位置付け

経営戦略 2026 は、本市の上位計画である「鎌倉ビジョン 2034(基本構想)⁴」(令和7年(2025年)策定)及び「鎌倉ミライ共創プラン 2030(基本計画)⁵」(令和7年(2025年)策定)と整合を図り策定するとともに、「鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画」(平成28年(2016年)策定、令和8年(2026年)改訂予定)に反映・連携を行うものとします。また、本市の公共下水道事業に関連する計画や他計画と連携を行うものとします。


なお、平成18年(2006年)に策定した「鎌倉市下水道マスタープラン」(令和7年度(2025年度)まで)、平成24年(2012年)に策定した「鎌倉市下水道中期ビジョン 2012」(令和4年度(2022年度)まで)は、経営戦略 2026 等に引き継ぐものとします。

また、経営戦略 2026 は、総務省が各公営企業に策定を要請した「経営戦略」として位置付けます。

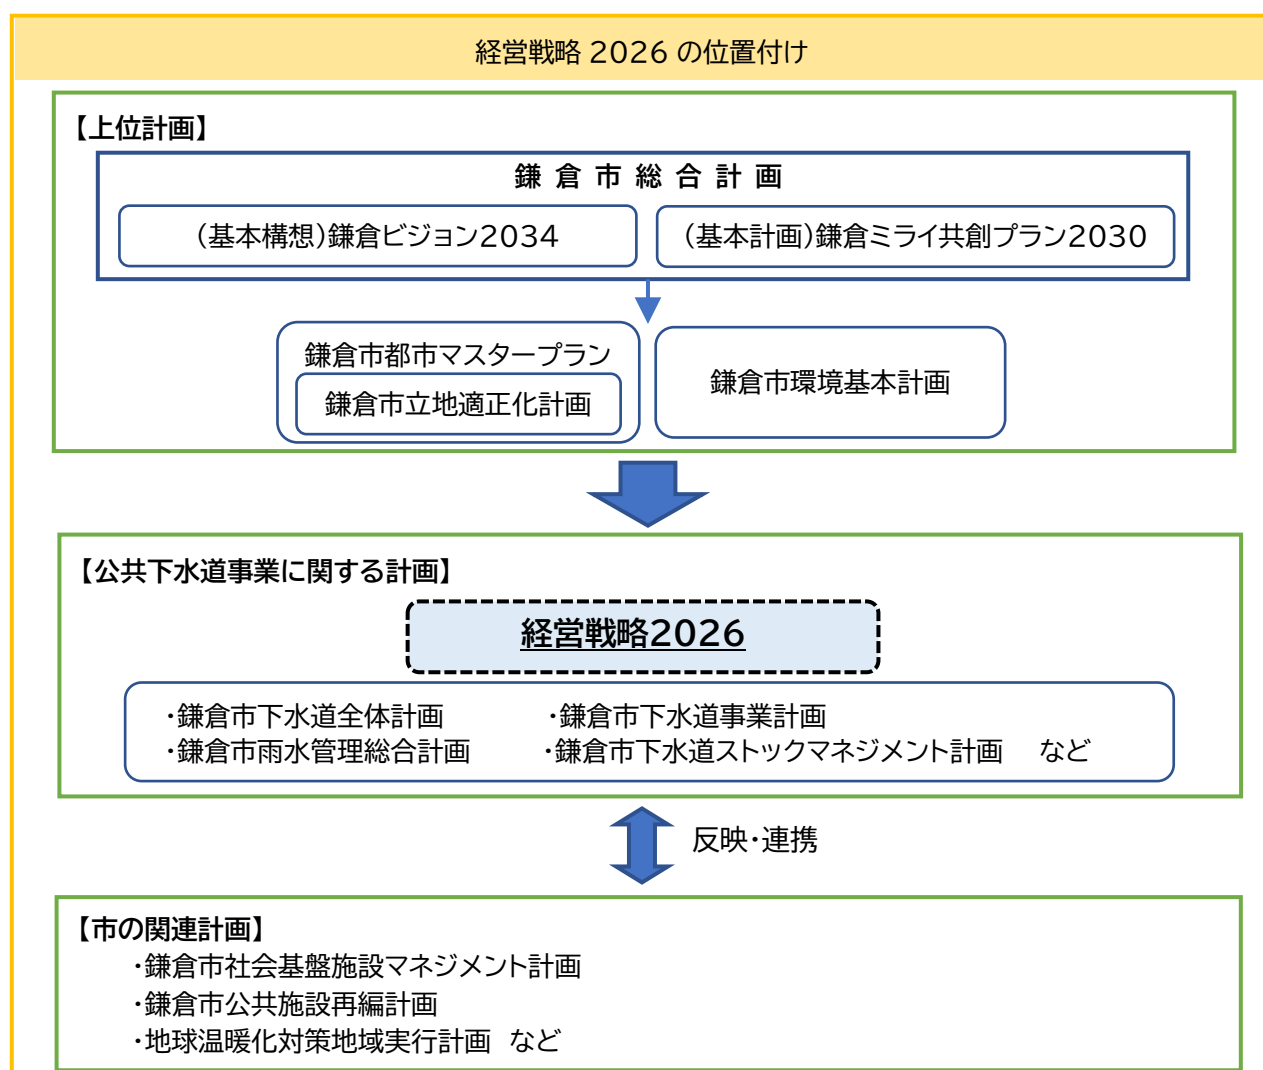

⁴ 基本構想とは、まちづくりの基本理念並びに将来都市像とその実現に向けた将来目標及びその方向性を示すもの。「鎌倉ビジョン 2034」の基本構想期間は、令和8年(2026年)度から令和16年(2034年)度までの9年間。

⁵ 基本計画とは、基本構想を実現するための政策又は施策の体系及びその方針を示すもの。「鎌倉ミライ共創プラン 2030」の基本計画期間は、令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの5年間。



コラム①公営企業会計の意義と仕組み

1 地方公営企業とは

地方公営企業とは、地方公共団体が経営する企業で、事業の経費を主に事業収入で賄う事業を指します。また、公営企業は、企業の経済性の発揮や公共の福祉の増進といった経営の基本原則に基づき運営されます。現在のところ、鎌倉市における地方公営企業は、公共下水道事業のみです。


公営企業の例(令和5年度末)			
水道(1,757 事業)	下水道(3,595 事業)	病院(681 事業)	バス(23 事業)
			

2 「独立採算制」と「一般会計」との関係

地方公営企業は企業であるため、本市の公共下水道事業は、サービスなどの提供に要する経費を、公共(税金)で負担すべき部分を除き、使用者が「下水道料金」として負担するという「独立採算制」を原則として運営しています。

一方、社会全体の便益につながる経費については、一部を一般会計が負担しています。一般会計が負担する経費の例としては、「雨水処理に要する経費」などが挙げられます。雨水は自然現象であり、雨水の処理は、社会全体の便益につながります。そのため、「雨水処理に要する経費」については、一般会計から繰入金という形で収入しています。

一般会計からの繰入金には、上記のような公費で負担するために繰り入れる、いわゆる「基準内繰入金」と、下水道事業の収入不足分を補てん等するために繰り入れる、いわゆる「基準外繰入金」があります。なお、「基準内繰入金」の基準は、毎年度、総務省から通知が発出され示されています。

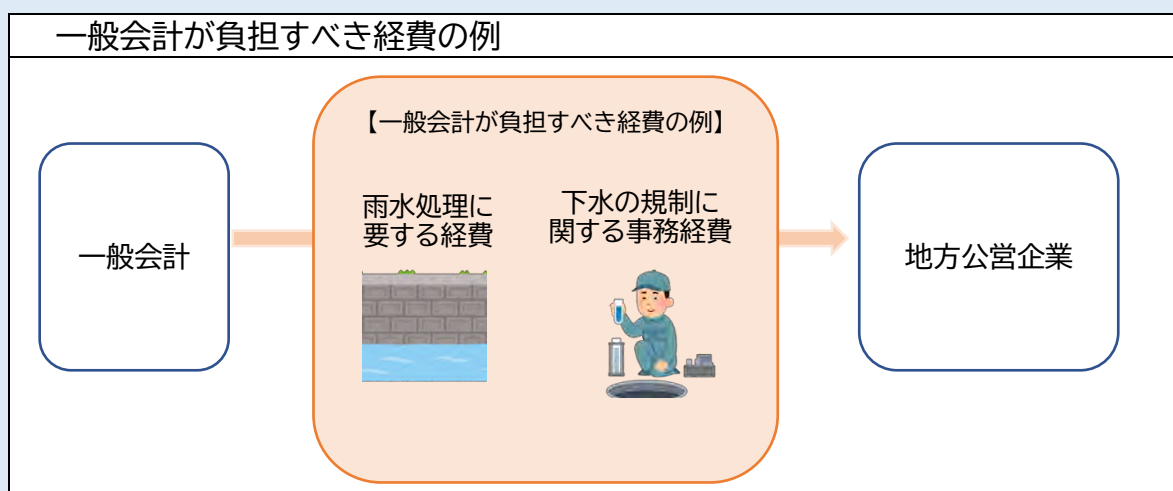

I はじめに

3 公営企業会計と官庁会計の比較

➤ 地方公営企業で作成する財務諸表

鎌倉市の公共下水道事業は、地方公営企業法のうち財務規定等のみを適用しています。これにより、公営企業会計(発生主義・複式簿記)を導入し、経営成績や財政状態など、自らの経営状況をよりの確に把握することが可能となりました。

公営企業会計(=複式簿記・発生主義)	官庁会計(=単式簿記・現金主義)
<u>損益計算書を作成</u> ※一会計期間における経営成績(利益や損失の額、費用と収益の状況)を表す財務諸表	<u>損益計算書を作成せず</u> →減価償却費・引当金といった、非現金情報が計上されず、正確なコストが把握できない。
<u>貸借対照表を作成</u> ※ある期日における財政状況(資産、負債、資本の額)を表す財務諸表	<u>貸借対照表を作成せず</u> →現金以外の資産や負債の情報が蓄積されず、財産状況が見えない。
<u>キャッシュ・フロー計算書を作成</u> ※一事業年度における資金収支の状況を、一定の活動区分別に表す財務諸表	<u>キャッシュ・フロー計算書を作成せず</u> →資金収支の状況は把握しているが、一定の活動区分別には把握できていない。


➤ 収益的収支と資本的収支

地方公営企業の予算は、企業の活動に伴って生じる全ての費用と収益を計上する「収益的収支」と、施設の建設・更新、企業債償還金などの支出と財源の国庫補助金、企業債などの収入を計上する「資本的収支」に区分され、経営活動と投資活動の両面からの統制が可能である特徴があります。

【官公庁会計】

経常的収入 (固定資産税など)	資本的収入 (国庫補助金・起債)
経常的経費 (修繕費など)	資本的支出 (建設改良費・元金償還金)

【公営企業会計】

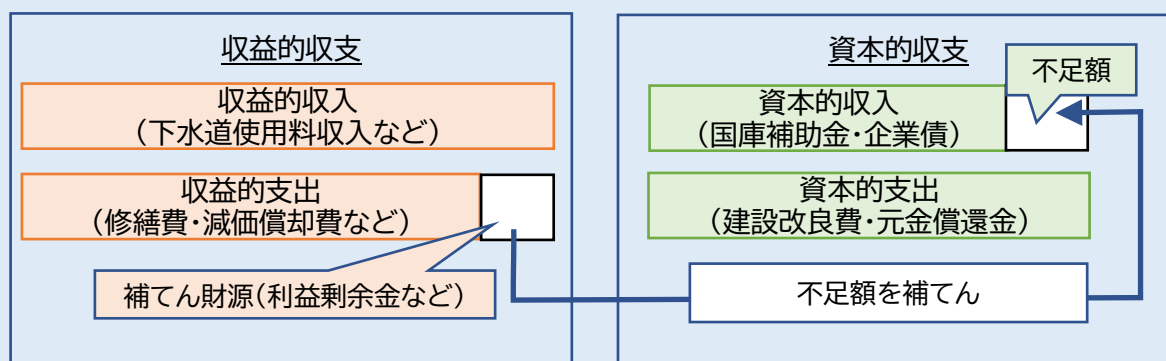

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

令和3年(2021年)3月策定

長期見通し:30年後

(令和32年度(2050年度))

中期計画:10年間

(令和3年度(2021年度)から令和12年度(2030年度)まで)

1 経営戦略 2021 の進捗

(1)施設の投資計画

「施設の投資計画」について、前半5年間(令和3年度(2021 年度)～令和7年度(2025 年度))の計画に対する実績進捗は、以下のとおりとなりました。なお、詳細は各項目に記載しています。

また、記載している各実績は、記載時点で令和7年度(2025 年度)決算が確定していないことから、最終的な実績とは異なる場合があります。

項 目	数量		投資額 (百万円)		達成度
	計画	実績	計画	実績	
①緊急輸送路の污水管修繕改築工事	改築工事 1.3km	改築工事 0.4km	200	(36%) 72	
②民間開発団地管きよの改築更新	点検・調査 87km	点検・調査 87km	260	(100%) 260	
③雨水管・雨水調整池の修繕改築	改築工事 0.5km	改築工事 0.1km	240	(26%) 62	
④下水道終末処理場の耐震化・改築					
a 七里ガ浜下水道終末処理場	・耐震(診断、設計、工事)(全施設) ・設備改築(設計、工事)	・耐震(診断、設計)(管理棟、水処理棟の一部)	3,979	(8%) 304	
b 山崎下水道終末処理場	・耐震(診断、設計、工事)(全施設) ・設備改築(設計、工事)	・耐震(診断、設計)(全施設) ・設備改築(設計、工事)	2,499	(37%) 932	
⑤持続型下水道幹線再整備事業	基本検討(揚水施設) 地質調査 測量調査	地質調査 測量調査	155	(70%) 109	

※達成度  (はれ):達成  (あめ):未達成  (くもり):大幅な計画変更のため未達成

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

① 緊急輸送路の污水管修繕改築工事

- 地震時に污水管が損傷して緊急輸送路の交通を阻害しないよう、令和元年度(2019 年度)に策定した修繕改築計画(管更生工)に基づき、1.3km の計画に対して 0.4km の改築工事を実施しました。
- 未実施区間 0.9km のうち、0.4kmは令和3年度(2021 年度)に実施した実施設計において、現場条件に適する工法がなく、改築工法の再検討が必要となりました。
- 未実施区間 0.9km のうち、0.5km の一部区間については、修繕業務で対応しました。

	数量	投資額
計画	改築工事 1.3km	200 百万円
実績 R7 末(2025 末)	改築工事 0.4km	72 百万円

② 民間開発団地管きよの改築更新

- 強度不足の取付管や老朽管の多い民間開発団地管きよ 87km について、包括的民間委託により污水管きよの状態を把握する計画に対して、令和5年度(2023 年度)から令和6年度(2024 年度)にかけて、点検・調査を行い、令和7年度(2025 年度)に修繕改築計画を策定しました。

	数量	投資額
計画	点検・調査 87km	260百万円
実績 R7 末(2025 末)	点検・調査 87km	260百万円

③ 雨水管・雨水調整池の修繕改築

- 老朽化が進行している雨水管等について、令和4年度(2022 年度)に策定した修繕改築計画に基づき、0.5km の計画に対して、0.1km の改築工事を実施しました。
- 改築工事の予定箇所において、道路管理者である神奈川県及び混み合う埋設物(水道・ガス・電気など)の各管理者と施工内容に関する協議に時間を要したため、改築工事の実施に遅れが生じました。
- 下水道による浸水対策の計画となる雨水管理総合計画の策定に向けて、令和4年度(2022 年度)に内水浸水シミュレーションを実施し、雨水出水浸水想定区域図を公表しました。
- 令和5年度(2023 年度)には、当面(5～10 年以内)・中期(約 20 年以内)・長期(それ以上(約 30 年以内))における段階的整備の目標と段階的な対策方針を定めた雨水管理方針を策定しました。
- 令和7年度(2025 年度)には、雨水管理総合計画を策定しました。

	数量	投資額
計画	改築工事 0.5km	240百万円
実績 R7 末(2025 末)	改築工事 0.1km	62百万円

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

④ 下水道終末処理場の耐震化・改築

a 七里ガ浜下水道終末処理場

- 令和2年度(2020 年度)～令和3年度(2021 年度)に実施した耐震診断の結果、土木構造物の耐震性能目標である「レベル2地震動⁶」を満たした耐震化工事を施すことが、技術的にも費用的にも困難であると判明しました。
- このため、後述する「⑤持続型下水道幹線再整備事業」のとおり処理場を一元化して廃止するまでの間、従事する職員等の安全を確保するため、管理棟の一部について「レベル1地震動⁷」を満たした耐震化工事を施すため、更なる耐震診断や設計を行いました。
- これらにより、耐震化については当初計画していた全ての建物について「レベル2地震動」に耐えるものから、一部の建物について「レベル1地震動」を満たすものへ、設備については原則、現状維持に留め、施設の状況に応じて改築・更新を行うことへ、それぞれ方針を変更したため、投資額は計画 3,979 百万円に対し、実績は 304 百万円に留まりました。

	数量	投資額
計画	・耐震(診断、設計、工事) (全施設) ・設備改築(設計、工事)	3,979 百万円
実績 R7 末(2025 末)	・耐震(診断、設計) (管理棟、水処理棟の一部)	304 百万円

b 山崎下水道終末処理場

- 令和4年度(2022 年度)～令和5年度(2023 年度)に実施した耐震診断の結果、一部の建物において、土木構造物の耐震性能目標である「レベル2地震動」を満たしていませんでした。また、これを満たすための耐震化工事は大規模で、かつ高額な工事費用を要することも判明しました。
- 工事の実施により「レベル2地震動」の耐震化が可能で、工事費用が縮減できる見込みのある部分について、令和6年度(2024 年度)～令和7年度(2025 年度)に更なる耐震診断を行いました。
- これらにより、当初計画から耐震化は2年程度、並行して実施する改築工事は1年程度遅れたため、投資額は計画 2,499 百万円に対し、実績は、932 百万円に留まりました。

	数量	投資額
計画	・耐震(診断、設計、工事) (全施設) ・設備改築(設計、工事)	2,499 百万円
実績 R7 末(2025 末)	・耐震(診断、設計) (全施設) ・設備改築(設計、工事)	932 百万円

⁶ 陸地近傍に発生する大規模なプレート境界地震や、直下型地震による地震動のように、施設の供用期間内に発生する確率は低いが大きな強度を持つ地震動。


⁷ 施設の供用期間内に1～2度発生する確率を有する、中規模の強度を持つ地震動。

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

⑤ 持続型下水道幹線再整備事業

- 持続型下水道幹線再整備事業では、鎌倉処理区について、地震・津波対策と老朽化対策として、国道134号に浅く埋設してある既設の幹線の下の深い位置に新たに下水道幹線を設置し、自然流下で送水することを検討してきました。また、現在、6箇所ある中継ポンプ場を廃止し、新たに七里ガ浜下水道終末処理場付近に新七里ガ浜ポンプ場を築造し、ここで汚水を七里ガ浜下水道終末処理場に汲み上げて処理し、将来的に山崎下水道終末処理場に統合する計画としていました。
- 計画の実現に向けて検討を進めてきましたが、検討の結果、新七里ガ浜ポンプ場は用地の確保が難しく建設が困難であること、また、七里ガ浜下水道終末処理場は耐震性能がなく耐震補強も困難であることから、総合して地震対策という目標を達成できないことが明らかになりました。
- そのため、令和3年度(2021年度)から、鎌倉処理区の汚水を自然流下により送水し、大船処理区の山崎下水道終末処理場に統合する処理区の一元化について、検討を開始しました。

	数量	投資額
計画	基本検討(揚水施設)、 地質調査、測量調査	155 百万円
実績 R7 末(2025 末)	地質調査、測量調査	109 百万円



コラム②投資の計画と実績


鎌倉市では、昭和 30 年代から急速な都市化に合わせて整備した市民生活を支える様々なインフラが次々と改築更新期を迎える一方、市財政は収入の減少・扶助費等の増加持続が見込まれたことから、インフラ全体の今後のあり方を改めて考え直す委員会を設置し、「鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画」(以下「マネジメント計画」という。)を平成 28 年(2016 年)3月に策定しました。

マネジメント計画では、平成29年度(2017 年度)から令和 38 年度(2056 年度)までの 40 年間のインフラ機能持続に必要な経費を推計しています。下水道事業会計では、各施設の耐用年数で更新をした場合、令和3年度(2021 年度)から令和7年度(2025 年度)までの合計で約 244 億円、予防保全管理⁸等を導入した場合、合計で約 162 億円と、約 82 億円を縮減できると推計しています。

下水道の補修改築更新計画を策定するには、保有する施設全体の状態を把握し、リスク等を評価し、様々な対応方法からどう稼働させたまま補修改築更新するか、施設ごとの機能・特性を理解し、最善の手法を新技術も考慮しながら選定するという極めて高度な判断を求められます。

経営戦略 2021 の投資計画に当たっては、十分な施設データと高度な技術力が必要でしたが、その時点で出来ていた計画を集約したところ、マネジメント後の必要投資額の約半分の 85 億円でした。

一方、実績としては、七里ガ浜下水道終末処理場の耐震化等の計画変更や、現場条件による工法の検討等による事業の遅れなどにより、令和3年度(2021 年度)から令和7年度(2025 年度)までの合計は、約 24 億円となりました。

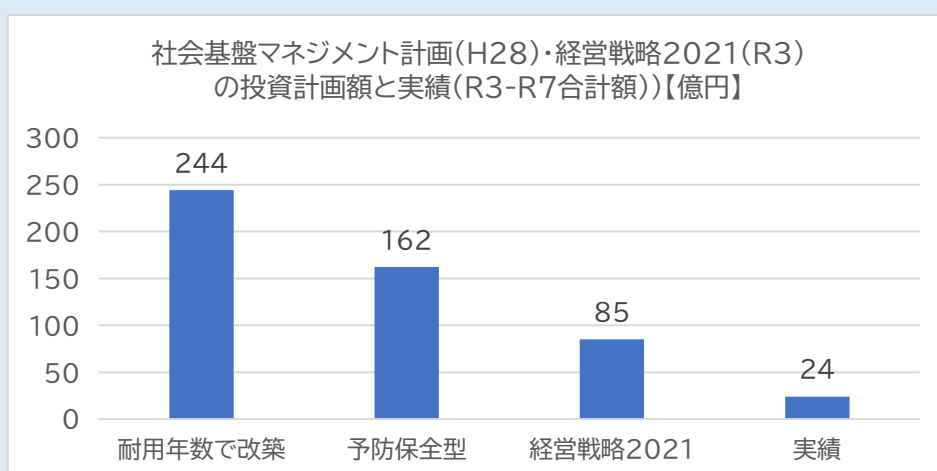

⁸ インフラの更新時期の平準化と総事業費の削減を図るために、損傷や劣化が進行する前に適切に対策を行う管理手法。



コラム③下水道管の調査と改築工事

鎌倉市では、トイレの水洗化・公衆衛生・河川や海の水質保全・浸水防止を目的に、昭和 33 年(1958 年)に公共下水道事業に着手し、昭和 47 年(1972 年)には坂ノ下など一部地区で供用開始しました。その後、大船処理区も平成5年(1993 年)に一部供用開始し、順次区域を拡大していき、今日では、約 490km の污水管きよを維持管理しています。

この約 490km の污水管きよのうち、伏越し箇所などのいわゆる腐食しやすい急所にあたる部分は5年に1度の頻度で、緊急輸送道路、軌道下等にある污水管きよなど約 26km は7年に1度の頻度で、その他の污水管きよは 15 年に1回の頻度で、点検・調査を実施します。

また、点検・調査の結果、補修・更新が必要と判断された箇所は、計画的に補修・更新を行うこととしています。

表. 污水管きよ 点検調査頻度																				
年 点検・調査の種別	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	……		
腐食のおそれ大きい箇所の管きよ (伏せ越し施設等)	5年に1回					5年に1回					5年に1回					5年に1回				
重要な施設下にある管きよ (緊急輸送道路下・軌道下、民間開発団地等)	7年に1回					7年に1回					7年に1回					7年に1回				
その他の管きよ	15年に1回															15年に1回				

鎌倉市では、平成 30 年度(2018 年度)に、1度目の緊急輸送路、軌道下等に埋設された污水管きよ約 26kmの点検・調査を開始し、点検・調査の結果、補修・更新が必要と判断された約 1.3km のうち、約 0.4km は令和7年度(2025 年度)までに補修・更新を終了し、残りの区間は一般的な修繕による対応と改築工法の再検討を行うこととしています。

また、民間開発団地に埋設された約 87km の污水管きよは、令和7年度までに点検・調査を終了し、令和8年度からは補修・更新が必要と判断された 0.7km の補修・更新を行うこととしています。

鎌倉市では、点検・調査の結果に基づき、補修・更新が必要と判断された箇所から、順次補修・更新を行っています。これまでも鎌倉処理区において約 23.9km、大船処理区において 19.3km の計 43.2km の大規模修繕を実施しています。

また、雨水施設については、開きよ、雨水管きよなど約 239km を維持管理しています。この約 239km の雨水施設のうち、緊急輸送道路、軌道下等にある雨水施設は、10 年に1度の頻度で、主要な雨水施設となる雨水幹線は 15 年に1度の頻度で、その他の雨水施設は事後保全による状態監視を行います。

また、点検・調査の結果、補修・更新が必要と判断された箇所は、計画的に補修・更新を行うこととしています。

現時点では、令和4年度(2022 年度)に1度目の緊急輸送路、軌道下、雨水幹線等の雨水施設の約 53.3km の点検・調査を開始しました。令和 5 年度(2023 年度)には、修繕改築計画の一部にあたる詳細設計を行い、令和6年度(2024 年度)から予防保全型管理による改築工事の実施を予定していましたが、埋設物の管理者と施工協議に時間を要しているため、遅れが生じています。

今後も、計画的な点検・調査と状態監視を行うことで健全度合の状態把握に努め、補修・更新が必要かを判断して、適切な維持管理を行うことで安全・安心な下水道を提供します。

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

(2)最適化・平準化・広域化

	計画	実績 R7 末(2025 末)
最適化・平準化	令和3年度(2021 年度)から令和5年度(2023 年度)の管路 ⁹ 調査・補修改築費を増額します。	污水管きよは、雨天時浸入水調査を実施しました。また、管路調査費は増額しましたが、補修改築費の増額はしませんでした。
広域化	神奈川県汚水処理事業広域化・共同化検討会の報告を基に、経営戦略の内容と整合するよう検討します。	神奈川県汚水処理事業広域化・共同化検討会において、汚泥焼却 ^{おでい} については自治体間の融通の仕組みの検討や協定の締結に向けての協議を開始するなど、広域化について検討を進めました。

予防保全型管理の早期導入・投資額平準化に向けて、雨天時浸入水調査を行い、污水管きよの異常箇所の修繕、マンホール蓋からの浸入水対策を実施しました。また、個人管理の排水設備の不具合についても、改善の指導を行いました。管路調査については、調査費を増額し民間開発団地管きよ87kmの状態把握を行いました。

下水道終末処理場の耐震化については棟ごとに耐震診断を行い、設備改築・更新については、ストックマネジメント計画に基づき設備ごとに設計・工事を計画実施する等、施設を稼働させながら施設の最適化、費用の平準化を考慮したうえでこれらに取り組みました。

下水道終末処理場の耐震化や設備の改築工事にかかる費用は、非常に高額なものになります。また、耐用年数が50年程度の建物に比べ、電気・機械等の設備機器の耐用年数は15年程度です。改築・更新の実施に当たっては、これらの性質を考慮したうえで費用を平準化させる必要があるため、耐震化工事については建物ごとに、改築工事についてはストックマネジメント計画に基づき、設備や規模に応じて分けし、更にそれらを概ね2～3年に分けて行う計画を立てました。

また、汚水処理施設等の広域化については、神奈川県汚水処理事業広域化・共同化検討会において、県や関係自治体と、相模川流域下水道への編入に必要なコストや編入による効果検証、編入先の施設の余力、処理場所在地の自治体や地元住民との合意形成などの諸課題を踏まえ、将来的な可能性の検討を開始しました。

県内処理場の汚泥^{おでい}処理の広域化については、災害時・緊急時において県内で汚泥焼却施設^{おでい}を所有する自治体間で汚泥焼却を融通しあう仕組みを検討し、協定の締結に向けて協議を開始しました。また、単独公共下水道から発生する汚泥^{おでい}を流域下水道の処理場でまとめて処理することについては、県主導のもと関連する自治体間での将来的な可能性の検討を開始しました。

⁹ 管きよ、マンホール、ます、取付け管等の総称

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

(3)体制・民間活用・技術力

	計画	実績 R7 末(2025 末)
技術力 体制	将来を見通し新技術も活用しながら、より少ないコストで時代に応じたものとなるよう、計画・設計・施工・運転管理を最適に行える体制を民間とともに構築していきます。 組織の効率化に努めつつ、予防保全型管理・災害脆弱性解消が可能となる体制の拡充と技術力の向上に取り組めます。	污水管きよは包括的民間委託を導入したことにより、計画、点検・調査等を進め、下水道台帳を電子化するなどできました。 一方、体制は、令和2年度(2020 年度)43人でしたが、令和7年度(2025 年度)35 人と減少しました。特に土木職員は、17.5 人から 11.5 人となりました。
民間活用	下水道終末処理場の運転に維持管理を加えて複数年度契約とする包括的民間委託の検討を進めるとともに、管きよにおいても点検・調査業務、突発的修繕を包括して複数年度契約、性能規定による包括的民間委託の導入を進め、さらなる民間活用を検討します。	下水道終末処理場は、業務範囲を拡大し、長期継続契約での民間委託を行いました。污水管きよは、包括的民間委託を開始しました。 また、ウォーターPPP の導入に向けた検討を開始しました。

下水道の予防保全型管理に向けて、下水道管路施設等包括的民間委託(①計画策定業務、②点検・調査業務、③施設情報の管理・台帳電子化業務、④住民対応等業務)を開始しました。本委託では、市内企業育成のため、業務実施体制に本市に本社を置く企業を加えるとともに、地元企業と積極的に協業¹⁰を図ることとしています。

下水道終末処理場や汚水中継ポンプ場等の維持管理にかかる民間活用については、民間企業のノウハウや創意工夫を活用した新しい官民連携手法であるウォーターPPPの導入や耐震化・改築工事など大規模に予定する工事への対応を見据え、これまでの業務範囲に電気工作物や自家発電設備等の法定点検のほか、脱臭設備や空調設備、電話交換機の保守等、多数の業務を新たに加え、令和7年度(2025 年度)から長期継続契約により業務委託を行いました。

また、ウォーターPPP については、令和6年度(2024 年度)に「下水道分野におけるウォーターPPP 等の案件形成に向けた方策検討のモデル都市」として国の支援を受けながら、PPP/PFI¹¹の導入検討に向けた準備を行い、令和7年度(2025 年度)から導入に向けた検討を開始しました。

¹⁰ 協業とは、複数の企業が協力して事業を行うこと。

¹¹ PPP とは、公共施設等の建設、維持管理、運営等を行政と民間が連携して行うことにより、民間の創意工夫等を活用し、財政資金の効率的使用や行政の効率化等を図るもので、PFI はその手法のひとつ。

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

		平成5年度 (1993 年度)	平成27年度 (2015 年度)	令和2年度 (2020 年度)	令和7年度 (2025 年度)
職員数	事務職員	19人	7人	7 人	10 人
	土木職員	52人	15人	17.5 人	11.5 人
	機械・電気職員	12人	7人	6.5 人	5人
	建築職員	1人	0人	0人	0人
	化学職員	12人	3人	5人	5人
	技能職員	13人	5人	7 人	3.5人
	合計	109人	37人	43 人	35人
下水道事業関連課		①下水道総務課 ②下水道計画課 ③下水道工務課 ④河川課 ⑤七里ガ浜水質 浄化センター ⑥山崎水質 浄化センター	①都市整備 総務課 ②道水路管理課 ③下水道河川課 ④作業センター ⑤浄化センター	①都市整備 総務課 ②道水路管理課 ③下水道河川課 ④作業センター ⑤浄化センター	①下水道経営課 ②道水路管理課 ③下水道河川課 ④作業センター ⑤浄化センター

Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

(4)その他の取組(デジタル化・資産活用等)

	計画	実績
デジタル化	下水道台帳については早急に電子化(デジタル化等)し、老朽化対応を含む維持管理支援システムへ移行することで、予防保全型管理による改築更新を進めます。	下水道台帳は、電子化を行いました。
資産活用	太陽光発電は再生可能エネルギー固定買取価格が年々下がっており、下水熱焼却廃熱利用・汚泥燃料化・下水処理水の再利用には、安定的な受け入れ先の見込みがつかない状況にあることから、今後さらに検討していきます。	太陽光発電は、山崎下水道終末処理場の屋上に太陽光パネルを設置できることが分かりました。 その他の資産活用については、検討を進めところ、課題等が分かりました。


① デジタル化

- 紙台帳であった下水道台帳をデジタル化し、点検・調査結果等の維持管理情報を整理できるシステムと連動させたクラウド形式のシステムを構築しました。

② 資産活用

- 処理水の利用について、供給コスト等を計算したところ、山崎下水道終末処理場周辺施設に対する洗浄用水としての売却等は、費用対効果が低く需要が見込めないことが分かりました。
- 下水汚泥・焼却灰のたい肥化について、本市の終末処理場では、下水汚泥や焼却灰をたい肥化するために必要な設備の設置面積が不足することが分かりました。
- 下水汚泥の炭化燃料化・下水汚泥ガス発電について、実施するための施設整備が必要となります。
- 再生可能エネルギーの活用について、風力発電は、年間を通じて一定の風力が得られる気候地域であること等の自然条件が整っていることが前提となること、また、小水力発電については、発電に必要な放流落差が少ない等、現時点では導入困難な状況です。

一方、太陽光発電については、山崎下水道終末処理場の屋上に 800kw 級までの太陽光パネルを設置できることが分かりました。



コラム④下水道管路の全国特別重点調査

1 埼玉県 の 陥没事故の概況

令和7年(2025年)1月28日、埼玉県八潮市の県道で道路陥没が発生し、トラック運転手が車ごと落下し、尊い命が失われました。陥没箇所は、処理水量約61万 m^3 /日の下水処理場に繋がる管径4.75mの流域下水道管路が埋設されており、下水道管の破損に起因する陥没としては最大級の規模で、関連する12市町の120万人に下水道の使用自粛が要請されました。

- 発生日時：令和7年1月28日（火）午前10時頃
- 発生場所：八潮市中央一丁目地内
県道松戸草加線（中央一丁目交差点内）
- 陥没規模：（1月28日当初）幅約9～10m、深さ約5m
（1月31日拡大後）幅約40m、深さ最大約15m
- 下水道管：管径4.75m、昭和58年（1983年）整備（経過年数42年）
令和3年度の調査時には、補修が必要な腐食は確認されず
- 接続先：中川水循環センター（処理水量約61万 m^3 /日）

1月28日(火)陥没発生当初



1月31日(金)拡大後、スロープ整備着手前



(写真出典) ANN NEWS



出所：国土交通省「八潮市における道路陥没事故の概要」

2 全国特別重点調査の概要

国は、事故を踏まえ、同種・類似の事故の発生を未然に防ぐため、大規模な下水道の点検手法の見直しや施設管理のあり方などを検討をするため、有識者による「下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会」を設置しました。委員会では、下水道管路の全国重点調査の実施に関する提言が上げられて、令和7年(2025年)3月18日に国から「下水道管路の全国重点調査」の要請がありました。

下水道管路の全国特別重点調査の概要

国土交通省

1. 調査対象：調査に際し、社会的影響が大きく、大規模陥没が発生しやすい管路から、優先度をつけて実施



2. 調査方法の高度化：調査対象の全路線の管路内をデジタル技術も活用して調査を実施

- 管路内調査：潜行目視またはドローン・テレビカメラ等による調査
※優先実施箇所では、緊急度がⅠ、Ⅱに準らなくても打音調査等により詳細調査を実施
- 空洞調査：緊急度がⅠ、Ⅱと判定された箇所は、路面下空洞調査または簡易な貫入試験・管路内から空洞調査

3. 判定基準の強化：全国特別重点調査による緊急度の判定基準を現行より強化して、広く対策を実施

⇒腐食、たるみ、破損をそれぞれ診断し、劣化の進行順にAからCにランク付けした上で特別な判定基準で対策を確実に実施


緊急度	現行の判定基準	強化	全国特別重点調査の判定基準	緊急度に応じた対策内容
Ⅰ	ランクAが2項目以上		ランクAが1項目以上	速やかな対策を実施※
Ⅱ	ランクAが1項目もしくは ランクBが2項目以上		ランクBが1項目以上	応急措置を実施した上で、 5年以内に対策を実施

※原則1年以内

出所：国土交通省「委員会提言を踏まえた全国特別重点調査の実施について」

3 本市の全国特別重点調査

全国特別重点調査は、内径2m 以上かつ、平成6年度(1994 年度)以前、設置年数にすると 30 年以上経過した管路が調査対象とされました。本市は汚水と雨水を分けて処理する分流式であり、本市の污水管の最大内径は 1.35m であり、調査対象ではありませんでした。また、雨水管については、腰越地区を流れる二又川雨水幹線 0.3km、内径 2.2m と七里ガ浜地区を流れる七里ガ浜雨水幹線 0.1km、内径 2.0m の合計 0.4km が調査対象となりました。令和8年(2027 年)1月時点で調査を行っており、今後調査結果に基づき対策を検討します。

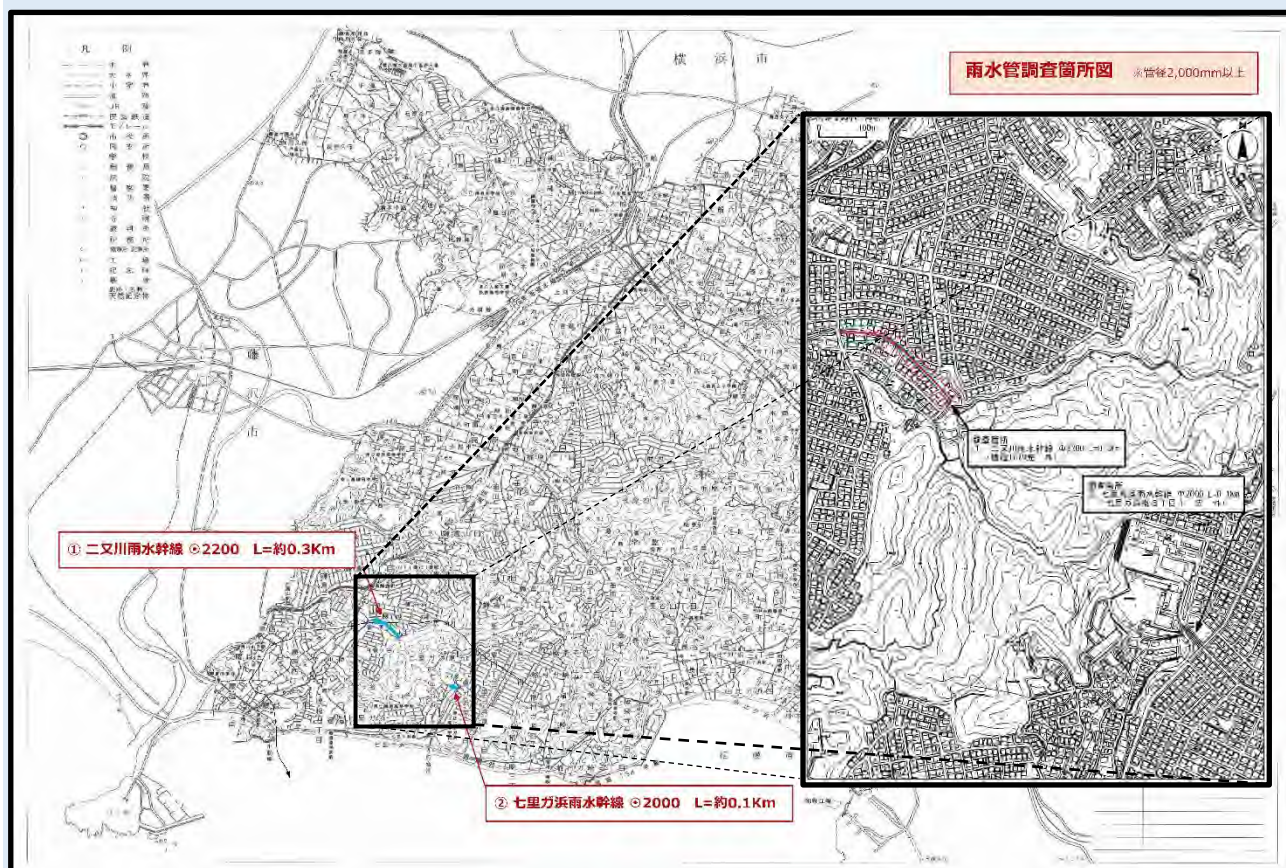

図：雨水管調査箇所図

調査方法は、調査員が直接管路の中に入って目視で調査する潜行目視調査やテレビカメラ調査で、対象管路全線にわたり実施しています。



<参考> 調査イメージ：潜行目視調査、ドローンによるテレビカメラ調査


Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

(5)財政計画の進捗状況

	計画	実績
企業債 (令和7年度末残高)	240.4億円	233.4億円
下水道使用料単価 (令和7年度見込)	1m ³ 当たり150円	1m ³ 当たり155.8円
繰入金(総額) (令和3年度～令和7年度)	153.77億円	154.09億円

① 企業債

経営戦略 2021 において、投資予定額から企業債の借入予定額を積算し、令和7年度(2025 年度)末で約 240.4 億円を見込んでいましたが、実績としては、約 233.4億円となる見込みです。これは七里ガ浜下水道終末処理場の耐震化や持続型下水道再整備事業などの投資計画の見直しにより、借入額が計画よりも減少したことによるものです。

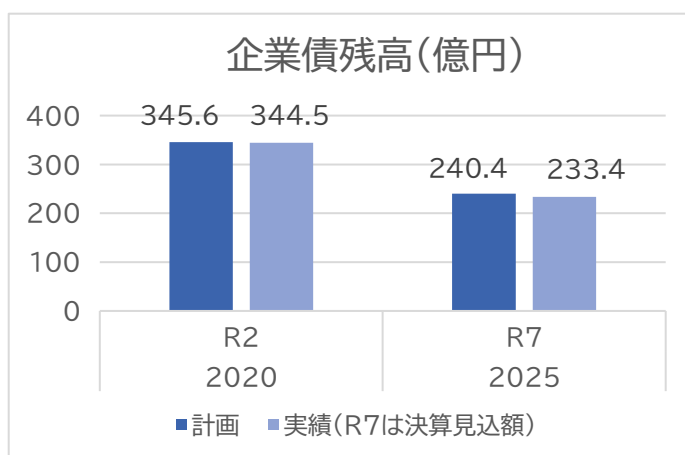



Ⅱ 「経営戦略2021」の進捗・評価

② 下水道使用料

経営戦略 2021 の投資・財政計画では、下水道使用料の改定を行わなければ、大幅な財源不足が見込まれたため、令和3年度(2021 年度)から令和 12 年度(2030 年度)までの 10 年間で、3回、3年ごとに下水道使用料の改定が妥当となりました。


令和5年(2023 年)4月、総務省が示す下水道使用料の最低限の目安である 150 円/㎡とすることを目標として、平均改定率 16.6%となる1回目の改定を計画どおり実施しました。

経営戦略 2021	目標	改定率
令和5年度(2023 年度)	使用料単価 150 円/㎡	約 16%
令和8年度(2026 年度)	資本費算入率 50%	約 10%
令和 11 年度(2029 年度)	資本費算入率 60%	約 12%

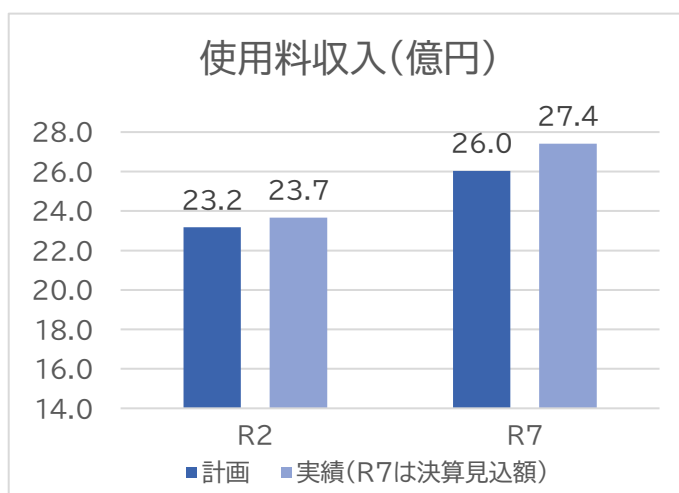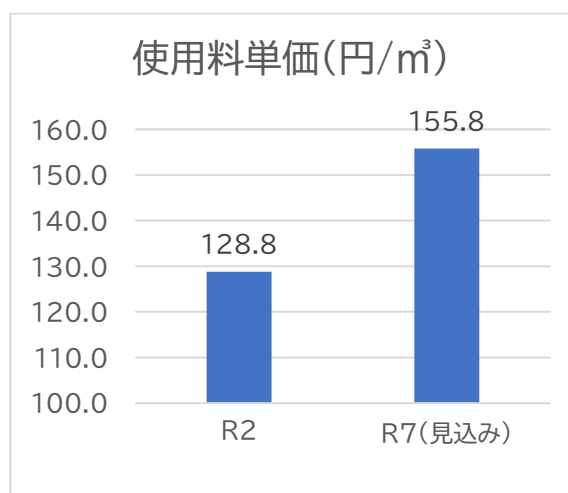

③ 繰入金

経営戦略2021において、総務省が示す繰出基準以外の繰入は、長期的に減少させていくことを目指していましたが、令和7年度(2025 年度)末では、繰入金約32.9億円に対して、基準内約23.6億円、基準外約9.3億円となる見込みです。(決算が確定している令和6年度(2024 年度)末では、繰入金約31.6億円に対して、基準内約17.3億円、基準外約14.3億円となりました。)

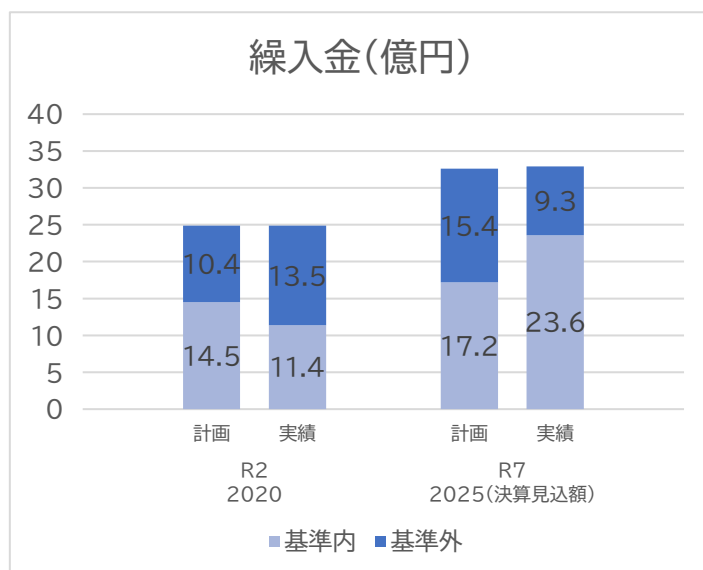

2 経営戦略 2021 の評価

(1)施設の投資計画

污水管きょについては、包括的民間委託の開始により民間開発団地の調査が進み、修繕改築計画が策定された一方で、緊急輸送路下の改築は計画の 3 割(0.4km)に留まりました。これは、計画策定後に現場の施工条件が変化したことなどにより、遅れが発生したためです。管きょの改築更新については、体制の確保に加えて、民間事業者の知見を活用し、さらに官民連携で取り組む必要があります。

雨水管の改築については、事前協議の遅れから 2 割(0.1km)に留まり、浸水対策に向けて新たな雨水管理総合計画を策定しました。

下水道終末処理場等の修繕改築については、耐震診断の結果、七里ガ浜下水道終末処理場は耐震化が困難、山崎下水道終末処理場は経済的な工法への再診断が必要と判明したことから、計画を縮小し大幅な減額となりました。

持続型下水道再整備事業については、上記に加えて新たな七里ガ浜ポンプ場用地が十分確保できないことから計画を大きく変更し、処理場の一元化・統合を前倒しで実施することとし、調査費の実績は計画の7割となりました。

総じて、老朽化が進む膨大・多様な施設のうち、特に管きょなど土木施設について、強靱化及び改築の計画策定、執行とも大きく遅れており、更に遅れないよう計画・補修・改築体制の構築が急務です。

(2)広域化、デジタル化等の取組

広域化の検討については、污泥処理の融通などの検討を進めています。

下水道のデジタル化については、下水道台帳をデジタル化し、点検・調査結果等の維持管理情報を整理できるシステムと連動させたクラウド形式のシステムを構築しました。

資産活用については、現時点で処理水の利用や下水汚泥・焼却灰のたい肥化などの検討を行っていますが、施設設置スペースの確保や費用対効果に課題があり、太陽光発電なども含めて更なる検討が必要です。

(3)財政計画

計画に沿って1回目の料金改定を行い、概ね計画どおりに進んでいます。一方で、インフレ時代への対応が必要です。

(4)進捗管理・検証・見直し

経営戦略 2021 については、毎年度、事業評価を行い、常設した下水道事業運営審議会へ進捗報告を行い、意見をいただきました。個別の事業では、直面した課題等から計画を見直し改善することができた事業があった一方、下水道事業全体では、事業の遅れに対する課題等を特定し、見直し改善する体制の構築には至りませんでした。

鎌倉市下水道事業運営審議会からの意見

「コラム②投資の計画と実績(P15)」から、5年間でインフラを適切にマネジメントするために必要な経費は約 162 億円と推計していますが、そのうち、具体的な計画(経営戦略 2021)として作成できた経費は約 85 億円、さらに、そのうち実行できたのは約 24 億円となります。

このことから、インフラの適切な管理のための計画は、先送りにされており、長期的な視点において、事故が起こるリスクや、補修更新、維持管理にかかるコストは増大していきます。これは鎌倉市だけでなく、日本中・世界中でインフラの必要な補修更新ができず、様々な問題が起きています。

これまでインフラを新たに整備してきた時代とは異なり、今後、インフラを改築・更新し維持管理する時代においては、市民等への配慮は当然に、環境やエネルギーなどへの配慮、新しい技術やDXの活用、財政面のことなど、広範な知識や経験を要します。必要な技術力と経験を持った技術者を確保・養成することが事業持続のキーとなります。また、担い手が不足している中で、事業者を確保し、適切に管理しながら事業を進めていく必要があります。

このように、インフラを適切に管理するための計画を作成する「組織・体制」、それを着実に実行する「組織・体制」は、これからの時代、非常に重要となってきます。経営戦略 2026 を確実に実行していくためにも、「組織・体制」の構築については、積極的な取組の推進をお願いします。

Ⅲ 経営戦略2026

長期見通し:30年後

(令和 37 年度(2055 年度))

中 期 計 画:10 年間

(令和8年度(2026 年度)から令和 17 年度(2035 年度)まで)


1 下水道事業を取り巻く環境・予測

(1) 下水道事業を取り巻く環境

① 人手不足・情報化社会へ

- 国土交通白書2024によると、日本の就業者数は、女性就業者数や高齢就業者数の増加に伴い、1990年代後半の水準を上回っています。
- 一方で、高齢就業者数の割合が多い建設業の就業者数は、急速な高齢化の進行に伴い、令和3年(2021年)時点で、55歳以上の占める割合が35.3%、29歳以下が12.0%となっています。就業者のうち55歳以上の占める割合が、全産業平均より高い水準で増加傾向にある一方、就業者のうち29歳以上の占める割合の増加は緩やかであり、今後、高齢就業者の大量退職が見込まれることから、将来の担い手不足が懸念されます。
- また、地方公共団体の職員数については、平成6年(1994年)の約328万人をピークに、令和6年(2024年)には約281万人まで減少しています。
- 国では、職員数減少等による執行体制の脆弱化(ヒト)、老朽化施設の加速度的な増加(モノ)、施設更新費用の増大、人口減少等に伴う使用料収入の減少など厳しい財政状況(カネ)などの下水道事業が抱える課題を解決するため、「下水道事業におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)¹²」を推進しています。
- 国が推進している「下水道事業におけるDX」の主なものとして、「①行政手続き・サービスの変革」、「②現場の安全性や効率化を向上」、「③業務プロセスや働き方を変革」、「④DXを支えるデータ活用環境の構築」があります。

下水道におけるデジタルトランスフォーメーション(DX)のイメージ

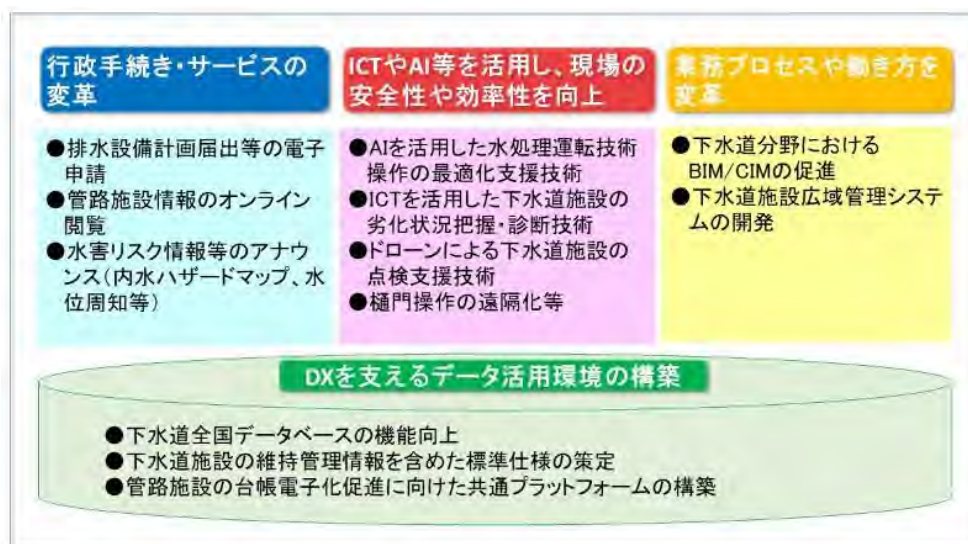

出典: 国土交通省ウェブサイト

https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/mizukokudo_sewerage.tk.000603.html

¹² データとデジタル技術を活用して、組織や仕組み等を抜本的に変革するとともに、ICTの浸透が人々の生活をあらゆる面でより良い方向に変革させること。

② 物価等の高騰

- 企業間で取引される商品(モノ)の価格に焦点を当てた物価指数である「企業間物価指数(総平均)」において、最新の基準となる2020年基準(2020年を100として指数化)を用いて比較すると、30年前(平成7年度(1995年度))に「101」であったものが、令和3年度(2021年度)から上昇を始め、令和6年度(2024年度)3月では「126」となっています。
- 例えば、本市の下水道終末処理場の運転管理に要する動力費は、物価の高騰を一要因として、令和元年度(2019年度)決算額では、約2億3,800万円(税抜)でしたが、令和6年度(2024年度)決算では、約2億7,900万円(税抜)となっており、5年間で約17.2%増額となっています。
- 本市の下水道事業の企業債借入先である地方公共団体金融機構において、借入利率は、令和元年度(2019年度)末に0.35%でしたが、令和6年度(2024年度)末に2.30%となっています。
- このようなインフレ時代においては、物価等の上昇を前提とした計画づくりが必要となっている一方で、経済・物価動向を巡る不確実性は高いものとなっています。

③ 自然災害の多発・激甚化、事故の多発化

a 集中豪雨

- 近年、集中豪雨の頻発により、全国の1時間当たりの降水量50mm以上の大雨の年間発生回数は増加しています。気象庁によると、全国の最近10年間(平成27年(2015年)～令和6年(2024年))の平均年間発生回数(約334回)は、統計期間の最初の10年間((昭和51年(1976年)～昭和60年(1985年))の平均年間発生回数(約226回)と比べて、約1.5倍に増加しています。¹³
- 令和3年(2021年)5月に、下水道法を含む「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律」が公布され、気候変動の影響を踏まえた計画雨水量を設定し、下水道による都市浸水対策の中長期的計画に見直す「雨水管理総合計画」の策定を要請されました。

b 地震・津波等

- 政府の地震調査委員会によると、令和7年(2025年)1月1日時点における南海トラフ地震の今後30年以内の地震発生確率は「60%～90%程度以上」と高いものとなっています。¹⁴
- また、首都直下地震が発生した場合、被災直後(停電考慮あり)の下水道機能支障人口は、首都圏全体で約200万との被害想定が出ています。¹⁵

¹³ 出典:気象庁ホームページ「大雨や猛暑日など(極端現象)のこれまでの変化」
https://www.data.jma.go.jp/cpdinfo/extreme/extreme_p.html

¹⁴ 出典:「南海トラフの地震活動の長期評価(第二版一部改訂)のポイント」(地震調査研究推進本部)
https://www.jishin.go.jp/main/chousa/25sep.nankai/nankai_gaiyou1.3.pdf

¹⁵ 出典:「首都直下地震対策検討ワーキンググループ報告書(令和7年12月19日公表)」
https://www.bousai.go.jp/jishin/syuto/taisaku_wg_02/pdf/r7houkoku3.pdf

- 令和6年(2024年)1月1日に発生した能登半島地震では、マグニチュード7.6、最大震度7を観測し、下水を処理する施設にも甚大な被害が発生しました。能登半島地震では、耐震化していた施設では概ね機能が確保できていたものの、耐震化未実施であった施設等で被害が生じたことで広範囲の下水管内で滞水が発生するとともに、復旧の長期化を生じさせました。
- 国土交通省は、これを踏まえ、全国の水道事業者及び下水道管理者に対して、上下水道一体で耐震化を推進するため「上下水道耐震化計画」の策定について、要請しました。
- 津波について、神奈川県が平成27年(2015年)3月に公表した「津波浸水想定図」では、鎌倉処理区の低地部が津波で浸水すると想定されており、6箇所の中継ポンプ場のうち、東部ポンプ場を除く5箇所が水深5～10m程浸水すると想定しています。
- 大規模噴火時における降灰について、国土交通省では令和5年(2023年)4月に下水道BCP策定マニュアルを改定し、現代人が誰も経験したことがないような大規模な噴火による降灰についても想定するとともに、実効性の高い「下水道BCP」へと改善するために、必要となる事項について、参考事例とともに整理を行いました。
- 大規模噴火による降灰について、鎌倉市地域防災計画では、市内の一部において、10cmから30cmの降灰深を想定しています。
- 本市下水道事業では、令和6年(2024年)2月に「鎌倉市下水道BCP」を改定し「大規模噴火降灰災害編」を加え、「下水道機能の継続と早期回復のための優先業務」や「最低限、準備しておくもの」などについて取りまとめています。

c 事故の多発化

- 全国の下水道管路に起因する道路陥没は、令和4年度(2022年度)で約2,600件発生しています。また、布設後40年を経過すると陥没箇所数が急増する傾向にあります。¹⁶
- 令和7年(2025年)1月に埼玉県八潮市で発生した下水道管路の破損に起因すると考えられる道路陥没は、一時は約120万人に下水道の使用自粛を求める事態となりました。また、同年8月には、同県行田市で下水道管の点検中に作業員4人が死亡する事故が発生しました。これらが与える社会的な影響は大きく、下水道を含むインフラ全体の老朽化は注目度の高いものとなっています。

④ 下水道分野における地球温暖化対策(グリーンイノベーション下水道)

- 令和3年(2021年)10月に閣議決定された「地球温暖化対策計画」では「2050年までに温室効果ガス排出を全体としてゼロにする、すなわち「2050年カーボンニュートラル」の実現を目指す」ことを目標としており、下水道分野では「創エネ・省エネ対策の推進」及び「下水汚泥焼却施設における燃焼効率の高度化等」の2項目が位置付けられました。
- これを受けて、国土交通省では、脱炭素・循環型社会への転換を先導する「グリーンイノベーション下水道」を目指し、令和4年(2022年)3月に「脱炭素社会への貢献のあり方検討小委員会 報告書」を取りまとめ公表しました。

¹⁶ 出典:第1回下水道等に起因する大規模な道路陥没事故を踏まえた対策検討委員会「資料2-2 下水道施設管理等の現状」<https://www.mlit.go.jp/mizukokudo/sewerage/content/001867818.pdf>

- 「グリーンイノベーション下水道」を実現するため、「①下水道が有するポテンシャルの最大活用」、「②温室効果ガスの積極的な削減」、「③地域内外・分野連携の拡大・徹底」の三つの方針が挙げられています。

⑤ 財政悪化(国・地方公共団体)


- 日本の債務残高は GDP の2倍を超えており、主要先進国の中でも最も高い水準にある一方、今後も社会保障関係費は増えることが見込まれています。¹⁷
- 地方公共団体において、地方税収はリーマンショック等による落ち込みはあったものの、増加基調で推移していますが、地方公共団体間での税収の偏在等により、行政サービスの地域間格差のおそれ等が指摘されています。¹⁸
- 鎌倉市においては、地方債残高が減少傾向にあるものの、今後は公共施設の再編やインフラの更新などを控えていることや、近年の人件費の上昇や物価高騰などを踏まえると、慎重な財政運営が求められています。

¹⁷ 出典:財務省「これからの日本のために財政を考える」

https://www.mof.go.jp/policy/budget/fiscal_condition/related_data/202504_kanryaku.pdf

¹⁸ 総務省「持続可能な地方行財政のあり方に関する研究会 報告書」を基に作成

https://www.soumu.go.jp/main_content/001027557.pdf





コラム⑤雨水管理総合計画

1 雨の強さの見直し

これまでは、1時間当たり57.1mm、10分当たり19.4mmの降雨に耐えられるように計画、整備を進めていましたが、近年、短時間で狭い範囲に大量の激しい雨が降るゲリラ豪雨が増加しています。そのため、新たな雨水管理総合計画では、近年の降雨データに将来の気候変動を考慮し1.1倍した1時間当たり59.7mm、10分当たり21.3mmを計画降雨として、一部地域の整備を進めます。

	雨水管理総合計画	現行計画	比率
降雨強度式	$I=4725/(t+27)$	$I=5600/(t+38)$	
10分雨量 (mm)	127.7	116.6	109%
60分雨量 (mm)	59.7	57.1	104%

想定する雨
の強さ
(10分毎)

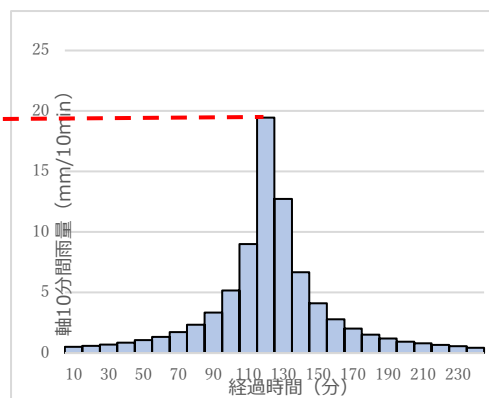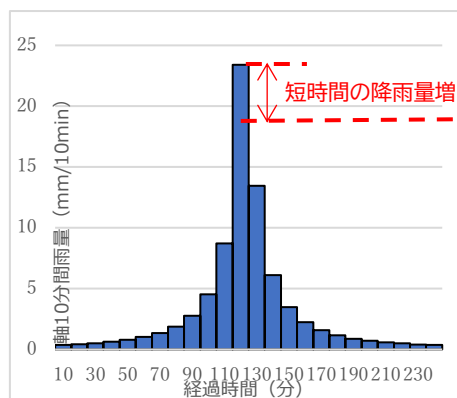

2 対策目標

雨水管理総合計画では、「20cm以上の浸水被害を概ね解消する」ことを目的に「河川や管渠に流す」「一時的に貯める」「地中に浸透させる」「浸水する可能性があることを知らせる」といった四つの対策を軸に、地区ごとの特性を踏まえた総合的なハード対策、ソフト対策を実施します。

対策目標 20cm以上の浸水被害を概ね解消する


総合的な浸水対策

流す	貯める	浸透させる	知らせる
●管渠整備 ●ポンプ施設等の整備 ●河川の整備 ●河川・道路等排水施設との連携	●雨水調整池・貯留管	●雨水浸透枳等の浸透施設(官民連携)	●水位情報などの公表 ●防災情報マップの公表 ●雨水出水浸水想定区域図 ●各種ハザードマップの公表

Ⅲ 経営戦略2026

3 整備対象区域

整備対象区域は、浸水実績が多く、かつその浸水実績が床上浸水を超える被害がある場所で、浸水シミュレーション上の浸水リスクが高いエリアとし、本市では八つのブロックを整備対象区域として位置付けています。この八ブロックでは、1時間当たり59.7mmを計画降雨とし、総合的な浸水対策を行い、それ以外の地区は、従来の1時間当たり57.1mmを計画降雨として浸水対策を行います。

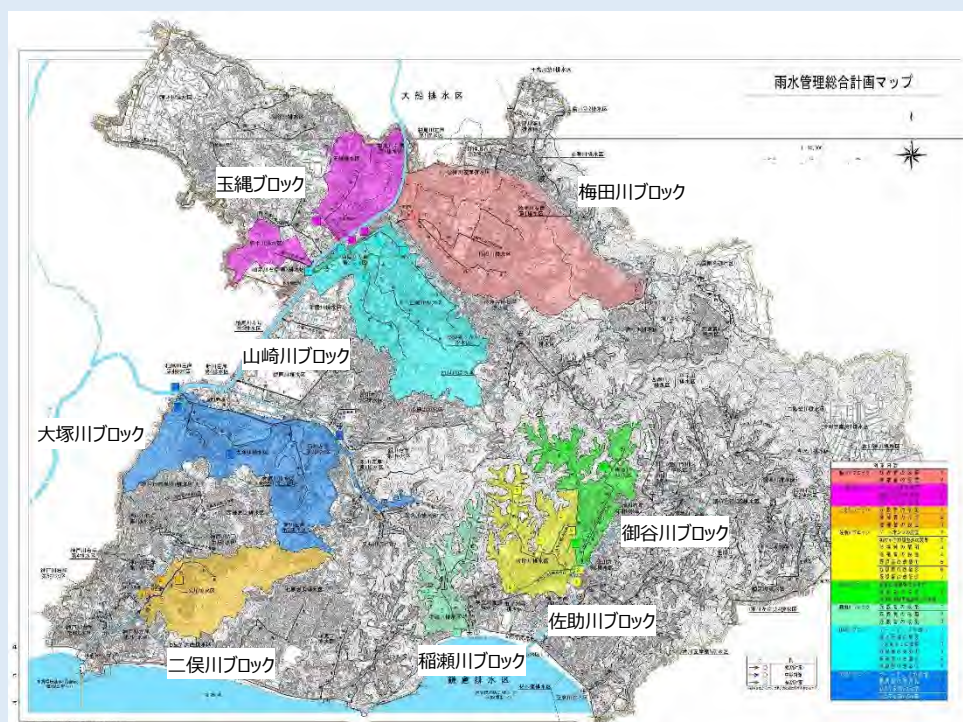

4 段階的な整備目標

雨水管理総合計画では、家屋浸水等の解消を目標に、特に生命の危機に関わる床上浸水の解消を優先的に行います。短期・中期・長期と段階的に整備することで徐々に浸水を解消し、計画降雨に対しては浸水解消、既往最大降雨に対しては、床下浸水の解消を目指します。一方、想定最大降雨に対しては、ハード対策は行わず、ソフト対策を行います。

	計画降雨における対策 (59.7mm)	既往最大降雨における対策 (78.5mm)	想定最大降雨における対策 (153mm)
短期 (～10年)	床上浸水解消	床上浸水解消一部解消	
中期 (10年～20年)	床下浸水解消	床上浸水解消	安全な避難確保 逃げ遅れゼロ
長期 (20年～40年)	浸水解消	床下浸水解消	

Ⅲ 経営戦略2026


(2) 下水道事業に関する予測

緩やかに減少をはじめている本市の人口は減り続け、有収水量¹⁹と下水道使用料収入も減り続ける見込みです。改築更新を進めなければ、標準耐用年数を超えた老朽管の割合は26.6%(令和7年度(2025年度))から48.7%(令和17年度(2035年度))に増加し、耐用年数の短い処理設備はさらに老朽化が進みます。今後は、膨大な施設の再構築を可能とする計画・執行体制の確保や激甚化する災害、DX社会への対応などが求められます。

	令和7年度 (2025年度見込み)	令和17年度 (2035年度)	増減 ²⁰
処理区域内人口の予測	171千人	164千人	-6千人
有収水量の予測	17,567千m ³	16,086千m ³	-1,480千m ³
下水道使用料収入の予測	27.4億円	25.2億円	-2.1億円
有形固定資産減価償却率	30.8%	64.2%	+33.4%
管きょ老朽化率	26.6%	48.7%	+22.1%

① 処理区域内人口の予測

本市の下水道普及率²¹は約97.8%(令和7年(2025年)4月1日現在)となっており、処理区域内人口は、行政区域内人口の減少に伴い、171千人から、令和17年度(2035年度)には164千人に減少していく見込みです。²²

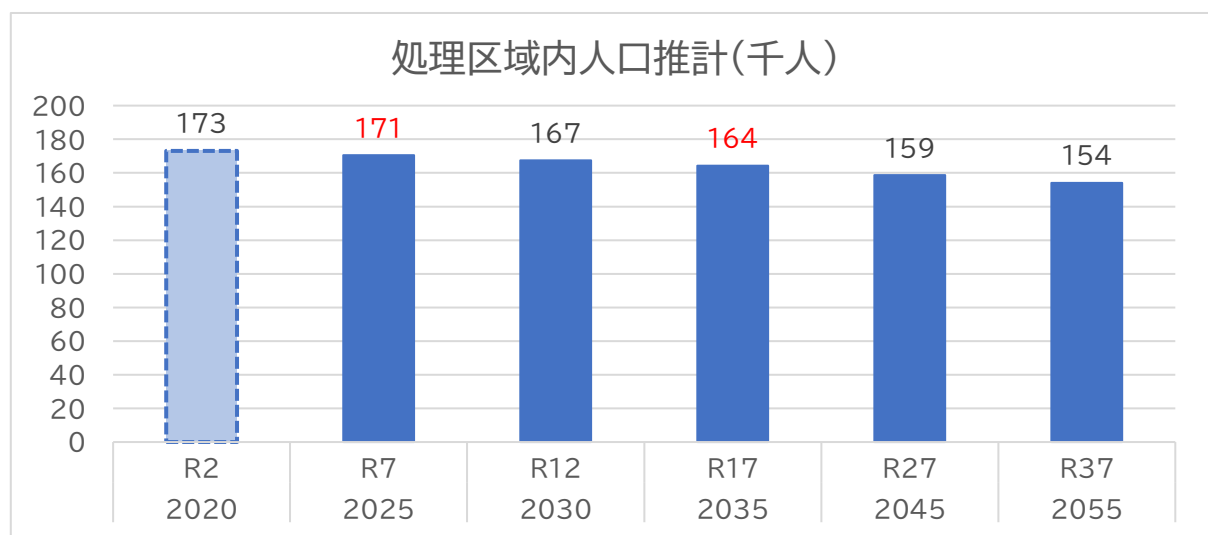

¹⁹ 下水道使用料徴収の対象となる水量

²⁰ 各項目において、表示単位未満で四捨五入しているため、増減の数値と合わない場合があります。

²¹ 行政区域内の総人口に占める処理区域内人口の比率(処理区域内人口/行政区域内人口)


²² 処理区域内人口推計方法:

- ・下水道普及率が約97.8%のままほぼ横ばいで推移していくと想定
- ・令和5年度(2023年度)の処理区域内人口を基に、国立社会保障・人口問題研究所による将来推計人口の増減率を加味して算出

Ⅲ 経営戦略2026


② 有収水量の予測

水洗化人口は、処理区域内人口の減少に併せて、減少していく見込みです。また、一人当たりの有収水量はコロナ禍において一時的に増加しましたが、節水型機器の普及や生活様式の変化などにより、緩やかに減少していく見込みです。このため、総有収水量についても、水洗化人口、一人当たりの有収水量の減少に伴い、17,567 千 m^3 から 16,086 千 m^3 に減少していく見込みです。²³

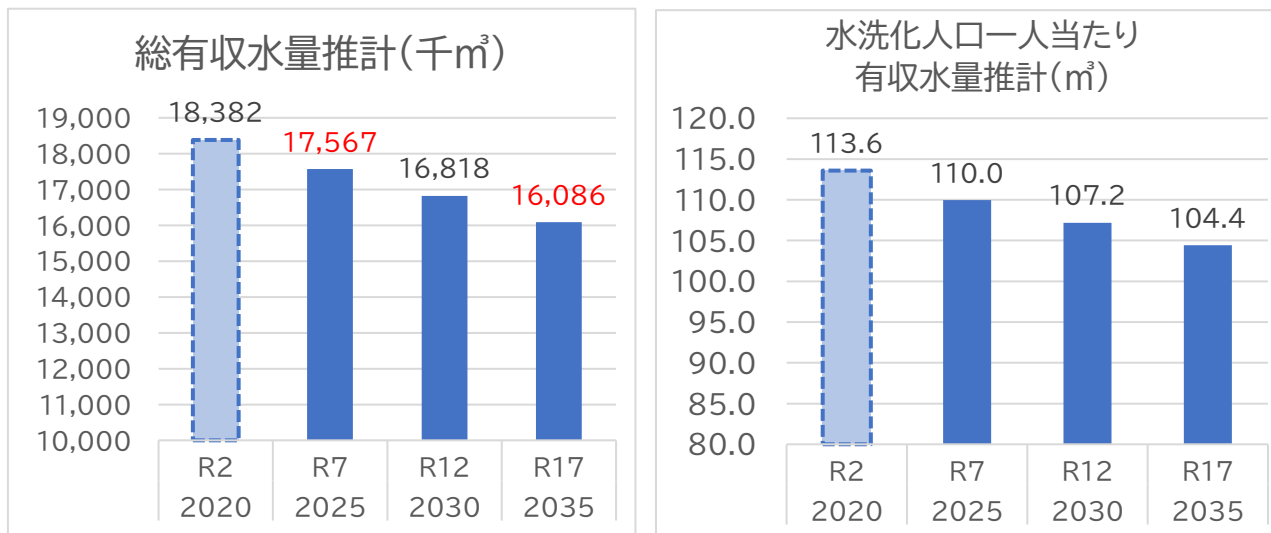

③ 下水道使用料収入の予測

下水道使用料収入は、令和5年度(2023年度)に使用料改定を行ったことにより増加しましたが、有収水量の減少に伴い、27.4 億円から 25.2 億円に減少していく見込みです。²⁴

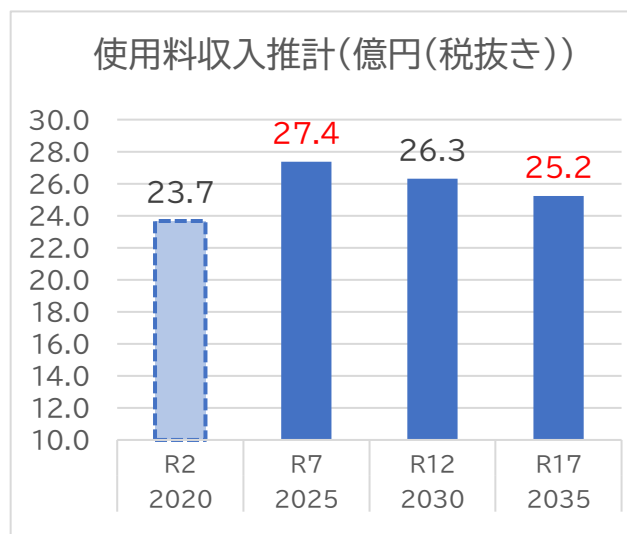

²³ 有収水量推計方法:

- ・水洗化人口は、処理区域内人口及び水洗化率(水洗化人口/処理区域内人口)の推計値を基に算出
- ・水洗化率は、普及率同様ほぼ横ばいで推移していくと想定
- ・一人当たりの有収水量は、令和5年度(2023年度)の実績を基に、コロナ禍前の5年間(平成27年度(2015年度)から令和元年度(2019年度)まで)の実績による平均減少率を加味して算出
- ・総有収水量は、水洗化人口及び一人当たりの有収水量の推計値を基に算出


²⁴ 使用料収入推計方法:

- ・現在の使用料単価を用いて、有収水量の推計値及び過去5年間(令和元年度(2019年度)から令和5年度(2023年度)まで)の調定実績に基づき算出

④ 下水道施設の予測


a 有形固定資産減価償却率²⁵の予測

今後、新たな投資等を行わない場合、有形固定資産減価償却率は、約 30.8%から約 64.2%に増加する見込みです。

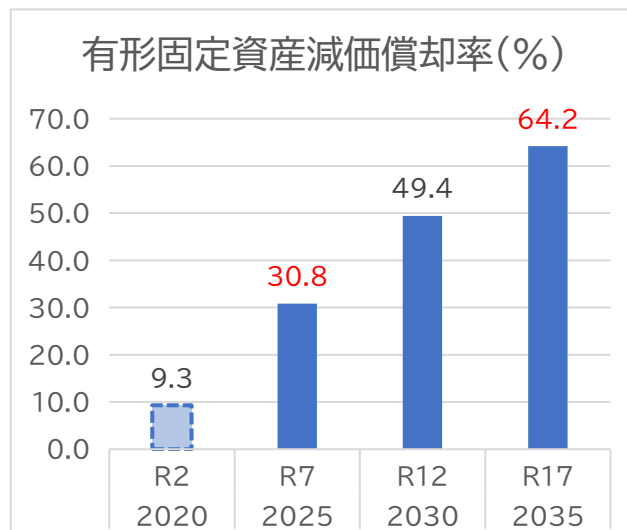

b 管きょ老朽化率²⁶の予測

今後、改築更新等を行わない場合、管きょ老朽化率は、26.6%から、令和 17 年度(2035 年度)には48.7%に増加する見込みです。

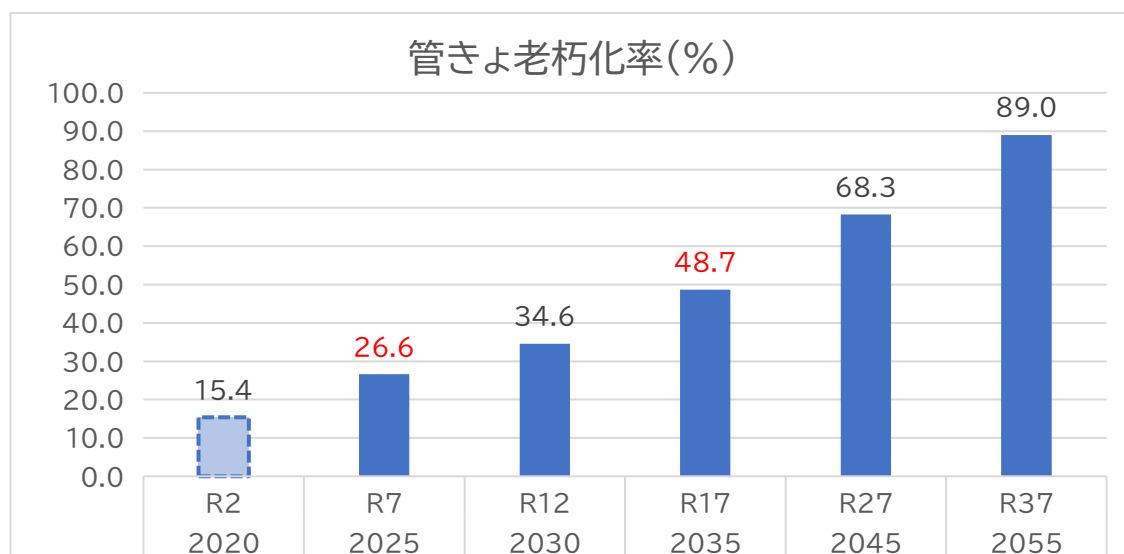

⑤ 組織・体制の予測

本市は、都市整備部に 7 課・2センターを有しており、そのうち、下水道事業を管轄しているのは、道水路管理課、下水道経営課、下水道河川課、作業センター、浄化センターの3課・2センターです。令和6年度(2024 年度)末時点における各課等の人数及び業務内容は、次のとおりです。

今後も安定した下水処理に向けて、十分な組織・体制の確保を図っていきますが、本市職員の採用状況について、土木職、電気職の採用者数は少なく、令和6年度(2024 年度)は、土木職3

²⁵ 有形固定資産のうち償却対象資産の減価償却がどの程度進んでいるかを表す指標で、資産の老朽化度合を示しています。一般的には、数値が 100%に近いほど、保有資産が法定耐用年数に近づいていることを示しています。

²⁶ 法定耐用年数を超えた管きょ延長の割合を表した指標で、管きょの老朽化度合を示しています。一般的には、数値が高い場合には法定耐用年数を経過した管きょを多く保有しており、管きょの改築等の必要性を推測することができます。数値が高いほど、管きょの改築必要性は高くなります。

Ⅲ 経営戦略2026

人、電気職2人、令和7年度(2025年度)は土木職1人、電気職0人となっています。また、下水道事業所属職員のうち年齢50歳以上の職員が半数を占めています。


本格的な改築更新時代を迎え、これ以上、投資を先延ばししないためには、新設よりも高度な技術力と膨大な施設の改築更新を実行できる体制を構築することが、本市・受託者とも必要で、減少が続いてきた状況に対して、様々な取組が緊急です。


令和6年度(2024年度)末時点における各課等の人数及び業務内容

課等名	人数	担当名	主な業務内容
道水路 管理課	1.0人 (総数8.0人)	路政担当	水路占用・管理
下水道 経営課	12.5人	経営計画担当	下水道事業に関する統計・報告、公共下水道・雨水調整池(ポンプ排除方式)等に関する計画
		料金担当	下水道使用料、受益者負担金、受益者分担金、補助金と貸付金、指定工事店の指定、責任技術者の登録
		設備担当	排水設備工事に関する確認申請・検査、指導・調査
下水道 河川課	6.0人 (総数10.0人)	下水道担当	公共下水道に関する企画・調査、下水道台帳の整備、公共下水道・雨水調整池(ポンプ排除方式)の建設・維持管理
作業センター	6.5人 (総数19.0人)	作業担当	道路・下水道・河川・緑地の補修作業
浄化センター	12.0人	施設担当	下水道終末処理場・汚水ポンプ場・雨水ポンプ場の運転・維持管理
		水質管理担当	下水道終末処理場等の水質管理・水質分析、事業場排水指導

※人数のうち総数は、一般会計所属職員も加えた人数です。

下水道事業職員の年齢構成割合

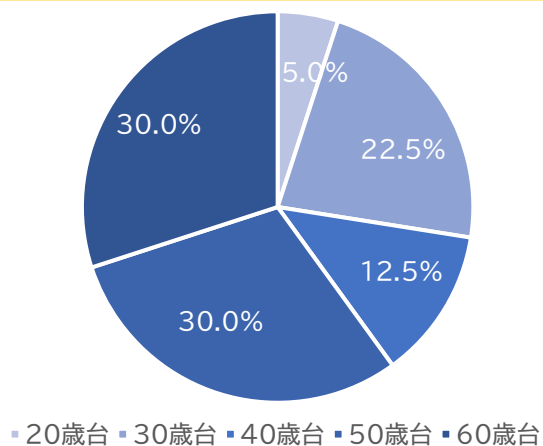




コラム⑥鎌倉市下水道 BCP

※BCP：Business Continuity Plan(事業継続計画)

1 下水道 BCP の適用範囲

鎌倉市下水道 BCP は、「鎌倉市地域防災計画」、「鎌倉市都市整備部災害時対策計画」に含まれた下水道施設の機能低下時に対応するための業務継続計画となり、発災時からの暫定機能確保段階(概ね 30 日間)までの行動計画となります。

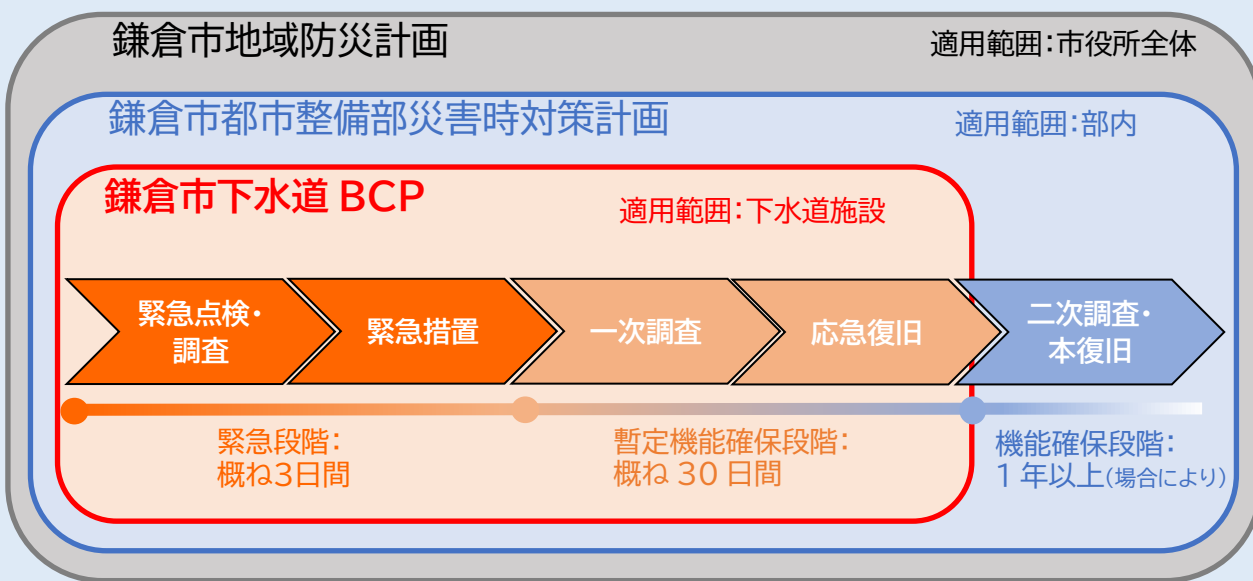

2 下水道 BCP の趣旨と基本方針

趣旨

- ◆ 大規模な災害、事故、事件等で職員、庁舎、設備等に相当の被害を受けても、優先実施業務を中断せず、中断しても許容時間内に復旧すること
- ◆ 災害時におけるリソースの制約を受けた状態にあっても機能を維持または早期回復すること
- ◆ 平時から災害に備えること

基本方針

市民、職員、関係者の安全確保

災害発生時の業務の継続・早期復旧にあたっては、市民、職員及びその家族の安全確保を第一優先とする。

下水道事業の責務遂行

市民生活や地域経済活動のために必要となる下水道が果たすべき重要な機能を優先的に回復する。

3 鎌倉市下水道 BCP の構成

鎌倉市下水道 BCP は、「大正型関東地震」と「南海トラフ巨大地震」による被害を対象とした【Ⅰ地震・津波編】、近年多発している集中豪雨や台風などの被害を対象とした【Ⅱ水害編】、富士山の噴火を対象とした【Ⅲ大規模噴火降灰災害編】及び職員の連絡先等を記載した【Ⅳ資料編】の四編構成となっています。

鎌倉市下水道 BCP

Ⅰ 地震・津波編

- 1 下水道 BCP の趣旨と基本方針
- 2 非常時対応の基礎的事項の整理
- 3 非常時対応計画
- 4 事前対策計画
- 5 訓練・維持改善計画
- 6 想定根拠とした調査・分析・検討

Ⅱ 水害編


- 1 水害編における山崎浄化センターの位置付け
- 2 体制、運用及び連絡先等
- 3 想定災害
- 4 自動参集
- 5 「鎌倉市浄化センター災害対策マニュアル」との関係について
- 6 非常時対応計画(事前対応)
- 7 事前対策計画
- 8 保有資材と調達先
- 9 非常時対応計画
- 10 訓練計画

Ⅲ 大規模噴火降灰災害編

- 1 はじめに
- 2 降灰の主な影響
- 3 降灰時及びその後の気象状況による臨機対応
- 4 降灰へ至る事前情報の把握
- 5 下水道施設の具体的な影響
- 6 体制及び連絡先等
- 7 勤務時間外における参集について
- 8 非常時対応計画
- 9 携行品に加え必要となる装備

4 非常時対応計画【Ⅰ 地震・津波編】

大規模な災害が発生した際に、下水道事業が機能停止状態に陥っても、人手や資材が不足する中で優先順位の高い業務を迅速に回復・継続するための詳細な行動計画です。鎌倉市下水道 BCP では、発災直後から概ね 30 日間の非常時対応計画を定めています。

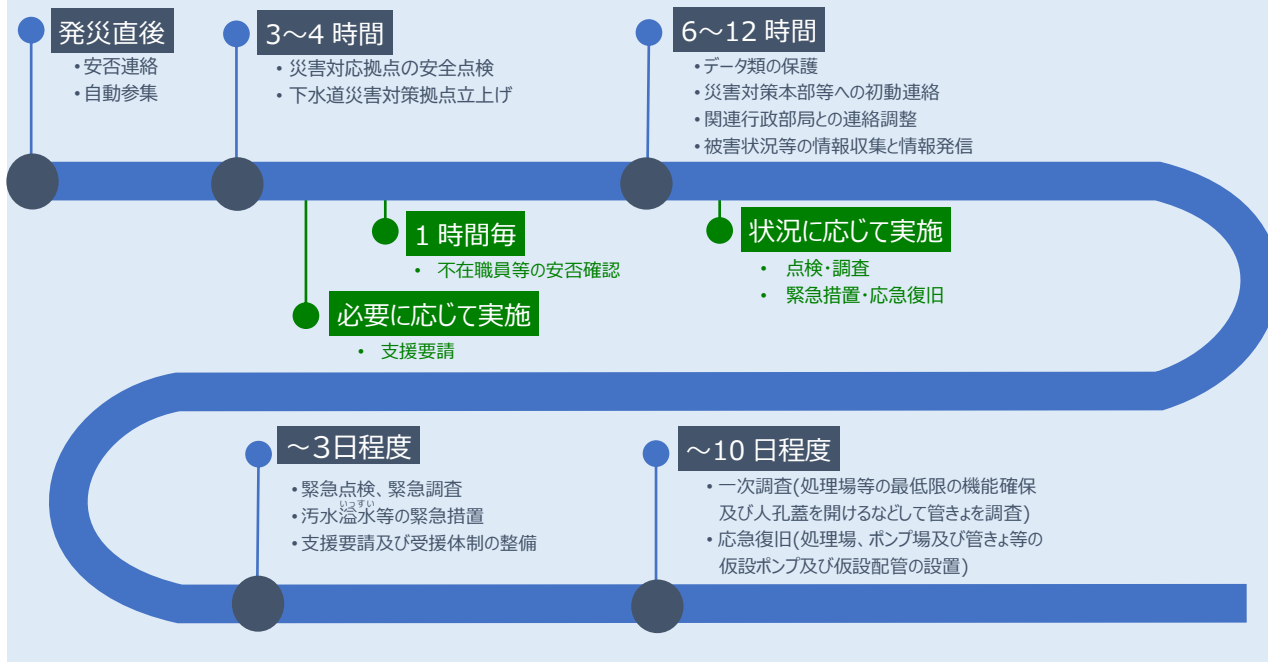


2 課題の整理

(1)膨大な下水道施設の急速な老朽化と災害脆弱性

■膨大な下水道施設の急速な老朽化

① 污水管きよ

- 污水管きよが老朽化し破損すると、木根侵入の発生や大雨時の浸入水に伴う^{いっすい}溢水や宅内への逆流などが発生します。また、破損した污水管きよに周囲の土砂が流れ込み、道路の陥没が発生します。
- 本市では、市民から下水道河川課に年間 200～250 件の様々な要望や通報があります。このうち、木根侵入による污水管きよの閉塞など下水道施設の不具合等に対する修繕や補修による対応が必要な要望・通報は、年間 60～80 件です。また、下水道施設の破損が原因とみられる道路陥没は、年間5～6件発生しています。
- 本市の公共下水道(污水)の整備率は、令和6年度(2024 年度)末時点で、約 97.9%となっており、総延長は約 490km となっています。
- 標準耐用年数を超えた割合は、令和7年度(2025 年度)末時点で、約 26.5%(約 130km)となり、対策を実施しない場合、10年後の令和17 年度(2035 年度)末には、約 50.6%(約 248km)となります。

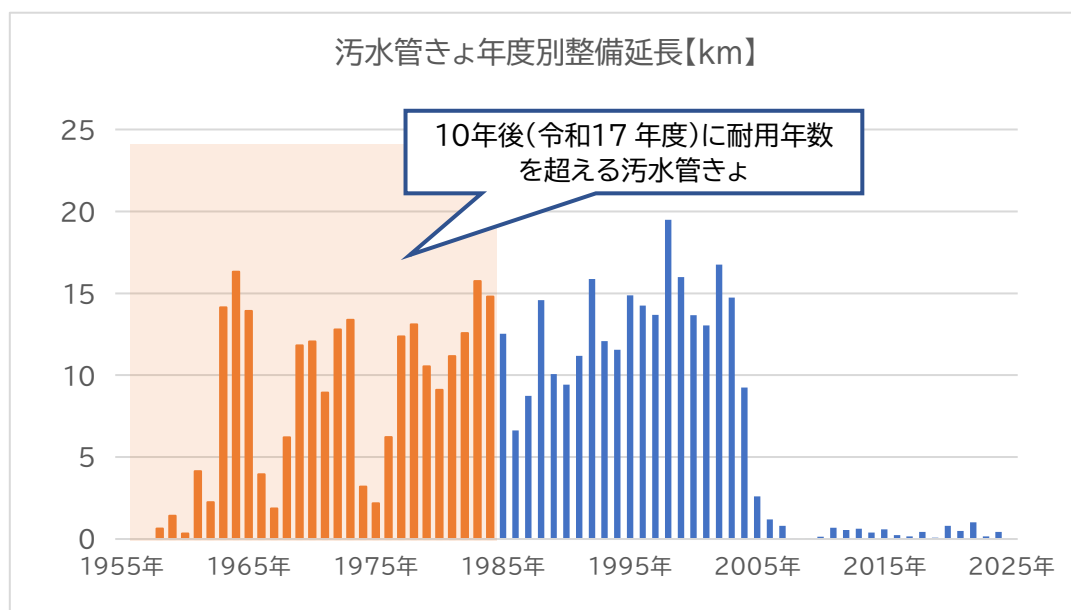

- 今後、対策を行わない場合、老朽化の進行に伴い、さらに破損件数の増加が予測されます。
- また、昭和40年代に開発された民間開発団地は、宅地内から本管へ排水する取付管が、陶管や Z パイプ(硬質瀝青管)²⁷を使用していることが多く、劣化による破損が多発しています。
- 旧規格のマンホール蓋が老朽化により、破損や摩耗、浮上すると、交通事故が発生します。
- 大規模災害時における交通機能を確保するため、緊急輸送道路など重要な污水幹線に設置している旧規格のマンホール蓋の調査を行う必要があります。

²⁷ 紙でできた管に瀝青材(れきせいざい)を浸透させ、防水効果を高めたパイプ。




Zパイプ(硬質瀝青管)の劣化の状況



木根侵入による汚水管きょ破損の状況



旧規格マンホール蓋(昭和 30～40 年代)

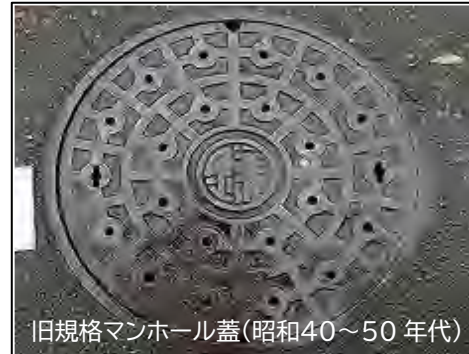

旧規格マンホール蓋(昭和40～50 年代)

② 雨水管きょ等

- 本市の公共下水道(雨水)の整備率は、令和6年度(2024 年度)末時点で、約 79.3%となっており、総延長は約 239km となっています。
- 雨水管きょ等が老朽化により破損等すると、管きょ等に周囲の土砂が流れ込み、道路の陥没が発生します。また、水路敷²⁸が洗掘²⁹されると護岸倒壊が発生します。
- 整備時期が不明な雨水管きょ等が多く、老朽化の実態把握ができていません。



管きょ等の破損による陥没の状況



洗掘による護岸倒壊の状況

²⁸ 水路を維持管理するために設けられた敷地。

²⁹ 水の流れの影響により河岸や河床の土が削られること。

③ 下水道終末処理場

- 七里ガ浜下水道終末処理場は、昭和47年(1972年)の稼働開始から50年以上が経過し、平成20年(2008年)前後に設備の改築更新は行っているものの、老朽化は著しい状況です。しかしながら、持続型下水道再整備事業が完成するまで当分の間は、稼働し続ける必要があります。
- 山崎下水道終末処理場は、平成5年(1993年)の稼働開始から30年以上が経過していますが、これまで、一度も更新していない設備も多く存在しており、老朽化が進んでいます。送風機や汚泥脱水機など基幹的な設備が故障すれば、安定的な下水処理に支障を来すおそれがあるだけでなく、突発的補修には予定外の多額の費用が発生します。



■下水道施設の災害脆弱性(地震・津波・浸水)

① 污水管きよ

- 地震に伴う地盤の液状化現象により、マンホールの浮上やマンホールと污水管きよとの接続部が破損し、汚水流下能力の低下や道路交通の障害が発生するおそれがあります。

② 雨水管きよ等

- 本市では、平成元年度(1989年度)以降、12回の浸水被害が報告されており、市内の既往最大降雨である1時間あたり78.5mmの豪雨では、322軒の家屋被害などが出ています。
- 本市では、10年間に一度の大雨に相当する1時間あたり降水量57.1mmの豪雨でも浸水しないことを目標にしており、計画の79.3%まで整備が進んでいます。
- 一方、水路については、拡張用地の確保が難しく、整備が進んでいません。

③ 下水道終末処理場・ポンプ場

- 鎌倉処理区において、七里ガ浜下水道終末処理場は、土木構造物の耐震性能目標(レベル2地震動)を確保するための工事ができません。また、神奈川県が公表している「神奈川津波想定図」では、汚水中継ポンプ場6箇所のうち東部ポンプ場を除く5箇所が浸水すると想定されており、これにより機能停止するおそれがあります。

- 地震や台風等の風水害により、七里ガ浜下水道終末処理場や汚水中継ポンプ場が停電した場合には、備え付けの非常用発電機により施設の運転は継続できます。しかしながら、津波が襲来した場合には施設全体が水没して下水処理の機能が失われます。施設を復旧するまでの間は、下水道 BCP に基づき仮設水槽を設置して簡易滅菌放流を施す等の緊急対応となり、約 31,000 世帯の汚水が長期にわたって処理できない状況に陥ります。
- 七里ガ浜下水道終末処理場や汚水中継ポンプ場の建物は古く、耐震化や津波浸水を防ぐことは困難な状況です。
- 大船処理区では、山崎下水道終末処理場の一部は、土木構造物の耐震性能目標(レベル2地震動)を満たしておらず、耐震化が必要です。また、津波の心配はないものの、大地震により処理水槽に亀裂が入る等して下水処理の機能が停止すると、施設を復旧するまでの間は、下水道 BCP に基づき仮設水槽を設置して簡易滅菌放流を施す等の緊急対応となり、約 46,000 世帯の汚水が長期にわたって下水処理できない状況に陥る可能性があります。

(2)財政状況の悪化

① 維持管理費・改築更新費の急増


- 物価の高騰等に伴い維持管理費が増大します。
- 持続型下水道再整備事業等の投資計画の見直しにより、建設改良費が増大します。また、建設改良費の増大に伴い企業債の借入額も増大し、借入利率の上昇も相まって資本費が増大します。

② 下水道使用料の減少

- 本市の下水道使用料は、基本使用料と従量使用料を組み合わせる「二部使用料制」と、使用水量が増えるほど1m³当たりの単価を高く算定する「累進使用料制」を採用しています。
- 施設型事業である下水道事業は、使用料対象経費に占める固定的経費の割合が極めて高くなりますが、費用構造に比べて、使用料収入に占める基本使用料の割合が低く、不安定な使用料体系となっています。しかし、固定的経費の全額を基本使用料で回収しようとする、基本使用料が著しく高額となり、小口使用者への負担が大きくなってしまいます。
- 有収水量は、コロナ禍において一時的に増加しましたが、全体としては、人口減少や節水型機器の普及等により、減少傾向にあります。1か月当たり 1,000 m³を超える大口使用者は極めて少なく、一般家庭の使用水量も、世帯人数の減少や生活様式の変化等により減少しており、1か月当たり 20 m³までの使用者が全体の約70%を占めています。有収水量の減少に伴い、使用料収入も減少傾向にあります。
- 経営の安定性を確保するためには、使用実態や今後の見通しを十分に踏まえつつ、受益者全体で下水道事業を支える使用料体系を設定する必要があります。

Ⅲ 経営戦略2026

- 経営戦略 2021 では、維持管理費の全額と資本費の一部を下水道使用料で賄うこととしており、令和8年度(2026 年度)に資本費算入率³⁰50%、令和 11 年度(2029 年度)に資本費算入率60%を目標とした使用料改定を予定していました。しかし、投資計画の見直しや維持管理費の増大などによる支出の増加に伴い、それに見合う収入の増加も必要となるため、目標の達成には下水道使用料の大幅な改定が避けられない状況です。
- 経営戦略 2021 では、令和8年度(2026 年度)の改定率を約 10%と見込んでいましたが、仮試算を行った結果、目標達成に必要な改定率は約 28.5%と、使用者への負担が大きなものになることが判明しました。使用者への過度な負担感を抑えながら、資本費算入率を高めしていく必要があります。

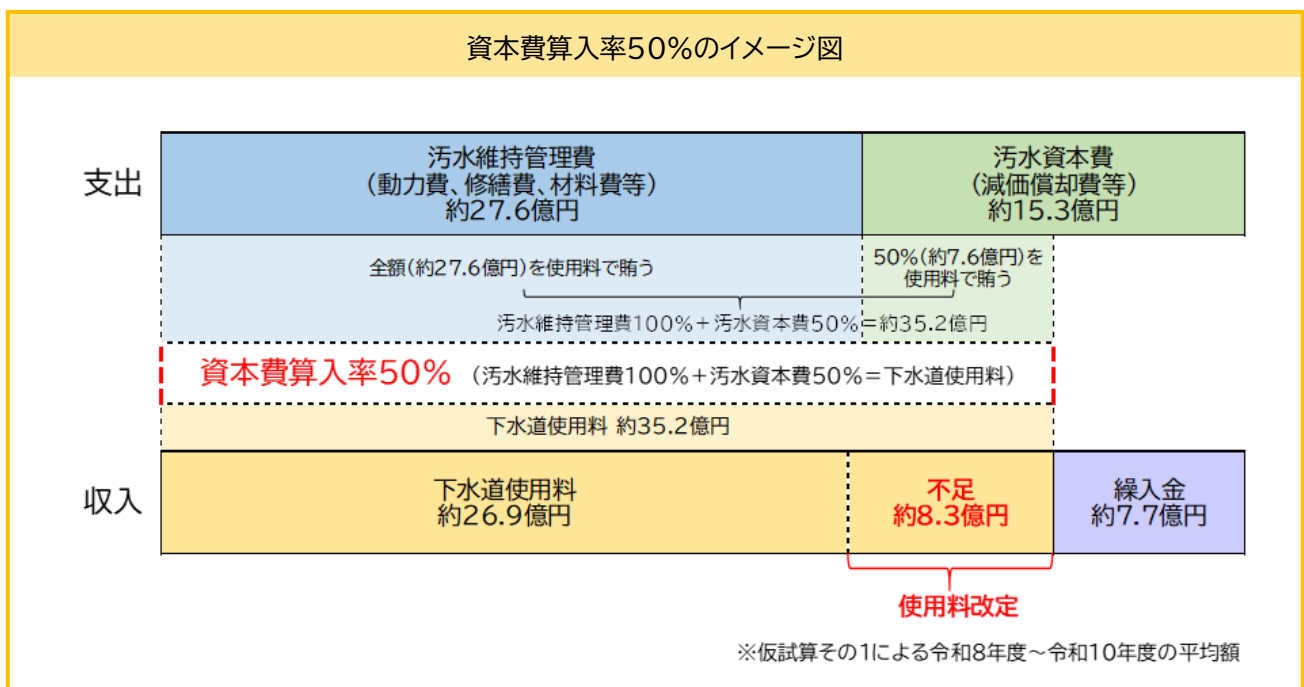

③ 国庫補助金

- 下水道事業では、国の交付金を活用し、汚水管さよの耐震化や下水道終末処理場における設備更新等を実施しています。
- ここ数年間の交付金は、国に要望する交付金額より大幅に減少する状況が続いています。
- 投資・財政計画で見込む国庫補助金の収入がない場合、投資計画どおりに実施できない可能性があります。

³⁰ 現在、本市が下水道使用料の改定をする際に基準としている指標。下水道施設を維持管理していくために必要な費用である「維持管理費(動力費、修繕費、材料費等)」に充当した残りの使用料が、下水道施設を整備するために必要な費用である「資本費(減価償却費等)」に、どれだけ充当されているかの割合。

(3) 執行体制の脆弱化(減少・不足・高齢化)

① 下水道事業会計配置人数の不足

- 本市の下水道事業所属の職員数についても、令和6年度(2024 年度)には38人³¹(事務職員 10 人、技術職員 21.5 人、技能職員 6.5 人)に減少しています。また 50 歳代以上の職員数が半数を占めているため、今後の執行体制の確保や技術力の継承が課題となっています。
- 一方で、今後、投資(建設改良費)は、令和7年度(2025 年度)の約9億円が、令和 17 年度(2035 年度)には、約 143 億円になると見込まれ、業務量が増加するため、執行体制を確保しない場合、事業の進捗に様々な遅滞の生じるおそれがあります。

② 担い手の不足

- 本市が一般競争入札に付した工事は、令和6年度(2024 年度)で44件ありますが、そのうち、20 件が入札不調となっており、工事の請負業者においても担い手が不足している可能性があります。


(4) 下水道分野における地球温暖化対策、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進など

- 下水汚泥が有する有機物の全エネルギーは、日本の下水道分野の電気消費量の約 156%に相当します。またリンについては年間下水汚泥発生量約 230 万トンに約5万トンが含有するなど、農林水産業の持続性に貢献するものと期待されています。
- 本市では現在、下水汚泥や焼却灰は全量を建設資材として再資源化していますが、今後は下水汚泥・焼却灰のたい肥化や炭化燃料化を進めていく必要があります。
- 本市では、令和2年(2020 年)3月に「鎌倉市地球温暖化対策実行計画(事務事業編)」を、令和6年(2024 年)10 月に「鎌倉市地球温暖化対策地域実行計画(地域脱炭素化促進事業編)」を策定し、下水道施設では、令和 12 年度(2030 年度)における温室効果ガス排出量を、平成25年度(2013 年度)の温室効果ガス排出量に対して 30%削減すること、太陽光発電設備の設置が可能な公共施設の約 50%以上に同設備を設置することを目標としています。
- 本市の下水道施設は、令和3年(2021 年)2月から下水道終末処理場等の全ての高圧受電施設において再生可能エネルギー100%の電力を購入しており、令和5年度(2023 年度)実績では、平成25年度(2013 年度)の温室効果ガス排出量に対して約 91.5%削減しています。今後は、山崎下水道終末処理場への太陽光発電設備の導入を検討していきます。
- 下水道終末処理場等の改築・更新や維持修繕・点検記録を電子台帳化することで効率化し、設備機器ごとの時間基準保全(TBM)³²や利用基準保全(UBM)³³、また、センサーを用いた予知保全に基づく高度な維持管理を行うことで、突発的な事故や故障の発生を抑制し、コストの縮減及び平準化を図っていく必要があります。

³¹ 勤務した日が 18 日以上ある月が引き続いて 12 箇月を超える職員を1人とし、これ以外を、0.5 人として計算しています。

³² 設備の特性に応じて予め定めた周期により対策を行う管理方法。

³³ 設備の利用回数や利用量を基準に対策を行う管理方法。



コラム⑦下水道管きょの健全率予測式

国土交通省国土技術政策総合研究所(以下「国総研」という。)では、全国の TV カメラ調査や改築状況を基に算定した「健全率予測式 2025」が公表されています。これを用いることで管路施設全体の劣化状態(緊急度)を経年数毎に予測することが可能となります。

「健全率予測式 2025」によると、コンクリート管は経過年数 50 年において、「劣化なし」と「緊急度Ⅲ」の合計(割合)が 58%となり、約半分以上が経過観察の対応となります。また、硬質ポリ塩化ビニル管(以下「塩ビ管」という。)については「劣化なし」と「緊急度Ⅲ」の合計(割合)が 90%以上という予測となり、管種によって今後の対応も違ってきます。

市内の汚水管きょのうち約3分の2は、塩ビ管です。塩ビ管は昭和 49 年度(1974 年度)ころから使われています。サンプルは少ないですが、国総研のグラフでは、塩ビ管は 100 年でも 60%は「劣化なし」の予測となっています。


そのため、本市では、管の点検・調査を継続的に行い、健全度から優先順位を設定し必要な箇所の補修・更新を実施しています。

なお、本市では、設置からの経過年数が 50 年を超える管きょの割合は、令和7年度(2025 年度)約 26.5%から令和 17 年度(2035 年度)には約 50.6%と増加しますが、この健全化予測式を見ると「経過年数が 50 年を超える」=「施設の寿命」ということではないことが分かります。


本市では、昭和 33 年(1958 年)から下水道事業に着手しており、長い月日が経過していることから、機械設備や伏越し施設などについては、老朽化により不具合が発生していますが、これらの施設については、計画的に補修・更新することとしています。そのほかの一般的な管きょについては、点検・調査を行い、不具合が生じた、もしくは不具合の生じる可能性のある箇所について、予防保全の考えに基づき、計画的に更新を進めることとしています。

健全率予測式 2025

<コンクリート管>

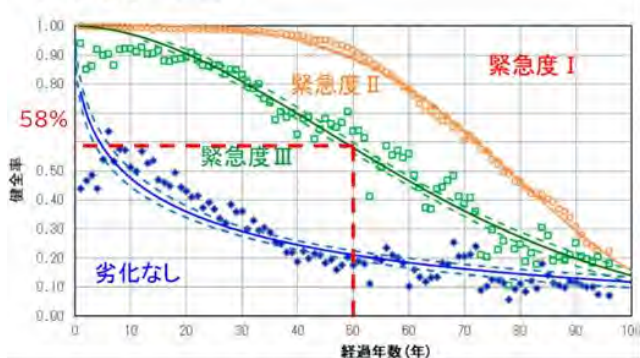


<塩ビ管>

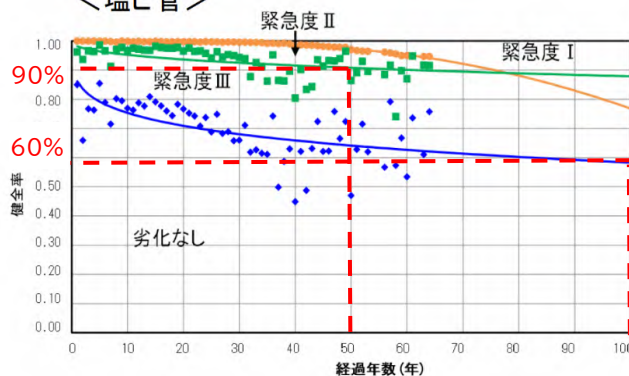

緊急度の区分

区 分	緊急度の区分	
緊急度Ⅰ	重度	速やかに措置が必要な場合
緊急度Ⅱ	中度	簡易な対応により必要な措置を5年未満まで延長できる場合
緊急度Ⅲ	軽度	簡易な対応により必要な措置を5年以上に延長できる場合
劣化なし	健全	特別な措置を講じる必要がない場合


(国総研「下水道きょ健全率予測式 2025」)



コラム⑧雨天時浸入水

1 雨天時浸入水の要因と事象

本市の公共下水道は汚水と雨水を分けて流す「分流式下水道」なっていますが、下水道施設の老朽化の進行や高強度降雨の増加に伴い、大雨時に汚水管の水量が増加し、処理場の負担になるとともに、^{いっすい}溢水や宅内への逆流などの原因となっています。

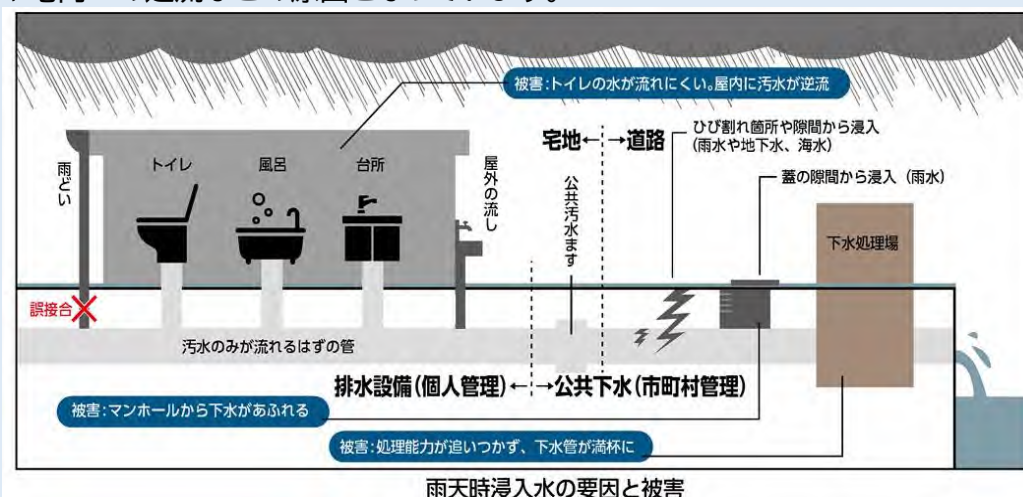

2 雨天時浸入水の調査及び対策

本市では、雨天時浸入水問題解決のため、令和2年度(2020年度)から令和3年度(2021年度)にかけて、鎌倉地域において、雨天時浸入水の影響が大きい区域を絞り込む調査を行い、令和4年度(2022年度)からは、順次絞り込んだ区域において、詳細調査(送煙調査やロボットカメラによる管路調査)を実施して、汚水管への流入経路の特定を進めています。また、令和9年度(2027年度)以降は、調査範囲をさらに広げていく予定です。

これまでの調査の結果では、雨水排水が汚水排水に接続されてしまっている誤接続によるもの、屋外の手洗いからの雨水浸入、汚水本管や取付管の異常によるものなどが判明しており、下水道管のひび割れ部や管の隙間からの浸入の影響が大きい箇所に対して修繕工事や、古いマンホール蓋の蓋開け穴からの浸入水をゴムキャップ等により防ぐなど、対策を講じています。

個人管理の排水設備からの浸入水の影響も大きいいため、誤接続及び排水設備の改良を行って適切に雨水を処理していただくようお願いをしています。



ゴムキャップによる雨水浸入対策

3 経営の基本方針

(1)30年後の下水道事業のあるべき姿(長期目標)

本市では、経営戦略2021の進捗状況や策定後の事業環境の変化・予測を踏まえ整理した四つの課題に対して、経営の基本方針を定め、30年後の鎌倉市の下水道事業のあるべき姿(長期目標)を次のとおりとします。

① 老朽化・脆弱な下水道施設の早期改築更新・耐震化・統合

～ 課題「膨大な下水道施設の急速な老朽化と災害脆弱性」への対応 ～

- 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。
- 下水道施設の耐震化が進み、下水道施設の被害による社会的影響が最小限に抑制されています。また、浸水対策が進み、家屋浸水が解消されています。
- 七里ガ浜下水道終末処理場は、山崎下水道終末処理場に統合されることで、6箇所ある汚水中継ポンプ場は廃止され、津波に対する脆弱性が解消されています。

② 再構築期における財政改革

～ 課題「財政状況の悪化」への対応 ～

- 適切な料金設定により、安定的な下水道使用料収入が確保されています。

③ 再構築期における官民連携

～ 課題「執行体制の脆弱化(減少・不足・高齢化)」への対応 ～

- 下水道施設の再構築や官民連携等の計画を、迅速に作成・執行できる体制が確保されています。
- 官民連携が進むことで担い手不足が解消し、安定した下水道施設の維持管理体制が確保されています。

④ 新たなニーズへの対応(地球温暖化対策、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進)

～ 課題「下水道分野における地球温暖化対策、DXの推進など」への対応 ～

- 下水道事業においても省エネルギー化が進み、あわせて下水道が有する資源が利活用され、地球温暖化対策に貢献しています。
- 下水道施設はデジタル技術を活用し、メンテナンスが高度化・効率化しています。

(2)10年後の下水道事業のあるべき姿(中期目標)

本市では、「(1)30年後の下水道事業のあるべき姿(長期目標)」に基づき、10年後の下水道事業のあるべき姿(中期目標)(令和8年度(2026年度)から令和17年度(2035年度)まで)を次のとおりとします。

- ① 污水管きよは、老朽化に対して改築更新対象箇所における改築更新率を100%にします。また、鎌倉市上下水道耐震化計画に基づき、避難所等の重要施設に接続する下水道管路等の耐震化率を54%にします。

下水道終末処理場は、ストックマネジメント計画に基づき、設備機器ごとに予防・事後保全の区分を明確にし、山崎下水道終末処理場の基幹設備に係る改築更新率を100%にします。また、山崎及び七里ガ浜下水道終末処理場の耐震化率を55%にします。

～(長期目標)「老朽化・脆弱な下水道施設の早期改築更新・耐震化・統合」～

- ② 下水道施設の維持管理や投資に必要な財源を確保するため、資本費算入率60%を目指しますが、市民負担を考慮し、やむを得ず現状維持(37.3%³⁴)とします。

～(長期目標)「再構築期における財政改革」～

- ③ 本格再構築時代における維持管理補修・計画・再構築執行体制を構築し、事業を担う企業の確保策を進めます。

～(長期目標)「再構築期における官民連携」～

- ④ 下水道施設の電力調達に係る脱炭素については、再生可能エネルギー由来100%の電力を調達することで、温室効果ガスの削減を既に目標(令和12年度(2030年度)までに40.2%削減)達成³⁵していますが、設備の改築・更新の際に省エネ型機器を積極的に採用することでこれを更に推進していきます。

深刻な体制不足を補完するために、維持管理を通じて事業プロセス全体のDXを進展します。また、下水道資源の多面的活用を検討を進めます。

～(長期目標)「新たなニーズへの対応(地球温暖化対策、DXの推進)」～

³⁴ 令和5年度決算における資本費算入率

³⁵ 平成25年度(2013年度)に対して、令和5年度(2023年度)実績で、91.5%削減しています。

4 主な取組

(1) 主な取組総括表

10 年間に行うべき事業(主な取組)を以下の表にまとめます。詳細は各項目に記載します。

項 目	目標とする指標	目標数量 令和17年度末 【令和7年度末】	投資額 (試算)
①緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管の修繕・改築	修繕改築を行った緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管の延長	0.74km 【0.33km】	約 1.3 億円
②民間開発団地に埋設している污水管の修繕・改築	修繕改築を行った民間開発団地に埋設している污水管の延長	0.71km 【0.00km】	約 1.6 億円
③重要な污水幹線のマンホール蓋の修繕・改築	修繕改築を行った重要な污水幹線のマンホール蓋の基数	323 基 【208 基】	約0.9億円
④雨水管・雨水調整池の修繕・改築	修繕改築を行った雨水幹線の延長	0.39km 【0.04km】	約3.2億円
⑤下水道終末処理場等の設備の改築・更新	①再構築した山崎下水道終末処理場の主要設備の台数 ②改築・更新をした七里ガ浜下水道終末処理場の主要設備の台数 ③再構築した雨水調整池のポンプの台数	①121台/121台 【0台/121 台】 ② 36 台/36 台 【0 台/36 台】 ③ 22 台/22 台 【0台/22 台】	約352億円
⑥重要な污水幹線の耐震化(マンホール浮上対策、マンホール継手の可とう化)	耐震化工事を行った災害拠点等から下水道終末処理場に接続するマンホールの基数	153 基 【93 基】	約1.2億円
⑦内水浸水の解消	対策に向けた実施設計に着手した重点対策地区数	2地区 【0地区】	約10.9億円
⑧七里ガ浜下水道終末処理場の耐震化	①耐震化工事を行った管理棟の延床面積 ②耐震化工事を行った B 系水処理設備棟(一部)の延床面積	①約 1,988 ㎡ 【0㎡】 ②約 4,012 ㎡ 【0㎡】	約15億円
⑨山崎下水道終末処理場の耐震化	耐震化工事を行った管理棟・沈砂池ポンプ棟等の延床面積	約 24,438 ㎡ 【0㎡】	約113億円
⑩持続型下水道再整備事業	①下水道終末処理場を一元化する幹線の工事完了割合 ②山崎下水道終末処理場の C 系水処理設備の工事完了割合	① 40% 【0%】 ②100% 【0%】	約 235 億円

(2)老朽化・脆弱な下水道施設の早期改築更新・耐震化・統合

① 緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管の修繕・改築

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)		
➤ 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。		
● 解決する課題(再掲)		
➤ 污水管きょが老朽化し破損すると、木根侵入の発生や大雨時の浸入水に伴う ^{いっすい} 溢水や宅内への逆流などが発生します。また、破損した污水管きょに周囲の土砂が流れ込み、道路の陥没が発生します。		
● 取組方針		
➤ 緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管きょ約 26km の修繕・改築は、ストックマネジメント計画に基づき、7年に1回の頻度で点検・調査を行い、修繕改築計画を更新し、老朽化や劣化の著しい污水管きょを優先的に、計画的に工事を実施します。		
➤ その他の污水管きょ 377km は、ストックマネジメント計画に基づき 15 年に1回の頻度で点検・調査を行い、修繕改築計画を策定し、老朽化や劣化の著しい污水管きょを優先して、計画的に工事を実施します。		
● 主な事業の内容		
➤ 緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管きょについては、ストックマネジメント計画に基づき、7年に1回の頻度で点検・調査等を行い、次のとおり事業を進めます。		
	第1期	第 2 期
点検・調査	令和8年度	令和 15 年度
実施設計	令和9年度	令和 16 年度
修繕改築工事	令和 10 年度～令和 14 年度	令和 17 年度～令和 21 年度
実施予定延長	0.33km	0.12km
➤ 現場条件などにより修繕改築工事の実施が困難な污水管きょについては、個別に対応を検討します。		
 管更生施工状況  管更生施工完了		

● 10か年の事業目標と投資額		
令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 修繕改築を行った緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管の延長 0.33km	➤ 修繕改築を行った緊急輸送道路・軌道下に埋設している污水管の延長 0.74km	約 1.3 億円

② 民間開発団地に埋設している污水管の修繕・改築

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。

● 解決する課題(再掲)

- 昭和40年代に開発された民間開発団地は、宅地内から本管へ排水する取付管が、陶管や Z パイプ(硬質瀝青管)を使用していることが多く、劣化による破損が多発しています。

● 取組方針

- 民間開発団地内の污水管きょ 87km は、7年に1回の頻度で点検を行い、修繕改築計画を更新し、老朽化や劣化の著しい污水管きょを優先的に、計画的かつ効率的な工事を実施します。

● 主な事業の内容

- 民間開発団地に埋設している污水管きょについては、次のとおり点検・調査等を行います。

	第1期	第 2 期
点検・調査	令和6年度	令和 13 年度
実施設計	令和8年度	令和 14 年度
修繕改築工事	令和9年度～令和 12 年度	令和 15 年度～令和 17年度
実施予定延長	0. 37km	0. 34km

鎌倉市における民間開発団地



● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 修繕改築を行った民間開発団地に埋設している汚水管の延長 0.00km	➤ 修繕改築を行った民間開発団地に埋設している汚水管の延長 0.71km	約 1.6 億円

Ⅲ 経営戦略2026

③ 重要な汚水幹線のマンホール蓋の修繕・改築

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。

● 解決する課題(再掲)

- 旧規格のマンホール蓋が老朽化により、破損や摩耗、浮上すると、交通事故が発生します。
- 大規模災害時における交通機能を確保するため、緊急輸送道路など重要な汚水幹線に設置している旧規格のマンホール蓋の調査を行う必要があります。


● 取組方針

- 重要な汚水幹線におけるマンホール蓋(115 基)について、修繕改築計画を策定し、老朽化や劣化の著しいマンホール蓋を優先的に、計画的かつ効率的に工事を実施します。

● 主な事業の内容

- 重要な汚水幹線におけるマンホール蓋については、次のとおり調査・工事を実施します。

	第1期	第 2 期
調査	令和7年度	令和 14 年度
修繕改築工事	令和 10 年度～令和 14 年度	令和 15 年度～令和 17 年度

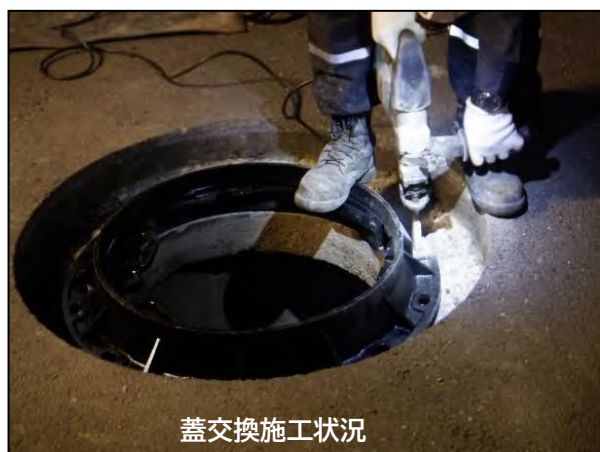

蓋交換施工状況



蓋交換 完了

● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 修繕改築を行った重要な汚水幹線のマンホール蓋の基数 208 基	➤ 修繕改築を行った重要な汚水幹線のマンホール蓋の基数 323 基	約0.9億円

Ⅲ 経営戦略2026

④ 雨水管・雨水調整池の修繕・改築

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。

● 解決する課題(再掲)

- 雨水管きょ等が老朽化により破損等すると、管きょ等に周囲の土砂が流れ込み、道路の陥没が発生します。また、水路敷が洗掘されると護岸倒壊が発生します。
- 整備時期が不明な雨水管きょ等が多く、老朽化の実態把握ができていません。

● 取組方針

- 雨水幹線の雨水管きょ等は、修繕改築計画に基づき、老朽化や劣化の著しい管きょ等を優先して、計画的に工事を実施します。
- 雨水調整池は、毎年点検を行い、しゅんせつ³⁶、修繕を進め機能確保を行います。

● 主な事業の内容

	第1期	第2期	第3期
点検・調査	令和4年度	—	令和16年度
実施設計	令和5年度	令和12年度	令和17年度
修繕改築工事	令和7年度 ～令和11年度	令和13年度 ～令和15年度	—



点検・調査の状況



管口の修繕の状況

● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 修繕改築を行った雨水幹線の延長 0.04km	➤ 修繕改築を行った雨水幹線の延長 0.39km	約3.2億円

³⁶ 下水道施設の底に溜まった土砂等を取り除く工事

⑤ 下水道終末処理場等の設備の改築・更新

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)
➤ 適切な「予防保全型中心の管理」が行われ、突発的な事故や故障の発生が抑制されているとともに、コストの縮減・平準化が図られています。
● 解決する課題(再掲)
➤ 七里ガ浜下水道終末処理場は、昭和 47 年(1972 年)の稼働開始から 50 年以上が経過し、平成 20 年(2008 年)前後に設備の改築更新は行っているものの、老朽化は著しい状況です。しかしながら、持続型下水道再整備事業が完成するまで当分の間は、稼働し続ける必要があります。 ➤ 山崎下水道終末処理場は、平成5年(1993 年)の稼働開始から 30 年以上が経過していますが、これまで、一度も更新していない設備も多く存在しており、老朽化が進んでいます。送風機や汚泥脱水機など基幹的な設備が故障すれば、安定的な下水処理に支障を来すおそれがあるだけでなく、突発的補修には予定外の多額の費用が発生します。
● 取組方針
➤ 七里ガ浜下水道終末処理場の設備は、後述の「持続型下水道再整備事業」の事業進捗を踏まえつつ、原則、現状維持に留め、施設の状況に応じて最低限必要な改築・更新を実施していきます。 ➤ 山崎下水道終末処理場の設備は、ストックマネジメント計画に従い、事業費の平準化に努めつつ改築・更新を実施していきます。 ➤ ポンプ排除式雨水調整池の設備は、ストックマネジメント計画に従い、山崎下水道終末処理場の改築・更新状況や耐用年数を踏まえ、事業費の平準化に努めつつ改築・更新を実施していきます。
● 主な事業の内容
【山崎下水道終末処理場の設備の改築・更新】 ➤ 老朽化が進む水処理設備、汚泥処理設備、中央監視設備等の主要設備 121 台について、ストックマネジメント計画に従って、令和 17 年度(2035 年度)の完成に向けて改築・更新を実施します。 ➤ 導入する設備の選定に当たっては、省エネルギー型の設備の検討を行います。 【七里ガ浜下水道終末処理場及び汚水中継ポンプ場の設備の改築・更新】 ➤ 七里ガ浜下水道終末処理場及び汚水中継ポンプ場の設備については、老朽化が進んでいますが、将来的に、後述する「持続型下水道再整備事業」において、汚水中継ポンプ場を廃止するとともに、鎌倉処理区と大船処理区を統合し、山崎下水道終末処理場に一元化するため、「持続型下水道再整備事業」の進捗を踏まえつつ、原則、現状維持に留め、施設の状況に応じて最低限必要な改築・更新を実施します。 ➤ 導入する設備の選定に当たっては、省エネルギー型の設備の検討を行います。

Ⅲ 経営戦略2026

【ポンプ排除式雨水調整池の設備の改築・更新】

- 下水道事業会計で管理しているポンプ排除式雨水調整池7施設のポンプ設備22台について、ストックマネジメント計画に従って、改築・更新を実施します。

山崎下水道終末処理場改築更新スケジュール(概要)

年度(令和)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
中央監視設備等	改築工事									
ポンプ・汚泥処理設備等	改築工事									
A系水処理・制御設備等			設計	改築工事						
B系水処理設備				設計		改築工事				
C系水処理設備						設計		改築工事		

七里ガ浜下水道終末処理場改築更新スケジュール(概要)

年度(令和)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
中央監視設備等			設計	改築工事						
汚泥処理設備等			設計	改築工事						
A系水処理設備					設計	改築工事				
B系水処理設備					設計	改築工事				
砂ろ過設備							設計	改築工事		

雨水調整池改築更新スケジュール(概要)

年度(令和)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
台調整池			設計	改築工事						
玉縄調整池			設計	改築工事						
笛田調整池			設計		改築工事					
岡本調整池			設計		改築工事					
腰越調整池				設計	改築工事					
城廻調整池				設計	改築工事					
ハイランド調整池				設計	改築工事					

● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 再構築した山崎下水道終末処理場の主要設備の台数 0台/121台 ➤ 改築・更新をした七里ガ浜下水道終末処理場の主要設備の台数 0台/36台 ➤ 再構築した雨水調整池のポンプの台数 0台/22台	➤ 再構築した山崎下水道終末処理場の主要設備の台数 121台/121台 ➤ 改築・更新をした七里ガ浜下水道終末処理場の主要設備の台数 36台/36台 ➤ 再構築した雨水調整池のポンプの台数 22台/22台	約352億円

Ⅲ 経営戦略2026

⑥ 重要な污水幹線の耐震化(マンホール浮上対策、マンホール継手の可とう化)

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 下水道施設の耐震化が進み、下水道施設の被害による社会的影響が最小限に抑制されています。

● 解決する課題(再掲)

- 地震に伴う地盤の液状化現象により、マンホールの浮上やマンホールと污水管きよとの接続部が破損し、汚水流下能力の低下や道路交通の障害が発生するおそれがあります。

● 取組方針

- 令和 7 年(2025 年)1 月に策定した鎌倉市上下水道耐震化計画に基づき、災害拠点等から下水道終末処理場に接続する污水マンホールについて、計画的に耐震化工事を実施します。

● 主な事業の内容

- 重要な污水幹線におけるマンホール(60 基)については、次のとおり実施設計及び耐震化工事を実施します。

実施設計	令和 10 年度
耐震化工事	令和 12 年度～令和 17 年度

耐震化のイメージ図

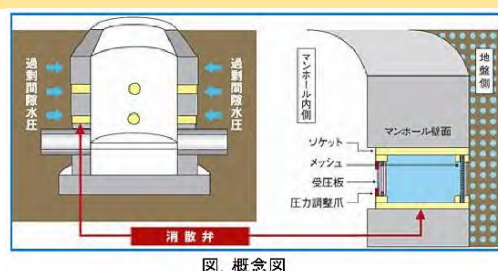


図. 概念図




写真. 消散弁

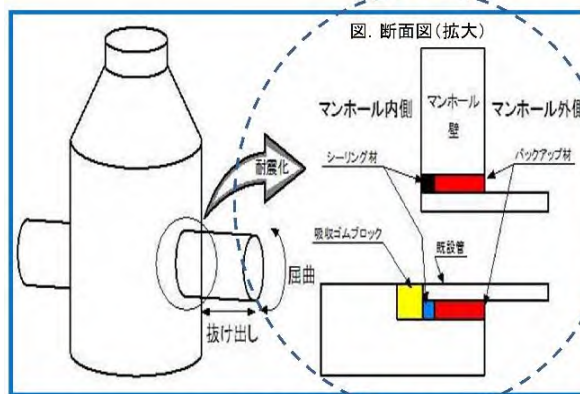


図. 概念図

● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➢ 耐震化工事を行った災害拠点等から 下水道終末処理場に接続するマンホールの基数 93 基	➢ 耐震化工事を行った災害拠点等から 下水道終末処理場に接続するマンホールの基数 153 基	約1.2億円

Ⅲ 経営戦略2026

⑦ 内水浸水の解消

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 浸水対策が進み、家屋浸水が解消されています。

● 解決する課題(再掲)

- 本市では、平成元年度(1989 年度)以降、12 回の浸水被害が報告されており、市内の既往最大降雨である1時間あたり 78.5mm の豪雨では、322 軒の家屋被害などが出ています。

● 取組方針

- 令和7年度(2025 年度)●月に策定した鎌倉市雨水管理総合計画に基づき、特に生命の危機に関わる床上浸水を解消します。

● 主な事業の内容

- 浸水リスクや都市機能等重要度が高いブロック(重点対策地区:3 ブロック、一般地区(高):5 ブロック)は、将来の気候変動を踏まえた計画降雨(59.7mm/h)とし、ブロック毎の特性を踏まえ、概ね 20cm 以上の浸水を解消するハード対策を行います。
- ハード対策としては「流す」「貯める」「浸透させる」の浸水対策を基に、既設管の改築、増補管の設置及び調整池の設置等、各ブロックの浸水状況を踏まえた浸水対策を実施します。



● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 対策に向けた実施設計に着手 した重点対策地区数 0地区	➤ 対策に向けた実施設計に着手 した重点対策地区数 2地区	約 10.9 億円

⑧ 七里ガ浜下水道終末処理場の耐震化

</

● 10か年の事業目標と投資額		
令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➢ 耐震化工事を行った管理棟の延床面積 0㎡ ➢ 耐震化工事を行った B 系水処理設備棟(一部)の延床面積 0㎡	➢ 耐震化工事を行った管理棟の延床面積 約 1,988 ㎡ ➢ 耐震化工事を行った B 系水処理設備棟(一部)の延床面積 約 4,012 ㎡	約15億円

Ⅲ 経営戦略2026

⑨ 山崎下水道終末処理場の耐震化

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 下水道施設の耐震化が進み、下水道施設の被害による社会的影響が最小限に抑制されています。

● 解決する課題(再掲)

- 下水道施設に求められる耐震性能目標「レベル2地震動」を確保する必要があります。
- 耐震化工事は、設備の改築・更新とともに進める必要があります。

● 取組方針

- 水処理、おでい汚泥処理及びおでい汚泥焼却設備等に関連する建物について、土木構造物の耐震性能目標「レベル2地震動」を満たす耐震化を実施します。
- 設備の改築・更新とともに進めるため、費用の平準化に努めます。

● 主な事業の内容

- 沈砂池ポンプ棟、おでい汚泥焼却設備棟、おでい汚泥処理設備棟、滅菌設備棟、制御設備棟、A 系水処理設備棟、B 系水処理設備棟、管理棟、管廊等について、順次、耐震化工事を実施します。
- 耐震化工事は設備の改築・更新と同時に実施する必要があるため、各設備棟を複数年度に分け、費用の平準化を図ります。

耐震化スケジュール(概要)と耐震化イメージ図

年度(令和)	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
沈砂池ポンプ棟・ 汚泥焼却設備棟等	改築工事									
A系水処理・制御設備棟等			設計	改築工事						
B系水処理設備棟等				設計		改築工事				
管廊等						設計		改築工事		



● 10か年の事業目標と投資額


令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額
➢ 耐震化工事を行った管理棟・沈砂池ポンプ棟等の延床面積 0㎡	➢ 耐震化工事を行った管理棟・沈砂池ポンプ棟等の延床面積 約 24,438 ㎡	約113億円

Ⅲ 経営戦略2026

⑩ 持続型下水道再整備事業

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)
➤ 七里ガ浜下水道終末処理場は、山崎下水道終末処理場に統合されることで、6箇所ある汚水中継ポンプ場は廃止され、津波に対する脆弱性が解消されています。
● 解決する課題(再掲)
➤ 鎌倉処理区において、七里ガ浜下水道終末処理場は耐震性能を確保できないこと、また、神奈川県が公表している「神奈川津波想定図」では、汚水中継ポンプ場6箇所のうち、5箇所が浸水すると想定されており、機能停止するおそれがあります。
➤ 地震や台風等の風水害により、七里ガ浜下水道終末処理場や汚水中継ポンプ場が停電した場合には、備え付けの非常用発電機により施設の運転は継続できます。しかしながら、津波により施設全体が水没して機能が失われると、約 31,000 世帯の汚水が長期にわたって処理できない状況に陥ります。
➤ 七里ガ浜下水道終末処理場や汚水中継ポンプ場の建物は古く、耐震化や津波浸水を防ぐことは困難な状況です。
● 取組方針
➤ 鎌倉処理区と大船処理区を統合し山崎下水道終末処理場に一元化します。
➤ 6箇所の汚水中継ポンプ場を廃止し自然流下により送水します。
● 主な事業の内容
➤ 地震・津波などの災害対策として施設機能の強化を図って行くとともに、事業開始後 50 年以上経過している施設の老朽化対策(改築・更新等)や、管理・運営の効率化を目指した処理区の統廃合を主体とした事業です。
➤ 早期の供用開始を目指し、整備区間を四つの工区に分割し、事業を実施します。
➤ 山崎下水道終末処理場を増設し、新たにポンプ場を設置します。
➤ 令和8年度(2026 年度)は、山崎下水道終末処理場や新ポンプ場の全体計画を変更します。
➤ 令和9年度(2027 年度)は、山崎下水道終末処理場と新ポンプ場の基本検討、一元化の事業計画変更を行います。
➤ 令和 17 年度(2035 年度)末時点で統合幹線の約40%、山崎下水道終末処理場 C 系水処理設備の整備完了を予定しています。
➤ 工事の実施においては、民間事業者の創意工夫による着実な事業実施を行うため、単独での PPP/PFI 事業ではなく、後述する「ウォーターPPP」での実施も視野に入れた検討を行います。

持続型下水道幹線工事イメージ図

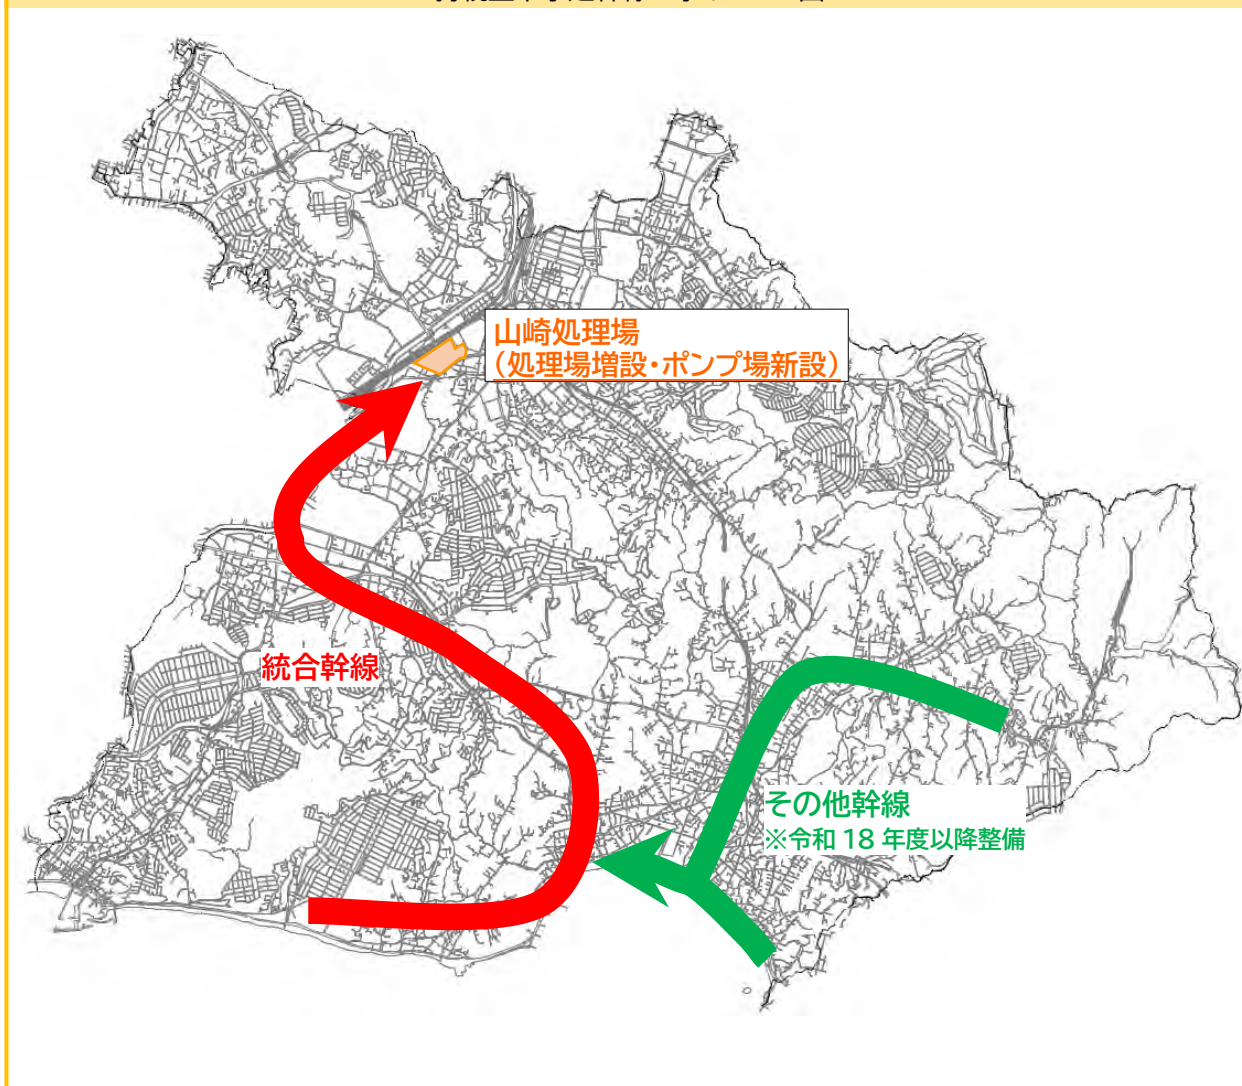

● 10か年の事業目標と投資額

令和7年度末の 数量等(見込)	令和17年度末の 目標の数量等	投資額(試算)
➤ 下水道終末処理場を一元化する幹線の工事完了割合 0% ➤ 山崎下水道終末処理場の C 系水処理設備の工事完了割合 0%	➤ 下水道終末処理場を一元化する幹線の工事完了割合 40% ➤ 山崎下水道終末処理場の C 系水処理設備の工事完了割合 100%	約 235 億円

※投資額(試算)は、全国の同様な工事の単価にシールド工事の日進量を加味した概算額

Ⅲ 経営戦略2026

(3)再構築期における財政改革

① 下水道使用料の改定

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

➤ 適切な料金設定により、安定的な下水道使用料収入が確保されています。

● 解決する課題(再掲)

➤ 経営の安定性を確保するためには、使用実態や今後の見通しを十分に踏まえつつ、受益者全体で下水道事業を支える使用料体系を設定する必要があります。

● 取組方針

➤ 定期的に、使用料改定の必要性を検討します。


➤ 経営の安定性を確保するため、使用料収入に占める基本使用料の割合を、漸進的に高めます。

● 主な事業の内容

➤ 計画期間(令和8年度(2026 年度)から令和 17 年度(2035 年度)まで)の平均値として、最低限、令和5年度(2023 年度)の資本費算入率 37.3%を維持することとし、将来的には、資本費算入率 50%、その後資本費算入率 60%を達成することを目標とします。

➤ 令和8年度(2026 年度)、令和 11 年度(2029 年度)、令和 16 年度(2034 年度)に、使用料改定を実施します。

使用料収入推計(億円(税抜き))

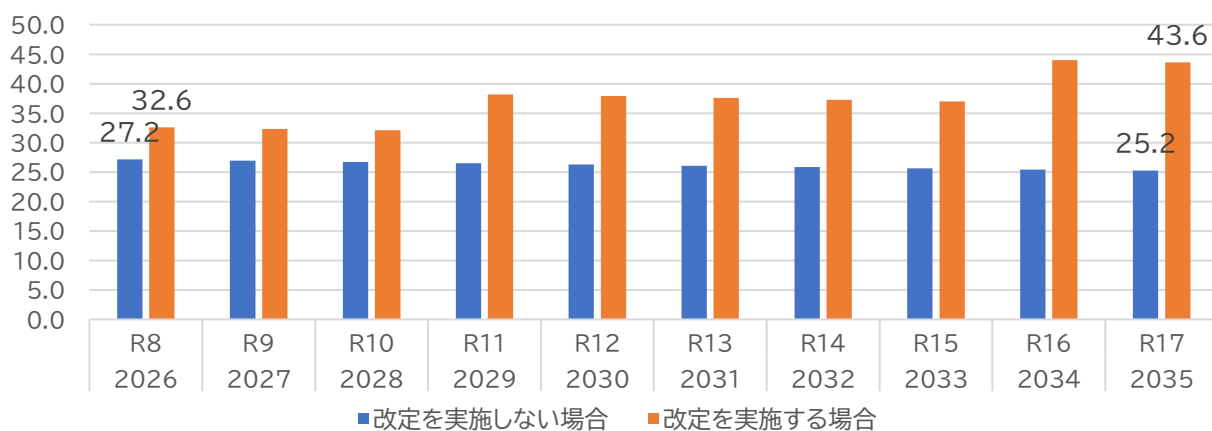

Ⅲ 経営戦略2026

(4)再構築期における官民連携

① 計画・執行体制の確保

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

➤ 下水道施設の再構築や官民連携等の計画を、迅速に作成・執行できる体制が確保されています。

● 取組方針

➤ 庁内に下水道に関する能力を有する技術職員を育成、確保します。


➤ 再構築期において、必要な職員の能力向上を図ります。

● 主な事業の内容

➤ 下水道部局の技術職員に加えて庁内の技術職員に対し、下水道に関する研修への参加を促し、庁内に下水道に関する能力を有する技術職員を育成、確保します。

➤ 中長期的な視点に立ち、次の世代の職員に技術や経験が継承されるよう、取組を行います。

➤ 適切な官民連携体制を構築するため、下水道事業職員の能力向上を図るとともに、官民連携による安全・安心な下水道事業が運営できるよう監理体制の検討を行います。



Ⅲ 経営戦略2026

② 包括的民間業務委託

- あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)
- 官民連携が進むことで担い手不足が解消し、安定した下水道施設の維持管理体制が確保されています。
- 取組方針
- 下水道管路施設(汚水・雨水)等の維持管理に係る一部の業務を一括し、複数年契約で委託することにより、計画的な維持管理によるライフサイクルコストの削減と、下水道管路施設等に係る良好な機能維持及び維持管理の効率化を実施します。
- 主な事業の内容
- 第1期下水道管路施設等包括的民間業務委託
期間 令和5年(2023年)3月1日から令和8年(2026年)2月28日まで
業務内容 計画策定等業務、点検・調査業務、施設情報の管理・台帳電子化業務、住民対応等業務
- 第2期下水道管路施設等包括的民間業務委託
期間 令和8年(2026年)3月1日から令和11年(2029年)2月28日まで
業務内容 計画策定等業務、点検・調査業務、電子台帳運用・保守業務、住民対応等業務

包括的民間業務委託 PR パンフレット

公共下水道の維持管理に関する 問い合わせ先が変わります！

令和 5 年
4 月 1 日
から！



鎌倉市と民間委託業者が協同して
鎌倉の下水道を
守っていきます！

鎌倉市民の皆様へ

鎌倉市では、令和5年4月から下水道管路の調査、清掃、修繕などの業務の一部を包括的に民間委託し、協同して下水道管路施設の維持管理を行ってまいります。

公共ますの破損や下水道管の詰まり、マンホール蓋のガタツキなどの異常等が確認された場合は、専用回線を設けましたので、下記に示す委託業者までご相談、お問合せください。

ご相談内容等は本市も共有し、更なる下水道施設維持管理に活用していきます。

市民の皆様の日常生活を守るため、ご協力の程よろしくお願いいたします。

お問い合わせ先

民間委託業者名
「管清工業株式会社」
☎ 0467-53-9028
(24時間365日受付)
〒248-0036
神奈川県鎌倉市手広 1-10-13

委託期間
令和8年(2026年)2月28日まで
※民間委託業者には鎌倉市が発行した身分証明書を携帯させ、作業時、立会い時に提示させます。

鎌倉市都市整備部下水道河川課
代表 ☎ 0467-33-3000

公共下水道の維持管理をこれまで以上に効率的で効果的に行っていくとともに、通報受付から緊急対応までを 24 時間 365 日ワンストップサービスで行うことで、

市民サービスの向上を目指します

ワンストップサービスとは「各サービスを1箇所にあるいは1回の手続きで受け取ることも出来ること」

お問い合わせの流れ

下水道施設に
異常が発生！

→ 通報

☎ 0467-53-9028

→ 対応

→ 報告

現場確認から
現場対応まで

民間委託業者
「管清工業株式会社」



公共下水道管理者
鎌倉市都市整備部
下水道河川課

「下水道施設の管理区分」


皆さんが管理する施設



雨水ます
汚水ます
汚水ます
汚水ます
汚水ます

市が管理する施設

公共下水道施設



マンホール
下水管路
(汚水本線)

お問い合わせが変わる範囲

お問い合わせ先
管清工業株式会社
☎ 0467-53-9028
〒248-0036 神奈川県鎌倉市手広 1-10-13


24時間
365日
受付

Ⅲ 経営戦略2026

③ ウォーターPPP³⁷の導入

- あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)
- 官民連携が進むことで担い手不足が解消し、安定した下水道施設の維持管理体制が確保されています。
- 取組方針
- 下水道職員数が減少する一方で、下水道施設で進行する老朽化や持続型下水道再整備事業等による業務量の増加へ対応します。
- 主な事業の内容
- 令和6年度(2024 年度)は、他分野、他地方公共団体との連携等、多様な PPP/PFI(官民連携)の案件形成に向けて、先進的な PPP/PFI 導入を検討するモデル都市に選定され、国土交通省の支援を受けて本市の課題整理、スキーム検討、効果分析等を実施しています。
- 令和7年度(2025 年度)は、事業実施の実現性を確認するための導入可能性調査を行い、事業スキームを決定します。
- 令和8年度(2026 年度)から令和 12年度(2030 年度)にかけ、入札・公募資料の準備、募集要項等の公表、民間事業者の選定、契約締結、業務の引継ぎを行い、令和 12 年度(2030 年度)末からウォーターPPP の導入を予定しています。

ウォーターPPP の概要

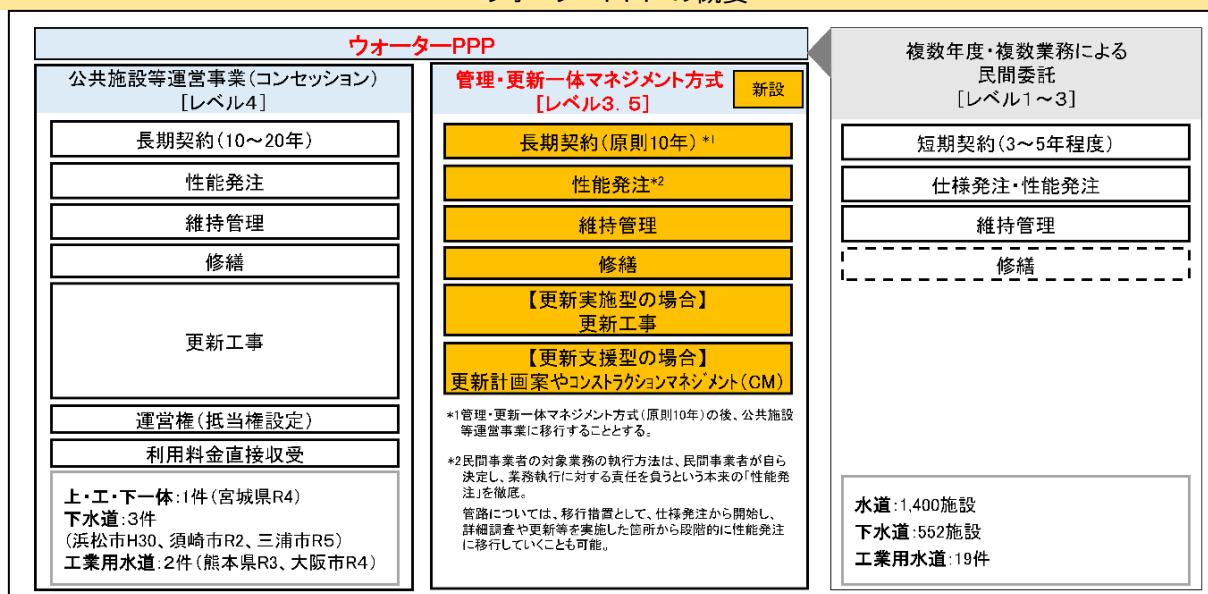

出典:内閣府ウェブサイト

https://www8.cao.go.jp/pfi/actionplan/pdf/water_gaiyou.pdf

³⁷ ウォーターPPP とは、職員不足、施設の老朽化、水道料金や下水道使用料収入の減少等、地方公共団体の抱える課題を解決し、上下水道分野の持続性を向上させるための手段です。社会全体で人手不足が進む中、従来、細分化され短期で委託されていた業務を、まとめて長期で委託するウォーターPPP により、官民双方の事務負担軽減、より効果的・効率的な事業運営、新たな付加価値の創出が実現され、下水道サービスが将来にわたり、安定的に提供されることを目指し導入するものです。令和9年度(2027 年度)からは、汚水管の改築に係る国費支援(緊急輸送道路等の下に埋設されている汚水管の耐震化を除く)について、ウォーターPPP 導入が決定済みであることが要件化されています。

④ 汚水処理事業の広域化・共同化

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 官民連携が進むことで担い手不足が解消し、安定した下水道施設の維持管理体制が確保されています。

● 取組方針

- 神奈川県が策定した「神奈川県汚水処理事業広域化・共同化計画」に基づき、県内の自治体とハード連携及びソフト連携の取組を進めます。



● 主な事業の内容

汚水処理共同化

- 単独公共下水道と相模川流域下水道の連携について、流域下水道への編入に必要なコストや編入による効果検証、編入先の施設の余力、処理場所在地の自治体や地元住民との合意形成などの諸課題を踏まえ、将来的な可能性の検討を行います。

汚泥処理共同化


- 県内処理場の^{おてい}汚泥処理の相互融通について、県内処理場(山崎浄化センター(鎌倉市)、辻堂浄化センター(藤沢市)、北部浄化センター(大和市)、仙石原上水センター(箱根町)、柳島水再生センター・四之宮水再生センター(相模川流域)、酒匂水再生センター・扇町水再生センター(酒匂川流域))で焼却処理している^{おてい}汚泥について、災害時や緊急時の相互融通の実施に向けた仕組みの構築を行います。
- 将来施設稼働率が低下する単独共同下水道の^{おてい}汚泥処理施設を廃止し、流域下水道の処理場で^{おてい}汚泥を共同処理することについて、共同処理を行う施設の余力、処理場所在地の自治体や地元住民との合意形成などの諸課題を踏まえ、将来的な可能性の検討を行います。

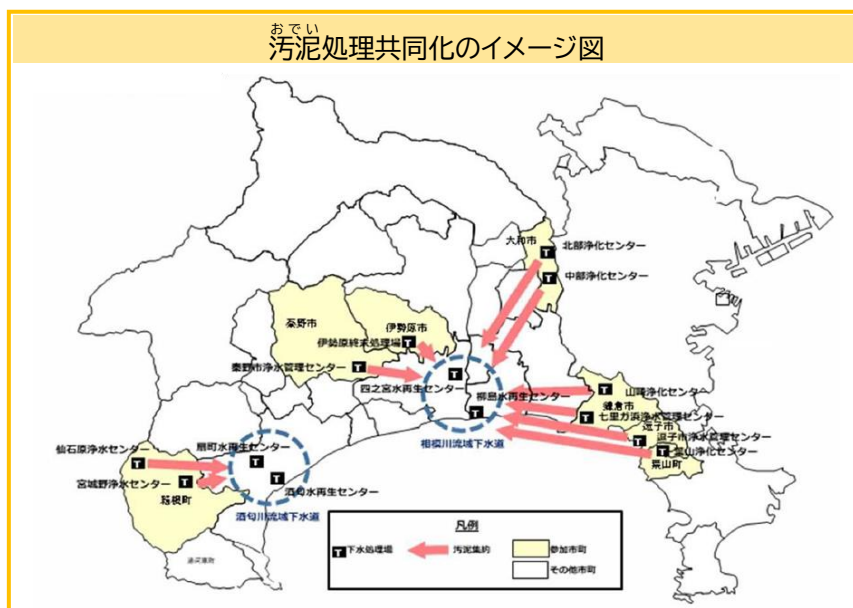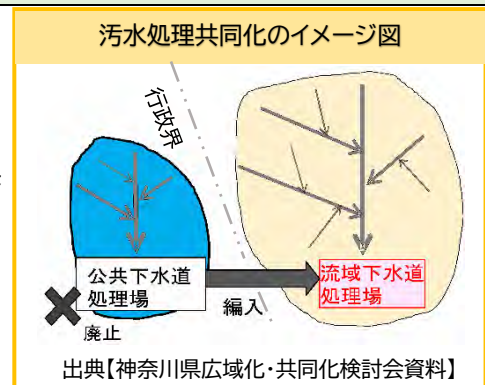

BCP 共同化

- 災害時における対応能力の向上を図るため、各自治体の「被災状況」や「支援要請の要否」、各構成員の「配備体制」の情報を（公社）日本下水道協会災害関連サイトに登録し、自治体間で「支援要請の要否」の判断を速やかに行う取組の検討を行います。

被災状況及び支援要請の情報共有のイメージ図

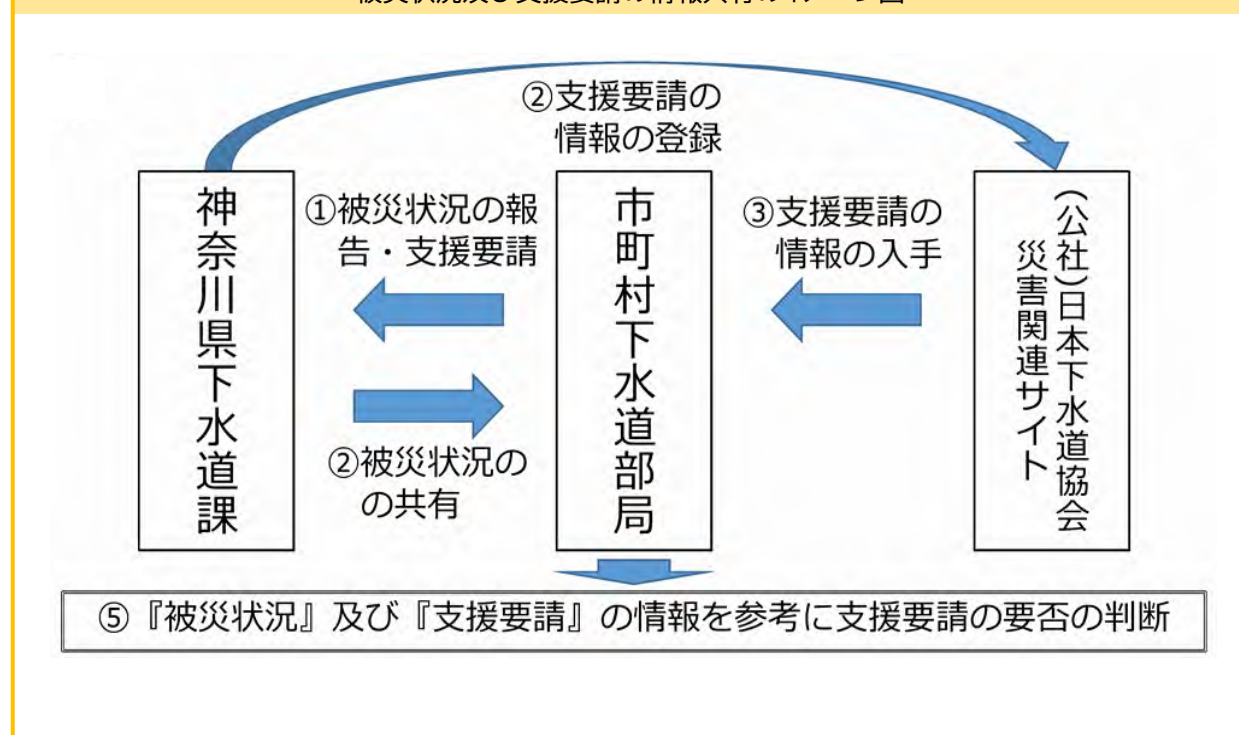

(5)新たなニーズへの対応(地球温暖化対策、デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進)

① 地球温暖化対策

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)

- 下水道事業においても省エネルギー化が進み、あわせて下水道が有する資源が利活用され、地球温暖化対策に貢献しています。

● 取組方針

- 下水道終末処理場の設備の更新に当たっては、省エネルギー型の設備の導入を進めます。
- 下水道資源の利活用により循環型社会の貢献に努めます。

● 主な事業の内容

省エネルギー型の設備の導入

- (3)老朽化・脆弱な下水道施設の早期改築更新・耐震化・統合>「⑤下水道終末処理場等の設備の改築・更新」で導入する設備において、省エネルギー型の設備を導入します。

下水道資源の有効活用

- 下水道汚泥・焼却灰のたい肥化については、下水汚泥の成分分析結果を蓄積しながら、農業部門へのサウンディング調査や先進事例の視察を行い、併せて、国・県や他の自治体の動向を注視しながら、広域的な実施の可能性など、幅広い視野を持ちながら引き続き検討を行っていきます。
- 下水道汚泥の炭化燃料化・下水汚泥ガス発電は、設置スペースの確保や費用対効果の面で困難な状況ですが、国・県や他の自治体の動向を注視しながら山崎下水道終末処理場の汚泥焼却設備の老朽化等による将来建て替え計画時等において優位性を確認し、導入を検討していきます。
- 下水道施設の高圧受電施設は、令和3年度(2021 年度)から再生可能エネルギー100%由来の電力を購入しています。また、山崎下水道終末処理場の電力の一部を賄うため、屋上へ太陽光パネルを設置して発電することを検討しており、今後は費用対効果の有無や、並行して行う設備改築・耐震化工事への影響の有無等を確認し、導入実現に向けて更に検討を進めます。




(出典:公営社団法人日本下水道協会発行「省・創・再エネルギー利用パンフレット(令和7年6月6日公開)」)

Ⅲ 経営戦略2026

② デジタルトランスフォーメーション(DX)の推進

● あるべき姿(長期目標 30 年後)(再掲)
➤ 下水道施設はデジタル技術を活用し、メンテナンスが高度化・効率化しています。
● 取組方針
➤ 下水道事業が抱える課題(職員数減少等による執行体制の脆弱化(ヒト)、老朽化施設の加速度的な増加(モノ)、施設更新費用の増大、人口減少等に伴う使用料収入の減少など厳しい財政状況(カネ)など)を解決するため、DX を推進します。
● 主な事業の内容
➤ 下水道終末処理場はクラウドや3D映像等を活用した施設の電子台帳化を検討します。 ➤ 管路施設の調査は、人が管路施設内に入り、直接目視で状態を確認する調査が多いですが、安全かつ容易な調査の実現のため、ドローンによる管路施設内部の調査等、新たな ICT 技術の導入を検討します。



コラム⑨持続型下水道再整備事業

1 持続型下水道再整備事業の概要


国や地方の厳しい財政状況や、人口減少・少子高齢化の進展により、下水道を取り巻く環境は非常に厳しくなっています。こうした課題を解決しつつ、安全・安心なまちづくりを支えるインフラとして持続可能な下水道を整備し、都市の発展に貢献することが求められています。


鎌倉処理区では、汚水管きょが比較的浅く埋設されているため、地震などの災害に対する耐震性が十分ではありません。また、海沿いに中継ポンプ場が設置されていることから、津波や浸水時の機能停止リスクがあります。さらに、小高い山地が連担し、中小規模の河川や水路が多数存在する複雑な地形のため、汚水管きょの伏越し施設が60箇所も設置されており、管理や維持が困難であることも問題となっています。

これらの課題解決のため、老朽化している幹線を耐震性能の高い自然流下管に再整備し、併せて伏越し施設の解消を進めます。また、六つの中継ポンプ場を段階的に廃止し、処理区の一元化を図る計画です。これにより、老朽化対策、地震・津波対策、維持管理費の削減を同時に強化します。

これらの対策を総称して、持続型下水道再整備事業といいます。

2 持続型下水道再整備事業のイメージ

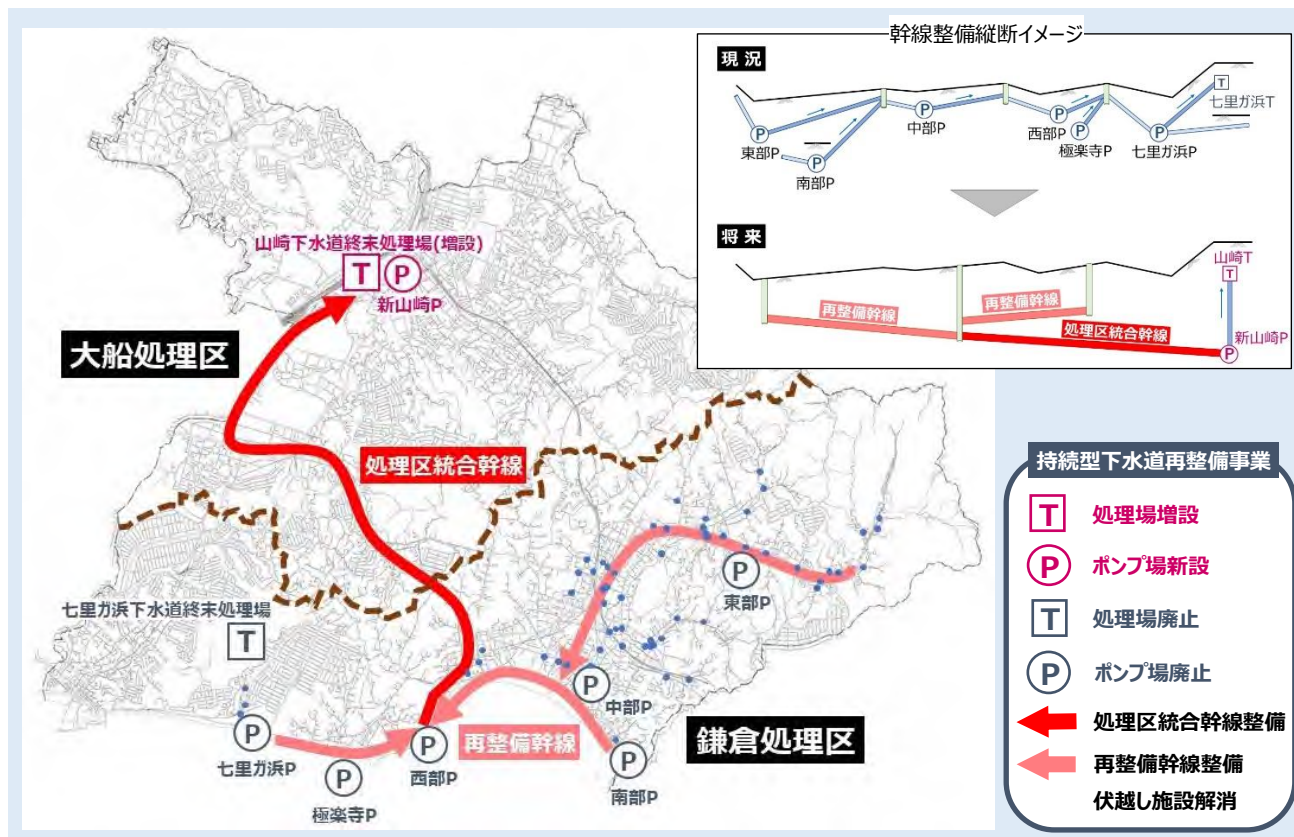




コラム⑩ウォーターPPP

1 ウォーターPPP の概要

ウォーターPPP は、水分野の公共インフラの管理・更新・運営を、長期契約で民間事業者に委ねる官民連携方式です。委託の範囲や期間等の条件によって、レベル 3.5(更新支援型)、レベル 3.5(更新実施型)、レベル 4.0(公共施設等運営事業)に分類されます。

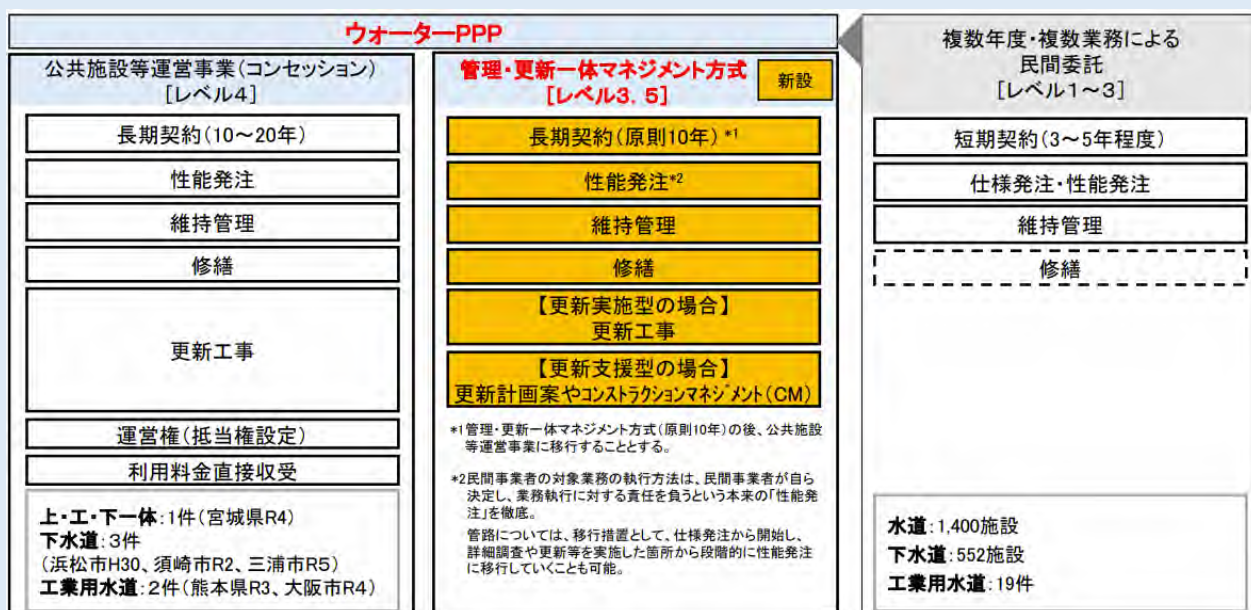

出所: 国土交通省「ウォーターPPP について」

2 ウォーターPPP の 4 要件

上下水道事業の持続可能性を高めるため、ウォーターPPP には「長期契約」「性能発注」「維持管理と更新の一体マネジメント」「プロフィットシェア」の四つの要件を含むことが原則とされます。

長期契約	性能発注	維持管理と更新の一体マネジメント	プロフィットシェア
- 原則、契約期間を 10 年とする - 企業の参画意欲、地方公共団体の取組易さ、スケールメリット、投資効果の発現、雇用の安定、人材育成のため	- 原則、性能発注とする - 管路については、移行措置として、仕様発注から開始し、詳細調査や更新等を実施した箇所から段階的に性能発注に移行していくことも可能である	- 維持管理と更新を一体的に最適化するための方式として、以下の 2 型とする 更新実施型：維持管理と更新を一体的に実施する 更新支援型：更新計画案の策定やコンストラクションマネジメント(CM)により、地方公共団体の更新を支援する	プロフィットシェアの仕組みを導入する - 更新支援型の場合、プロフィットシェアは可能な範囲で採用する - 事業開始後もライフサイクルコスト削減の提案を促進するため

3 本市の下水道事業の課題

本市の下水道事業においては、担い手の不足「ヒト」や施設の老朽化「モノ」、人口減少等による下水道使用料の収入の減少「カネ」といった「ヒト」「モノ」「カネ」の課題があります。

		課題
ヒト 		① 下水道職員が減少する一方で、建設投資増加や限定的な委託範囲による、業務負担の増加
		② 処理場における故障・停電時の運転対応や指示、管路における維持管理事務や工事発注事務に対する、人員不足
		③ 業務量が多い、契約業務の非効率性
		④ 同時期の定年退職者発生による、技術継承の懸念
モノ 	共通	⑤ 耐震化・ストックマネジメント計画に基づく改築や更新により増加する、事業量への対応
	処理場	⑥ 仕様書発注の維持管理契約で実施している点検・調査、運転方法の非効率性
		⑦ 設備を中心に進む老朽化への対応
	管路	⑧ 将来的な老朽化施設の増加に対する、計画的な点検・調査、修繕改築の実施
カネ 		⑨ 仕様発注である管路包括における、民間の創意工夫発揮の困難さ
		⑩ 老朽化に伴う、維持管理費及び建設改良費の増加
		⑪ 支出の平準化や企業債の計画的な借入の難易度上昇
		⑫ 有収水量減少による、使用料収入の減少

4 本市へのウォーターPPPの導入効果

ウォーターPPPを導入することにより、下水道事業の課題である職員数の減少や施設の老朽化、民間委託範囲の拡大・複数年契約・一括発注等の導入効果が期待されます。

		課題	導入効果
ヒト 		下水道職員数が減少する一方で投資額の増加により業務負担増への対応(①)	民間委託範囲の拡大・複数年契約・一括発注による契約事務の効率化
		業務量が多い特定の業務の削減・効率化(③)	
		適切な技術継承(④)	業務のマニュアル化・適切なモニタリングと継続的改善による人材育成、官民一体の事業体制
モノ 	共通	耐震化、ストックマネジメント計画に基づく改築・更新により増加する事業量への対応(⑤)	民間委託範囲の拡大
	処理場	仕様書発注の維持管理契約で実施している点検・調査、運転方法の効率化(⑥)	性能発注により民間事業者の創意工夫を促すことによる業務の効率化
		設備を中心に進む老朽化への対応(⑦)	計画策定～修繕・改築の一体発注
	管路	将来的な老朽化施設の増加に対する計画的な点検・調査・修繕改築の実施(⑧)	管路調査・整備に関する優先順位の策定・計画的な点検・調査及び修繕改築工事の実施
カネ 		老朽化に伴い維持管理費、建設改良費が増加することへの対応(⑩)	一括発注による削減、点検・調査結果に基づく修繕・改築で財政支出の平準化、性能発注で民間事業者の創意工夫を促すことによる業務の効率化

※(○)は本市の下水道事業の課題の番号と対応


5 投資・財政計画(収支計画)

投資・財政計画(収支計画)の試算にあたっては、「3 経営の基本方針」に基づき、30年後の鎌倉市の下水道事業のあるべき姿(長期目標)を想定し、鎌倉市社会基盤施設マネジメント計画において30年間の試算を行い、経営戦略2026において10年間の試算を次のとおり行いました。

(1)投資計画

主に「4 主な取組」に記載した事業を基に試算を行いました。

試算に当たっては、国土交通省が公表する建設工事費デフレーターを基に、物価上昇率を見込みました。令和8年度(2026年度)から令和17年度(2035年度)までの建設改良費の推移は以下のとおりです。

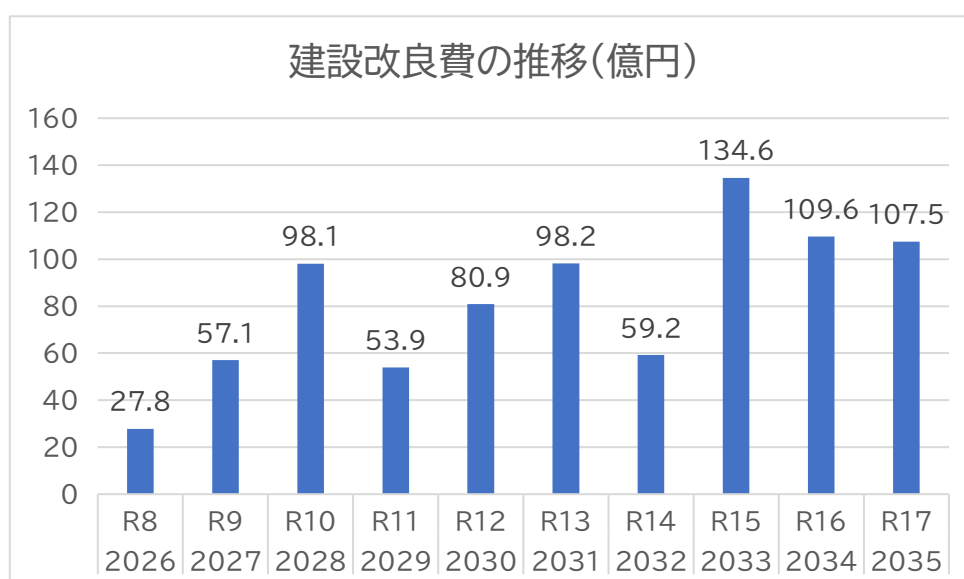

(2)投資以外の経費

投資以外の主な経費の推計方法は以下のとおりです。なお、物価上昇率は、建設工事費デフレーターを使用しています。

項目	推計方法
職員給与費	過年度の予算額×定期昇給率 1.01%/年
動力費	過年度の実績×物価上昇率 2.9%/年
薬品費	過年度の実績×物価上昇率 2.9%/年
修繕費	管きよ等:過年度の修繕実績を基に算出 処理場ポンプ場:過年度の実績×物価上昇率 2.9%/年
材料費	過年度の実績×物価上昇率 2.9%/年
委託費	管きよ等:個別業務の見積額×物価上昇率 処理場ポンプ場:過年度の実績×物価上昇率 2.9%/年

Ⅲ 経営戦略2026

(3)財源計画

① 下水道使用料

経営戦略 2021 では、令和3年度(2021 年度)から令和 12 年度(2030 年度)までの 10 年間で3回(令和5年度(2023 年度)、令和8年度(2026 年度)、令和 11 年度(2029 年度))の改定を行うこととしています。また、改定目標については、令和 8 年度(2026 年度)に資本費算入率 50%、令和 11 年度(2029 年度)に資本費算入率 60%としています。

経営戦略 2026 では、使用料算定期間は一般的には3年から5年程度に設定することが適当とされていることから、令和 11 年度(2029 年度)以降の改定を5年後の令和 16 年度(2034 年度)に見込み、令和 11 年度(2029 年度)の改定目標である資本費算入率 60%を維持することを目標としました。

以上の改定時期及び改定目標を前提として、過去の実績や処理区域内人口及び有収水量の予測を基に下水道使用料を試算したところ、大幅な改定を行わなければ目標を達成することが困難であることが判明しました。これは、近年の急激な物価高騰等が下水道の維持管理にも大きく影響したものです。

このため、使用者への影響に考慮し、追加の試算を行いました。仮試算その2では、それぞれの資本費算入率を 10%軽減し試算しましたが、なお使用者への負担感が過度になると考えられたため、経営戦略 2026 においては仮試算その3を採用し、令和8年度(2026 年度)から令和 17 年度(2035 年度)までの期間において、最低限、令和5年度(2023 年度)決算における資本費算入率 37.3%を維持することを目標として、改定を行うこととしました。

なお、下水道使用料の改定にあたっては、社会経済情勢等を踏まえた改定内容とするため、改めて鎌倉市下水道事業運営審議会に諮問し、答申を得るものとします。

	仮試算その1 (経営戦略 2021 に 基づく試算)	仮試算その2	仮試算その3
改定時期	令和8年度、令和 11 年度、令和 16 年度		
改定目標	各算定期間において、以下の資本費算入率を達成するよう、改定を行う。 <u>令和 8～10 年度:50%</u> <u>令和 11～15 年度:60%</u> <u>令和 16～17 年度:60%</u>	各算定期間において、以下の資本費算入率を達成するよう、改定を行う。 <u>令和 8～10 年度:40%</u> <u>令和 11～15 年度:50%</u> <u>令和 16～17 年度:50%</u>	令和8年度から令和 17 年度までの期間において、令和5年度決算における <u>資本費算入率 37.3%を維持</u> するよう、改定を行う。
改定率 (使用料収入の 増加見込み割合)	令和 8 年度:30.7% 令和 11 年度:24.1% 令和 16 年度:22.4%	令和 8 年度:25.0% 令和 11 年度:23.0% 令和 16 年度:20.9%	令和 8 年度:20.0% 令和 11 年度:20.1% 令和 16 年度:20.0%

Ⅲ 経営戦略2026


改定時期	経営戦略 2021	経営戦略 2026	
	本来目標	目標(実績)	改定率
令和5年度 (2023年度)	使用料単価 150 円/㎥	令和5年度(2023年度):152.9 円/㎥ 令和6年度(2024年度):155.8 円/㎥	16.6%
令和8年度 (2026年度)	資本費算入率 50%	令和8年度(2026年度)から令和17年度(2035年度)までの期間において、令和5年度決算における資本費算入率37.3%を維持する	約 20%
令和11年度 (2029年度)	資本費算入率 60%		約 20%
令和16年度 (2034年度)	—		約 20%

※社会情勢の変化により変更の可能性あり

② 企業債

建設改良により整備更新する下水道施設は、将来にわたり使用できることから、企業債を活用し世代間の負担の公平を図っています。建設改良に伴う企業債は、管きょ等及び建築物で償還期限30年、電気機械設備で償還期限20年として、起債するものとし推計しました。

「(1)投資計画」で示した建設改良費の推移のとおり、今後、建設改良費が増大していきます。これに伴い、企業債の借入額も増大し、企業債残高は以下のとおりとなります。

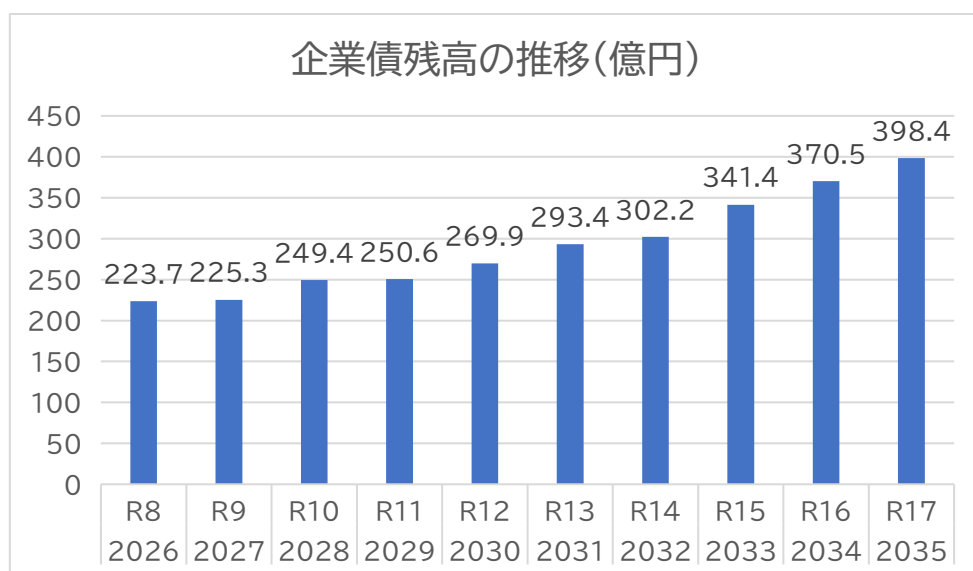

Ⅲ 経営戦略2026

③ 一般会計繰入金

令和8年度(2026年度)から令和12年度(2030年度)までの一般会計繰入金は、経営戦略2021の投資・財政計画に計上した金額を繰り入れることとして推計しました。

令和13年度(2031年度)から令和17年度(2035年度)までの一般会計繰入金は、経営戦略2026の投資・財政計画で推計した支出に対して、総務省が示す繰出基準に基づき、雨水処理に要する経費などを繰り入れることとし、繰出基準外の一般会計繰入金は計上せず、推計しました。

なお、今後、社会経済情勢の変化や法改正、その他やむを得ない事情等により、繰出基準にある経費(雨水処理に関する経費など)について、事業費の変動や事業工程の変更が生じる場合があります。その際には、原則、繰出基準に基づく一般会計繰入金は、一般会計で負担するものとした上で、適宜、財政部局と協議し適切に対応します。

なお、各年度における繰出基準内・外の一般会計繰入金は以下のとおりです。

【単位:億円】

	R8 2026	R9 2027	R10 2028	R11 2029	R12 2030	R13 2031	R14 2032	R15 2033	R16 2034	R17 2035
基準内	21.0	14.9	18.7	13.6	18.0	19.5	24.8	27.6	26.2	24.8
基準外	7.8	14.6	11.5	16.5	12.1	0	0	0	0	0
合計	28.8	29.5	30.2	30.1	30.1	19.5	24.8	27.6	26.2	24.8

④ 資産の有効活用等による収入増加等

地球温暖化対策として、下水道終末処理場において省エネルギー型の設備の導入や下水道資源の有効活用^{おでい}の取組を進めることにより、動力費・委託料などこれまで下水道汚泥等の処理に要していた費用を縮減することや、新たな収入の確保につながることが期待できます。

Ⅲ 経営戦略2026

(4)投資・財政計画(概要版)

○収益的収支試算

年度			令和6年度 (2024年度) (決算)	令和7年度 (2025年度) (決算見込)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
区分						
収益的 収支	収益的 収入	1. 営 業 収 益	31.8	32.0	32.6	36.2
		(1) 料 金 収 入	27.6	27.4	29.1	32.3
		(2) そ の 他	4.2	4.6	3.4	3.8
		2. 営 業 外 収 益	39.1	39.3	43.1	36.2
		(1) 補 助 金	12.3	15.9	16.3	10.8
		(2) そ の 他	26.8	23.4	26.8	25.4
		収 入 計	70.9	71.3	75.7	72.3
	収益的 支出	1. 営 業 費 用	61.2	64.7	65.1	65.6
		(1) 職 員 給 与 費	2.3	2.5	2.5	2.6
		(2) 経 費	22.3	26.4	26.6	29.3
		(3) 減 価 償 却 費	36.6	35.9	36.0	33.7
		2. 営 業 外 費 用	3.4	3.2	3.0	2.5
		支 出 計	64.6	67.9	68.0	68.1
	経 常 損 益		6.3	3.4	7.7	4.3
当 年 度 純 利 益			6.3	3.4	7.7	4.3
繰 越 利 益 剰 余 金			3.7	10.0	13	18.7

○資本的収支試算

年度			令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
資本的 収支	資本的 収入	1. 企 業 債	6.5	5.8	15.4	26.6
		2. 他 会 計 補 助 金	16.0	13.1	9.5	16.4
		3. 国(都道府県)補助金	0.6	1.7	12.1	28.5
		計	23.0	20.5	37.1	71.6
	資本的 支出	1. 建 設 改 良 費	3.5	8.5	27.8	57.1
		うち職員給与費	0.9	0.8	0.9	1.0
		2. 企 業 債 償 還 金	28.3	27.6	26.8	25.0
		計	31.7	36.2	54.7	82.1
資本的収入額が資本的支出額に不足する額			10.1	15.7	17.6	10.6
補 填 財 源 (損 益 勘 定 留 保 資 金 等)			9.8	15.7	17.6	10.6
補 填 財 源 不 足 額			0	0	0	0
企 業 債 残 高			255.0	235.1	223.7	225.3

○他会計繰入金収支試算

年度		令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
他会計 繰入金	収益的収支分	15.6	19.8	19.3	13.1
	資本的収支分	16.0	13.1	9.5	16.4
	合計	31.6	32.9	28.8	29.5

※令和12年度(2030年度)までの他会計繰入金は、令和3年(2021年)3月に策定した鎌倉市鎌倉市公共下水道経
 ※令和12年度までの他会計繰入金には基準外繰入分を含みます。今後の社会経済情勢によっては、繰入金の額
 ※収益的収入及び資本的収入については令和7年(2025年)12月の推計値を基に、また、国の補助金等については
 ※各項目の金額は、単位未満を四捨五入しているため、内訳の計と合計が一致しない場合があります。なお、比率

Ⅲ 経営戦略2026

(単位:億円)

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
35.7	42.0	41.2	41.5	41.6	41.2	48.2	47.9
32.1	38.2	37.9	37.6	37.3	37.0	44.0	43.6
3.7	3.8	3.3	3.9	4.4	4.2	4.2	4.3
43.4	38.2	41.7	40.6	50.3	54.0	55.1	55.4
14.3	7.8	11.3	12.6	18.7	21.9	20.5	19.4
29.1	30.4	30.4	28.0	31.5	32.0	34.7	35.9
79.1	80.3	83.0	82.1	91.9	95.1	103.4	103.3
70.8	68.4	70.6	71.3	76.9	77.9	81.0	83.2
2.6	2.6	2.6	2.7	2.7	2.7	2.7	2.8
30.4	28.2	31.0	29.1	29.3	29.8	30.5	32.2
37.8	37.7	36.9	39.6	44.9	45.4	47.8	48.3
2.8	3.6	3.7	4.9	6.0	6.7	8.7	10.4
73.6	72.1	74.3	76.2	82.9	84.7	89.6	93.7
5.6	8.2	8.7	5.9	9.0	10.4	13.7	9.6
5.6	8.2	8.7	5.9	9.0	10.4	13.7	9.6
20.7	22.4	26.6	31.5	23.7	27.1	27.6	32.3

(単位:億円)

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
47.2	23.1	39.0	42.2	28.0	57.4	47.4	46.6
13.5	18.8	15.9	3.3	1.8	1.6	1.6	1.5
48.0	22.8	35.3	46.3	29.6	70.6	56.7	55.9
108.6	64.7	90.2	91.7	59.4	129.7	105.8	104.0
98.1	53.9	80.9	98.2	59.2	134.6	109.6	107.5
1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0
23.1	22.0	19.6	18.8	19.2	18.3	18.3	18.8
121.3	75.9	100.5	117.0	78.4	153.0	127.9	126.3
12.7	11.2	10.3	25.3	18.9	23.3	22.1	22.3
12.7	11.2	10.3	25.3	18.9	23.3	22.1	22.3
0	0	0	0	0	0	0	0
249.4	250.6	269.9	293.4	302.2	341.4	370.5	398.4

(単位:億円)

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
16.8	11.3	14.3	16.2	23.0	26.0	24.6	23.3
13.5	18.8	15.9	3.3	1.8	1.6	1.6	1.5
30.2	30.1	30.1	19.5	24.8	27.6	26.2	24.8

営戦略における投資財政計画の数値を基にした金額です。
に変動が生じることがあります。

、満額が配当されると仮定し、試算しています。

は、小数点以下第2位で四捨五入しました。

Ⅲ 経営戦略2026

(5)投資・財政計画(詳細版) 収益的収支

区 分			年 度	令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
			(決算)	(決算見込)			
収 益 的 収 入	収 益 的 収 入	1. 営 業 収 益 (A)	3,183,127	3,200,974	3,257,348	3,616,575	
		(1) 料 金 収 入	2,764,714	2,740,886	2,913,829	3,232,835	
		(2) 受 託 工 事 収 益 (B)					
		(3) そ の 他	9,482(408,931)	9,516(450,572)	9,581(333,938)	10,264(373,476)	
		2. 営 業 外 収 益	3,906,201	3,932,317	4,313,623	3,616,277	
		(1) 補 助 金	1,230,458	1,591,398	1,631,441	1,075,194	
		他 会 計 補 助 金	1,151,658	1,534,030	1,593,443	934,692	
		そ の 他 補 助 金	78,800	57,368	37,998	140,502	
		(2) 長 期 前 受 金 戻 入	2,673,734	2,337,214	2,678,511	2,540,706	
		(3) そ の 他	2,009	3,705	3,671	377	
		収 入 計 (C)	7,089,328	7,133,291	7,570,971	7,232,852	
		1. 営 業 費 用	6,122,345	6,473,328	6,506,437	6,555,724	
		(1) 職 員 給 与 費	228,460	246,364	253,129	255,487	
		基 本 給	104,841	103,353	109,027	110,117	
		退 職 給 付 費					
収 益 的 支 出	収 益 的 支 出	そ の 他	123,619	143,011	144,102	145,370	
		(2) 経 費	2,233,022	2,640,346	2,657,356	2,931,055	
		動 力 費	370,471	463,821	473,760	671,054	
		修 繕 費	479,917	533,449	561,956	518,218	
		材 料 費	6,111	8,966	7,466	7,884	
		そ の 他	1,376,523	1,634,047	1,614,174	1,733,899	
		(3) 減 価 償 却 費	3,660,863	3,586,618	3,595,952	3,369,182	
		2. 営 業 外 費 用	339,525	318,629	296,245	250,768	
		(1) 支払利息	19,719	21,393	21,119	20,751	
		雨水分					
		汚水分	294,903	272,507	250,300	226,210	
		(2) そ の 他	24,903	24,729	24,826	3,807	
		支 出 計 (D)	6,461,870	6,791,957	6,802,682	6,806,492	
		経 常 損 益 (C)-(D) (E)	627,458	341,334	768,289	426,360	
		特 別 利 益 (F)	105				
特 別 損 失 (G)							
特 別 損 益 (F)-(G) (H)							
当 年 度 純 利 益 (又 は 純 損 失) (E)+(H)			627,563	341,334	768,289	426,360	
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金 (I)			372,761	1,000,324	1,341,658	1,871,854	
流 動 資 産 (J)							
うち 未 収 金							
流 動 負 債 (K)							
うち 建 設 改 良 費 分							
うち 一 時 借 入 金							
うち 未 払 金							
累 積 欠 損 金 比 率 ($\frac{(I)}{(A)-(B)} \times 100$)			11.71	31.25	41.19	51.76	
地方財政法施行令第15条第1項により算定した 資 金 の 不 足 額 (L)							
営業収益－受託工事収益 (A)-(B) (M)			3,183,127	3,200,974	3,257,348	3,616,575	
地方財政法による 資 金 不 足 の 比 率 ((L)/(M)×100)							
健全化法施行令第16条により算定した 資 金 の 不 足 額 (N)							
健全化法施行規則第6条に規定する 解 消 可 能 資 金 不 足 額 (O)							
健全化法施行令第17条により算定した 事 業 の 規 模 (P)							
健全化法第22条により算定した 資 金 不 足 比 率 ((N)/(P)×100)							

※ () 内の金額は雨水処理負担金。

Ⅲ 経営戦略2026

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2034年度)
3,574,532	4,200,328	4,124,611	4,154,040	4,163,058	4,116,155	4,824,036	4,793,974
3,207,384	3,820,973	3,790,208	3,759,073	3,727,959	3,696,887	4,399,100	4,361,996
10,504(356,644)	10,523(368,832)	10,538(323,865)	10,583(384,384)	10,453(424,646)	10,693(408,575)	10,523(414,413)	10,538(421,440)
4,340,364	3,824,832	4,173,671	4,060,697	5,026,008	5,396,296	5,511,313	5,536,458
1,434,124	782,839	1,131,678	1,257,365	1,873,610	2,191,926	2,045,877	1,944,371
1,321,124	760,839	1,102,678	1,236,365	1,873,610	2,187,526	2,045,877	1,910,871
113,000	22,000	29,000	21,000		4,400		33,500
2,905,863	3,041,616	3,041,616	2,802,955	3,152,021	3,203,993	3,465,059	3,591,710
377	377	377	377	377	377	377	377
7,914,896	8,025,160	8,298,282	8,214,737	9,189,066	9,512,451	10,335,349	10,330,432
7,080,617	6,844,452	7,059,959	7,134,408	7,688,922	7,793,701	8,096,666	8,321,525
258,148	260,838	263,557	266,305	269,082	271,888	274,724	277,591
111,218	112,330	113,453	114,588	115,734	116,891	118,060	119,241
146,930	148,508	150,104	151,717	153,348	154,997	156,664	158,350
3,040,920	2,815,287	3,104,129	2,905,901	2,929,124	2,982,224	3,045,706	3,215,187
690,514	710,539	731,146	752,348	774,165	796,616	819,718	843,491
531,662	545,602	484,296	496,863	509,685	522,986	536,567	550,648
8,056	8,233	8,411	8,597	8,783	8,977	9,172	9,373
1,810,688	1,550,913	1,880,276	1,648,093	1,636,491	1,653,645	1,680,249	1,811,675
3,781,549	3,768,327	3,692,273	3,962,202	4,490,716	4,539,589	4,776,236	4,828,747
277,960	364,887	366,473	488,360	602,568	674,853	867,799	1,044,782
21,256	23,644	32,397	51,045	67,413	75,881	81,593	87,216
252,798	339,033	333,760	436,986	534,808	598,213	785,837	954,082
3,906	2,210	316	329	347	759	369	3,484
7,358,577	7,209,339	7,426,432	7,622,768	8,291,490	8,468,554	8,964,465	9,366,307
556,319	815,821	871,850	591,969	897,576	1,043,897	1,370,884	964,125
556,319	815,821	871,850	591,969	897,576	1,043,897	1,370,884	964,125
2,069,439	2,236,136	2,661,330	3,152,030	2,370,828	2,713,622	2,764,551	3,233,995
57.89	53.24	64.52	75.88	56.95	65.93	57.31	67.46
3,574,532	4,200,328	4,124,611	4,154,040	4,163,058	4,116,155	4,824,036	4,793,974

Ⅲ 経営戦略2026

(6)投資・財政計画(詳細版) 資本的収支

年 度		令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
区 分		(決算)	(決算見込)		
資本的 収 入	1. 企 業 債	650,300	577,200	1,539,700	2,659,572
	うち 資本 費 平 準 化 債	111,500	9,700		
	2. 他 会 計 出 資 金				
	3. 他 会 計 補 助 金	1,595,031	1,305,692	953,282	1,644,846
	4. 他 会 計 負 担 金				
	5. 他 会 計 借 入 金				
	6. 国 (都 道 府 県) 補 助 金	53,200	164,000	1,206,500	2,844,000
	7. 固 定 資 産 売 却 代 金				
	8. 工 事 負 担 金	3,215	2,306	7,129	3,070
	9. そ の 他	1,583	1,698	751	4,174
	計 (A)	2,303,329	2,050,896	3,707,362	7,155,662
	(A)のうち翌年度へ繰り越さ れる支出の財源充当額 (B)	△ 139,100			
	純 計 (A)-(B) (C)	2,164,229	2,050,896	3,707,362	7,155,662
	1. 建 設 改 良 費	345,838	848,240	2,779,412	5,710,170
	うち 職 員 給 与 費	88,863	83,638	94,846	95,948
	2. 企 業 債 償 還 金	2,825,558	2,764,910	2,682,730	2,498,740
	3. 他 会 計 長 期 借 入 返 還 金				
	4. 他 会 計 へ の 支 出 金				
	5. そ の 他		7,293	4,077	4,003
	計 (D)	3,171,396	3,620,443	5,466,219	8,212,913
資本的収入額が資本的支出額に 不足する額 (D)-(C) (E)		1,007,167	1,569,547	1,758,857	1,057,251
補 填 財 源	1. 損 益 勘 定 留 保 資 金	978,998	1,290,575	917,511	828,476
	2. 利 益 剰 余 金 処 分 額			238,093	228,775
	3. 繰 越 工 事 資 金	10,100			
	4. そ の 他	18,069	278,972	603,253	
計 (F)		1,007,167	1,569,547	1,758,857	1,057,251
補 填 財 源 不 足 額 (E)-(F)					
他 会 計 借 入 金 残 高 (G)					
企 業 債 残 高 (H)		25,500,499	23,514,996	22,371,966	22,532,798

○他会計繰入金

年 度		令和6年度 (2024年度)	令和7年度 (2025年度)	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)
区 分					
収 益 的 収 支 分		1,560,589	1,984,602	1,927,381	1,308,168
	うち 基 準 内 繰 入 金	1,560,589	1,984,602	1,927,381	1,308,168
	うち 基 準 外 繰 入 金				
資 本 的 収 支 分		1,595,031	1,305,692	953,282	1,644,846
	うち 基 準 内 繰 入 金	165,175	341,807	170,296	178,403
	うち 基 準 外 繰 入 金	1,429,856	963,885	782,986	1,466,443
合 計		3,155,620	3,290,294	2,880,663	2,953,014

Ⅲ 経営戦略2026

(単位: 千円)

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
4,720,925	2,309,339	3,898,203	4,218,314	2,802,739	5,744,855	4,744,595	4,659,364
1,345,046	1,884,562	1,587,690	326,740	183,541	162,487	161,135	149,908
4,788,010	2,273,395	3,526,295	4,619,540	2,950,040	7,056,400	5,666,000	5,586,700
3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070	3,070
5,120	3,623	3,061	2,879	3,254	3,628	4,003	4,003
10,862,171	6,473,989	9,018,319	9,170,543	5,942,644	12,970,440	10,578,803	10,403,045
10,862,171	6,473,989	9,018,319	9,170,543	5,942,644	12,970,440	10,578,803	10,403,045
9,814,546	5,392,614	8,087,305	9,821,293	5,917,056	13,464,409	10,960,267	10,752,874
96,907	97,876	98,855	99,843	100,841	101,849	102,867	103,896
2,310,246	2,196,026	1,960,134	1,877,665	1,915,062	1,830,592	1,827,150	1,876,555
2,687	2,687	2,687	4,003	4,003	4,003	4,003	4,003
12,127,479	7,591,327	10,050,126	11,702,961	7,836,121	15,299,004	12,791,420	12,633,432
1,265,308	1,117,338	1,031,807	2,532,418	1,893,477	2,328,564	2,212,617	2,230,387
875,686	726,711	650,657	1,159,247	1,338,695	1,335,596	1,311,177	1,237,037
389,622	390,627	381,150	1,373,171	554,782	992,968	901,440	993,350
1,265,308	1,117,338	1,031,807	2,532,418	1,893,477	2,328,564	2,212,617	2,230,387
24,943,477	25,056,790	26,994,859	29,335,508	30,223,185	34,137,448	37,054,893	39,837,702


(単位: 千円)

令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
1,677,768	1,129,671	1,426,543	1,620,749	2,298,256	2,596,101	2,460,290	2,332,311
1,677,768	1,129,671	1,426,543	1,620,749	2,298,256	2,596,101	2,460,290	2,332,311
1,345,046	1,884,562	1,587,690	326,740	183,541	162,487	161,135	149,908
190,067	229,521	374,326	326,740	183,541	162,487	161,135	149,908
1,154,979	1,655,041	1,213,364					
3,022,814	3,014,233	3,014,233	1,947,489	2,481,797	2,758,588	2,621,425	2,482,219

6 進捗管理・検証・見直し

経営戦略 2026 を着実に実施していくため、毎年の事業評価・内部監査等から事業全体の不具合や課題を特定し、その結果に加え課題の原因となる点の是正・改善を行います。また、効果を更に上げるために、計画期間の中間年度である令和 12 年度(2030 年度)に、中間評価と見直しを行います。そのために、鎌倉市下水道事業運営審議会を常設として毎年進捗報告、審議を行い、社会情勢変化への対応を含めてPDCAサイクルを機能させる体制を構築します。

また、「下水道事業における収支構造適正化に向けた取組の推進についての留意事項」(国土交通省事務連絡 令和2年(2020 年)7月 22 日)に基づく、「経費回収率の向上に向けたロードマップ」をあわせて、以下に示します。令和5年度決算における資本費算入率 37.3%を維持することを目標として、令和8年度(2026 年度)、令和11年度(2029 年度)、令和16年度(2034 年度)に改定を予定し、その前年度以前に、改定の検討及び準備を行います。

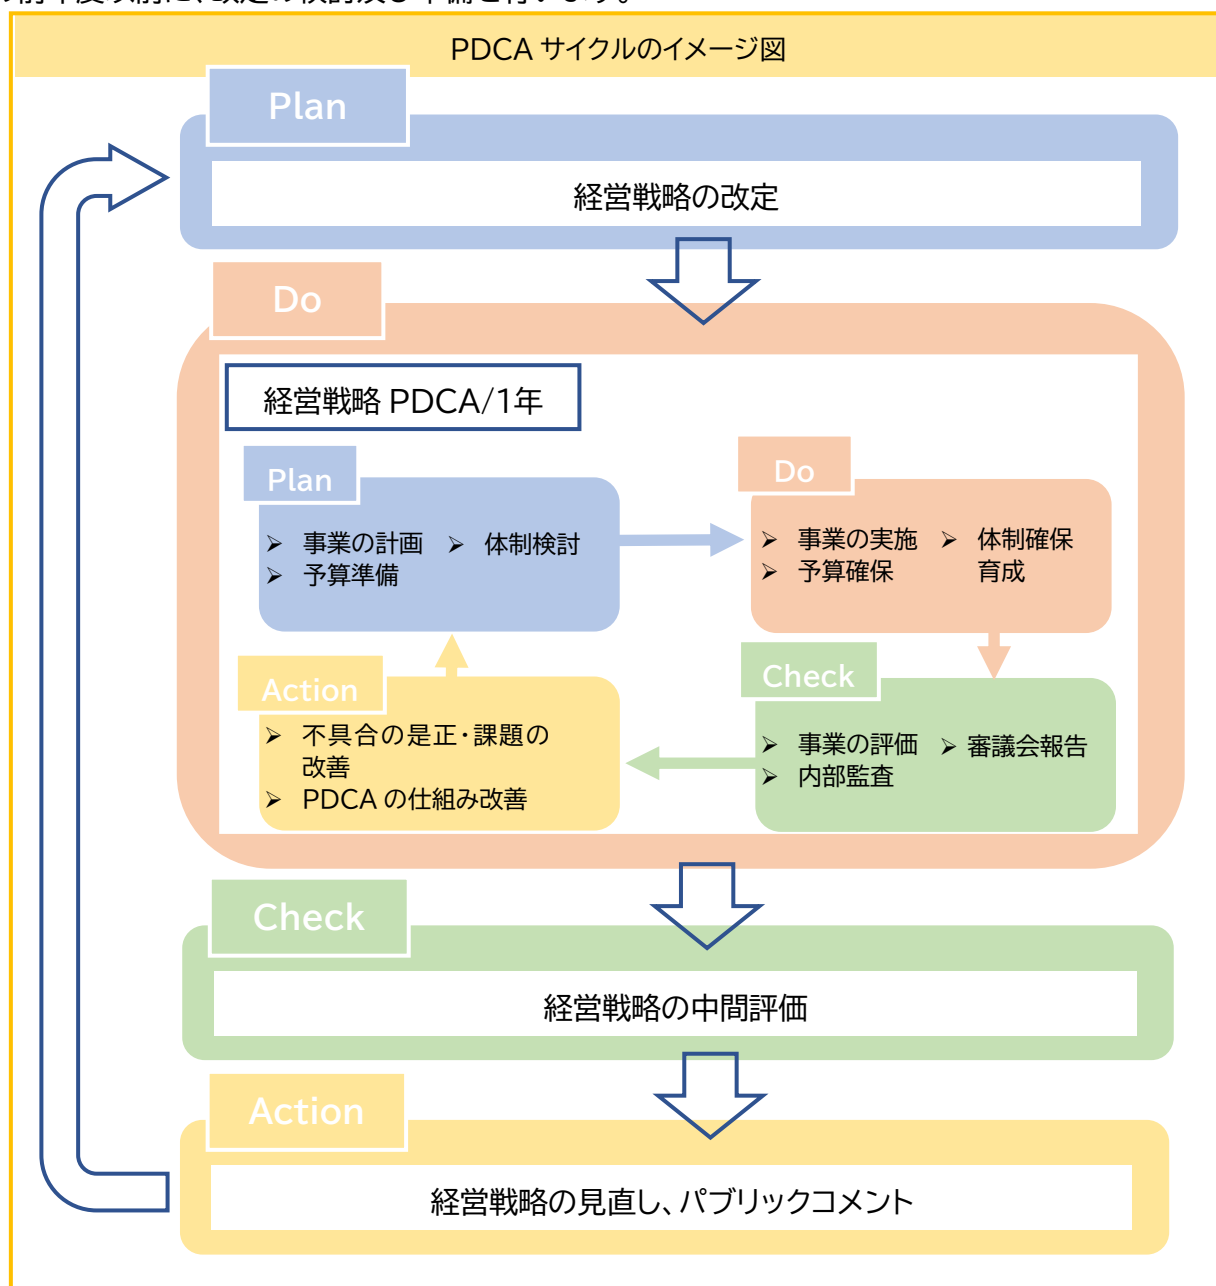

Ⅲ 経営戦略2026

経費回収率の向上に向けたロードマップ

	令和8年度 (2026年度)	令和9年度 (2027年度)	令和10年度 (2028年度)	令和11年度 (2029年度)	令和12年度 (2030年度)
経営戦略	進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	中間評価・見直し 進捗報告 審議・公表
下水道 使用料	改定	改定の検討・準備		改定	検証

	令和13年度 (2031年度)	令和14年度 (2032年度)	令和15年度 (2033年度)	令和16年度 (2034年度)	令和17年度 (2035年度)
経営戦略	(改定) 進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	進捗報告 審議・公表	評価・見直し 進捗報告 審議・公表
下水道 使用料	検証	改定の検討・準備		改定	検証
