


相互提案協働事業 報告書

令和4年 4月 27日

(あて先) 鎌倉市長 様



住所 鎌倉市 [REDACTED]
 郵便番号 [REDACTED]
 団体名 特定非営利活動法人 鎌倉シチズンネットワーク
 代表者氏名 理事長 鍋島 [REDACTED]

平成4年度事業報告会に先立ち、協働事業の実施状況・実施結果について、下記のとおり報告します。

事業名	「鎌倉観光公式ガイド」コンテンツ充実事業
事業概要	(1) 「鎌倉観光公式ガイド (以下公式ガイド)」に掲載している観光情報について、修正が必要な箇所の調査 (2) 調査結果表の作成 (3) 「鎌倉なびマップ」へのリンク付けが必要な箇所の確認及び決定 (4) 実装作業及び実装後の確認作業
市担当課	市民防災部観光課
事業実施期間 (継続中の事業については、継続に○をつける)	継続 開始 令和3年10月 1日 ~ 終了 令和4年 3月31日
協働の形態	事業概要(1)と(2)は鎌倉シチズンネットが実施する。(3)は両者で協議する。(4)の実装作業はそれぞれの分担範囲で実施。確認作業は両者で行う。
事業費	¥165,000 円

<p>事業目的の達成 (継続中の事業については、現時点で判断する)</p>	<p><達成できた点> (1) 公式ガイドの調査 (2) 調査結果表の作成 (3) 「鎌倉なびマップ」のリンク付け必要事項の確認と決定 (4) 実装作業及び確認作業</p>
	<p><達成できなかった点> (1) 「公式ガイド」から「鎌倉なびマップ」のページへのリンクを計画していたが実現できなかった。代案として導入ページを経由することになった。</p>
<p>成果・効果</p>	<p>(1) 「公式ガイド」の改良ができた。 (2) 「公式ガイド」に情報追加ができた。 (3) 評価対象 (80) の処理内訳：鎌倉なびマップで検討 (30)、観光課で処理 (16)、公式ガイドで非表示ページとなり対象外 (7)、公式ページ又は日本遺産のため対象外 (13)、処理不要と判定 (14)。</p>
<p>課題・問題点 (解決・改善の方法についても記入)</p>	<p>新型コロナウイルス感染症蔓延のため令和1年度提案・採択、令和2年度実施予定ができず、令和3年度下期実施となった。その間、「公式ガイド」の項目変更が進み協働事業提案の詳細内容を見直す必要が生じた。また、実施時期が延期になったため、その間に観光課の担当職員が3回交代し、了解事項の再確認を余儀なくされた。また、寺社データについて寺社の了解を得られない場合があり、その対策として導入ページを経由する方法で対処することになったが、当初の構想とはかなり違う姿となった。協働事業計画書に技術仕様書を添付するなど詳細を明確にするべきだったと反省している。</p>
<p>今後の展望</p>	<p>協働事業は年度内に終了したが、「公式ガイド」の充実に貢献したいという思いはあるので提案作業は続けたいと思っている。 一方「鎌倉なびマップ」は約20年間の歴史があり、古いデータについて更新の必要があり今後取り組んでゆきたい。</p>

添付資料

「鎌倉観光公式ガイド」コンテンツ充実事業全体図

「鎌倉観光公式ガイド」コンテンツ充実事業 全体図

「鎌倉観光公式ガイド」

<https://www.trip-kamakura.com/life/13/11/65/>



お役立ち情報



便利なサービススポット



鎌倉なびマップ





導入ページ (右下の画像)




鎌倉なびマップの該当欄への
リンク

- > 鎌倉史跡碑事典
- > 鎌倉七口の坂と切通
- > 鎌倉寺社紹介
(次ページ)

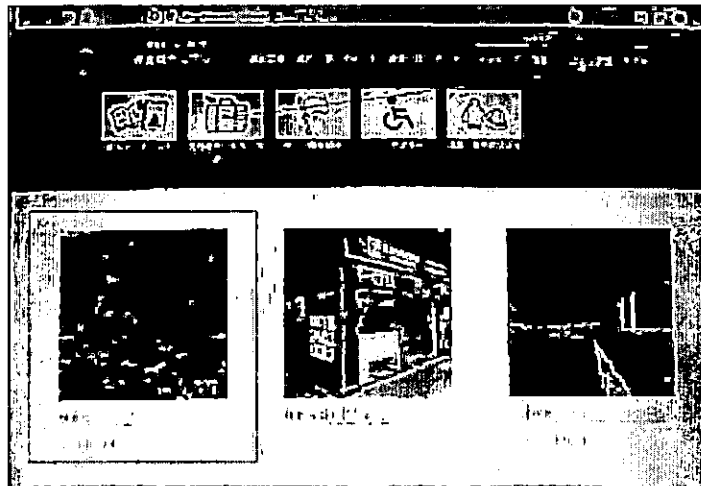

> 鎌倉寺社紹介 > 「鎌倉なびマップ～神社仏閣～」 (例：トップページ)

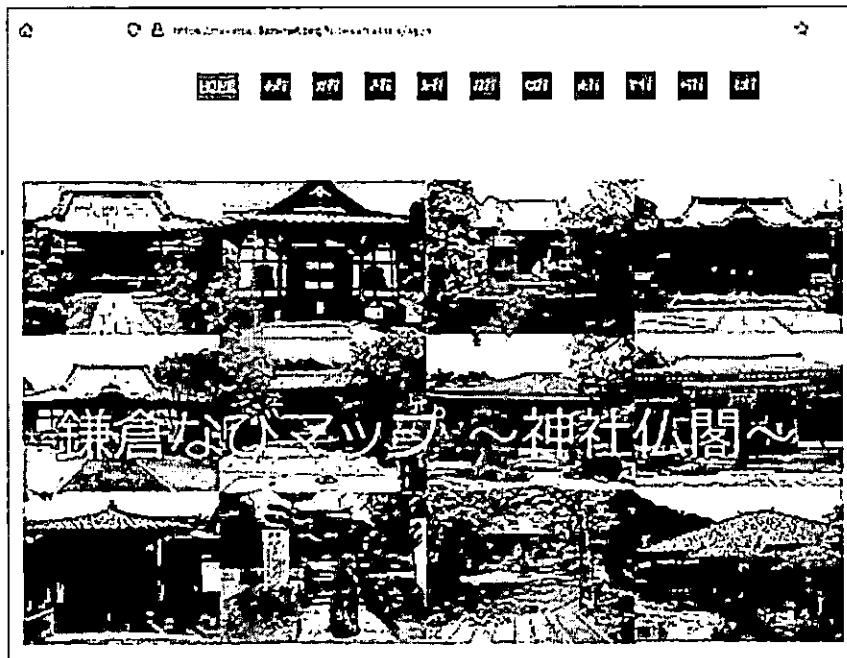

(例) メニューから甘縄神明神社を選択

